



รายงานติดตาม

ผลการเบิกจ่ายและผลการดำเนินโครงการตามแผนพัฒนา
เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
ประจำไตรมาสที่ 4 /2566 (ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2566)



คำนำ



ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ครั้งที่ 3/2565 เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2565 ได้กำหนดแนวทางวิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เป็น 2 ส่วน ประกอบด้วย ส่วนที่ 1 ให้มีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาฯ เป็นรายไตรมาส รวม 4 ไตรมาส โดยมอบหมายให้งานวิจัยและประเมินผลเป็นผู้รวบรวมข้อมูลที่สำคัญ/กองรายงานและสรุปผลรายงานในภาพรวมของหน่วยงาน เสนอต่อคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ไตรมาสละ 1 ครั้ง และส่วนที่ 2 กำหนดให้การจัดทำ รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยหน่วยงานหรือ บุคคลภายนอกเป็นผู้ประเมิน เพื่อสะท้อนให้เห็นข้อมูลเชิงลึก และเกิดความน่าเชื่อถือ

เพื่อให้การติดตามผลการดำเนินงานของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี เป็นไปอย่างต่อเนื่องและเกิดประโยชน์สูงสุด งานวิจัยและ ประเมินผล ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ ได้แจ้งแนวทางการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ให้สำนัก/กองทราบและจัดทำรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณตาม เทศบัญญัติฯ และผลการดำเนินโครงการทั้งที่ตั้งจ่ายจากเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายฯ และจากแหล่งเงินอื่น ๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ประจำปีไตรมาสที่ 4/2566 (ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2566) กำหนดให้ส่งภายในวันที่ 5 ของเดือนถัดไป

งานวิจัยและประเมินผล ได้จัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินงานในภาพรวมประจำเดือนของหน่วยงานเรียบร้อยแล้ว เพื่อใช้เป็น เครื่องมือในการติดตามการดำเนินงานของหน่วยงานต่อไป



งานวิจัยและประเมินผล
ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

สารบัญ



หน้า 1

แผนภูมิแสดงผลการเบิกจ่ายงบประมาณตามเทศบัญญัติฯ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (ณ วันที่ 30 กันยายน 2566)

หน้า 2

สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณตามเทศบัญญัติฯงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (ณ วันที่ 30 กันยายน 2566)

หน้า 9

สรุปผลการดำเนินโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

หน้า
10

สรุปผลการดำเนินโครงการตามเทศบัญญัติฯงบประมาณรายจ่ายและที่จ่าย
จากเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (ณ วันที่ 30 กันยายน 2566)

หน้า
11

แผนภูมิแสดงผลการดำเนินโครงการในภาพรวมแยกรายยุทธศาสตร์
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (ณ วันที่ 30 กันยายน 2566)

หน้า
12

แผนภูมิแสดงสถานะการดำเนินโครงการในภาพรวม
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (ณ วันที่ 30 กันยายน 2566)

หน้า
14

รายงานผลการดำเนินโครงการที่จ่ายจากงบประมาณตามเทศบัญญัติฯ และ
จ่ายจากเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (วันที่ 30 กันยายน 2566)

หน้า
48

สรุปผลการดำเนินโครงการที่จ่ายจากเงินสะสม/เงินทุนสำรองเงินสะสม
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (ที่ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ)

หน้า
52

สรุปผลการดำเนินโครงการตามเทศบัญญัติฯ ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ.2564-2565 ที่ขออนุมัติกันเงินไว้ (ณ วันที่ 30 กันยายน 2566)

แผนภูมิแสดง

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

ประจำไตรมาสที่ 4/2566 (ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2566)



สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

ประจำเดือนสิงหาคม 2566 (ข้อมูล ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566)

เป้าหมายการเบิกจ่ายไตรมาสที่ 4/2566

รายจ่ายประจำร้อยละ 100 (ของรายจ่ายประจำทั้งหมด) ขบลงทุนร้อยละ 100 (ของงบลงทุนทั้งหมด) การเบิกจ่ายในภาพรวมร้อยละ 100 (ของงบประมาณทั้งหมด)

ลำดับ	แผนงาน / งาน	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	การโอนงบประมาณ		การเบิกจ่าย		งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การเบิกจ่าย (ร้อยละ)	หน่วยงาน ผู้เบิก
			โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	ผูกพัน (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)			
1	แผนงานบริหารงานทั่วไป	127,817,600.00	18,009,670.00	14,359,970.00	3,492,230.59	104,580,035.21	23,395,034.20	82.20	
	รายจ่ายประจำ	123,756,600.00	11,293,520.00	10,704,970.00	2,198,230.59	103,018,685.21	19,128,234.20	84.62	
	- งานบริหารทั่วไป	74,947,800.00	7,869,410.00	6,296,060.00	1,669,156.00	63,658,345.67	11,193,648.33		สป./กองยุทธฯ/กจ.
	- งานวางแผนสถิติและวิชาการ	4,886,500.00	92,000.00	200,000.00	300,600.00	3,524,554.48	953,345.52		กองยุทธฯ
	- งานบริหารงานคลัง	43,089,600.00	3,292,110.00	4,168,910.00	222,474.59	35,127,504.16	6,862,821.25		คลัง/สารสนเทศฯ
	- งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน	832,700.00	40,000.00	40,000.00	6,000.00	708,280.90	118,419.10		หน่วยตรวจสอบภายใน
	รายจ่ายเพื่อการลงทุน	4,061,000.00	6,716,150.00	3,655,000.00	1,294,000.00	1,561,350.00	4,266,800.00	40.09	
	- งานบริหารทั่วไป (ครุภัณฑ์)	4,061,000.00	3,476,950.00	3,655,000.00	-	1,211,050.00	2,671,900.00		สป./กองยุทธฯ
	- งานวางแผนสถิติและวิชาการ (ครุภัณฑ์)	-	93,900.00	-	-	-	93,900.00		
	- งานบริหารงานคลัง (ครุภัณฑ์)	-	3,145,300.00	-	1,294,000.00	350,300.00	1,501,000.00		สำนักการศึกษา
2	แผนงานรักษาความสงบภายใน	32,571,000.00	13,373,000.00	3,441,800.00	1,453,472.00	26,795,715.73	14,253,012.27	66.47	
	รายจ่ายประจำ	32,571,000.00	5,094,000.00	3,281,500.00	1,453,472.00	24,330,915.73	8,599,112.27	74.99	
	- งานเทคนิค	11,033,000.00	362,000.00	207,000.00	27,696.00	8,444,409.87	2,715,894.13		สำนักปลัดเทศบาล
	- งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	16,184,400.00	1,813,500.00	2,011,500.00	171,776.00	11,640,972.26	4,173,651.74		
	- งานจราจร	5,353,600.00	2,918,500.00	1,063,000.00	1,254,000.00	4,245,533.60	1,709,566.40		สำนักช่าง
	รายจ่ายเพื่อการลงทุน	-	8,279,000.00	160,300.00	-	2,464,800.00	5,653,900.00	30.36	
	-งานจราจร (ครุภัณฑ์)	-	8,279,000.00	160,300.00	-	2,464,800.00	5,653,900.00		


ลำดับ	แผนงาน / งาน	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	การโอนงบประมาณ		การเบิกจ่าย		งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การเบิกจ่าย (ร้อยละ)	หน่วยงาน ผู้เบิก
			โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	ผูกพัน (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)			
3	แผนงานการศึกษา	318,098,640.00	16,357,384.00	14,730,384.00	3,553,295.13	288,067,899.21	28,104,445.66	91.21	
	รายจ่ายประจำ	317,628,640.00	15,181,384.00	14,595,384.00	2,979,295.13	287,320,459.21	27,914,885.66	91.23	
	- งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	8,401,060.00	322,100.00	772,100.00	3,300.00	6,954,750.51	993,009.49		สำนักงานการศึกษา
	- งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	173,382,000.00	9,471,858.00	7,999,464.00	2,971,090.13	158,149,701.13	13,733,602.74		
	- งานระดับมัธยมศึกษา	129,106,480.00	5,158,076.00	4,960,990.00	2,200.00	117,334,201.97	11,967,164.03		
	- งานศึกษาไม่กำหนดระดับ	6,739,100.00	229,350.00	862,830.00	2,705.00	4,881,805.60	1,221,109.40		
	รายจ่ายเพื่อการลงทุน	470,000.00	1,176,000.00	135,000.00	574,000.00	747,440.00	189,560.00	87.45	
	- งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา (ครุภัณฑ์)	-	173,500.00	-	-	-	173,500.00		สำนักงานการศึกษา
	- งานระดับก่อนวัยเรียนฯ (ครุภัณฑ์)	-	839,900.00	135,000.00	574,000.00	118,700.00	12,200.00		
	- งานระดับมัธยมศึกษา (ครุภัณฑ์)	470,000.00	49,700.00	-	-	516,450.00	3,250.00		
	- งานศึกษาไม่กำหนดระดับ (ครุภัณฑ์)	-	112,900.00	-	-	112,290.00	610.00		
4	แผนงานสาธารณสุข	73,748,500.00	6,371,820.00	12,345,283.00	274,489.56	63,869,147.77	3,631,399.67	94.64	
	รายจ่ายประจำ	73,256,000.00	6,053,320.00	12,305,283.00	274,489.56	63,099,851.77	3,629,695.67	94.58	
	- งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	13,851,000.00	1,105,180.00	3,834,000.00	53,352.06	10,369,779.62	699,048.32		สำนักงานสาธารณสุขฯ
	- งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	19,640,500.00	1,246,930.00	3,424,593.00	75,220.24	16,657,269.74	730,347.02		
	- งานศูนย์บริการสาธารณสุข	39,764,500.00	3,701,210.00	5,046,690.00	145,917.26	36,072,802.41	2,200,300.33		
	รายจ่ายเพื่อการลงทุน	492,500.00	318,500.00	40,000.00	-	769,296.00	1,704.00	99.78	
	- งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข (ครุภัณฑ์)	-	92,500.00	-	-	92,500.00	-		สำนักงานสาธารณสุขฯ
	- งานบริการสาธารณสุขฯ (ครุภัณฑ์)	100,000.00	133,500.00	-	-	232,796.00	704.00		
	- งานศูนย์บริการสาธารณสุข (ครุภัณฑ์)	392,500.00	92,500.00	40,000.00	-	444,000.00	1,000.00		

ลำดับ	แผนงาน / งาน	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	การโอนงบประมาณ		การเบิกจ่าย		งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การเบิกจ่าย (ร้อยละ)	หน่วยงาน ผู้เบิก
			โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	ผูกพัน (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)			
5	แผนงานสังคมสงเคราะห์	11,795,700.00	1,408,890.00	704,260.00	16,502.84	10,481,981.21	2,001,845.95	83.99	
	รายจ่ายประจำ	11,795,700.00	1,408,890.00	704,260.00	16,502.84	10,481,981.21	2,001,845.95	83.99	
	- งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์	4,797,700.00	298,160.00	75,000.00	2,252.84	4,558,772.48	459,834.68		กองสวัสดิการสังคม
	- งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	6,998,000.00	1,110,730.00	629,260.00	14,250.00	5,923,208.73	1,542,011.27		
	รายจ่ายเพื่อการลงทุน	-	-	-	-	-	-	-	
6	แผนงานเคหะและชุมชน	150,711,810.00	70,123,185.18	23,487,352.18	17,615,632.96	156,013,245.35	23,718,764.69	87.98	
	รายจ่ายประจำ	150,711,810.00	53,998,985.18	20,937,352.18	14,966,744.96	155,998,245.35	12,808,452.69	93.03	
	- งานไฟฟ้าและประปา	360,510.00	-	-	-	360,489.43	20.57		สำนักช่าง
	- งานสวนสาธารณะ	10,818,100.00	2,779,300.00	482,300.00	599,142.65	11,477,421.81	1,038,535.54		
	- งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	122,666,100.00	40,475,285.18	13,421,052.18	12,311,665.65	125,970,778.67	11,437,888.68		สช. / สธ.
	- งานบำบัดน้ำเสีย	16,867,100.00	10,744,400.00	7,034,000.00	2,055,936.66	18,189,555.44	332,007.90		สำนักช่าง
	รายจ่ายเพื่อการลงทุน	-	16,124,200.00	2,550,000.00	2,648,888.00	15,000.00	10,910,312.00	19.62	
	- งานสวนสาธารณะ (ครุภัณฑ์)	-	10,460,000.00	-	-	-	10,460,000.00		สช. / สธ.
	- งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล(ครุภัณฑ์)	-	7,200.00	2,350,000.00	2,648,888.00	-	4,991,688.00		สช. / สธ.
	- งานบำบัดน้ำเสีย (ครุภัณฑ์)	-	5,657,000.00	200,000.00	-	15,000.00	5,442,000.00		สำนักช่าง
7	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	13,779,900.00	268,370.00	173,000.00	-	11,695,018.57	2,180,251.43	84.29	
	รายจ่ายประจำ	13,779,900.00	268,370.00	173,000.00	-	11,695,018.57	2,180,251.43	84.29	
	- งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	13,779,900.00	268,370.00	173,000.00	-	11,695,018.57	2,180,251.43		กองสวัสดิการสังคม
	รายจ่ายเพื่อการลงทุน	-	-	-	-	-	-		

ลำดับ	แผนงาน / งาน	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	การโอนงบประมาณ		การเบิกจ่าย		งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การเบิกจ่าย (ร้อยละ)	หน่วยงาน ผู้เบิก
			โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	ผูกพัน (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)			
8	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและ นันทนาการ	26,097,800.00	9,024,560.00	6,683,560.00	2,762,203.98	18,845,984.05	6,830,611.97	75.98	
	รายจ่ายประจำ	26,097,800.00	2,782,760.00	6,683,560.00	1,272,303.98	18,596,284.05	2,328,411.97	89.51	
	- งานกีฬาและนันทนาการ	8,818,400.00	968,800.00	5,320,600.00	42,476.25	3,786,953.87	637,169.88		สำนักงานการศึกษา
	- งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	12,291,200.00	513,960.00	556,960.00	1,081,627.73	10,093,214.68	1,073,357.59		
	- งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว	4,988,200.00	1,300,000.00	806,000.00	148,200.00	4,716,115.50	617,884.50		สำนักปลัดเทศบาล
	รายจ่ายเพื่อการลงทุน	-	6,241,800.00	-	1,489,900.00	249,700.00	10,300.00	27.87	
	-งานกีฬาและนันทนาการ (ค่าครุภัณฑ์)		2,171,800.00	-	1,489,900.00	190,000.00	491,900.00		
	-งานกีฬาและนันทนาการ (ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)	-	4,000,000.00	-	-	-	4,000,000.00		สำนักช่าง
	- งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น (ค่าครุภัณฑ์)	-	70,000.00	-	-	59,700.00	10,300.00		สำนักช่าง
9	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	191,438,350.00	90,109,219.00	127,636,269.00	4,970,602.75	56,661,919.96	92,278,777.29	40.04	
	รายจ่ายประจำ	67,647,800.00	12,802,000.00	13,471,750.00	1,793,077.05	55,052,239.96	10,132,732.99	84.87	
	- งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมฯ	8,294,300.00	796,800.00	623,300.00	51,000.00	6,937,439.60	1,479,360.40		สำนักช่าง
	- งานก่อสร้าง	59,353,500.00	12,005,200.00	12,848,450.00	1,742,077.05	48,114,800.36	8,653,372.59		
	รายจ่ายเพื่อการลงทุน	123,790,550.00	77,307,219.00	114,164,519.00	3,177,525.70	1,609,680.00	82,146,044.30	5.51	
	- งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมฯ (ค่าครุภัณฑ์)	-	355,800.00		-	167,000.00	188,800.00		สำนักช่าง
	- งานก่อสร้าง (ค่าครุภัณฑ์)	-	5,686,900.00	-	-	4,680.00	5,682,220.00		สำนักช่าง
	- งานก่อสร้าง (ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)	123,790,550.00	71,264,519.00	114,164,519.00	3,177,525.70	1,438,000.00	76,275,024.30		สำนักช่าง
10	แผนงานการเกษตร	7,573,500.00	627,650.00	857,200.00	67,000.00	6,652,155.66	624,794.34	91.49	
	รายจ่ายประจำ	7,573,500.00	627,650.00	857,200.00	67,000.00	6,652,155.66	624,794.34	91.49	
	- งานส่งเสริมการเกษตร	7,573,500.00	627,650.00	857,200.00	67,000.00	6,652,155.66	624,794.34		สำนักช่าง
	รายจ่ายเพื่อการลงทุน	-	-	-	-	-	-		

ลำดับ	แผนงาน / งาน	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	การโอนงบประมาณ		การเบิกจ่าย		งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การเบิกจ่าย (ร้อยละ)	หน่วยงาน ผู้เบิก
			โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	ผูกพัน (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)			
11	แผนงานการพาณิชย์	3,222,600.00	4,818,770.00	1,198,540.00	5,151.69	2,338,493.21	4,499,185.10	34.25	
	รายจ่ายประจำ	3,222,600.00	639,770.00	1,198,540.00	5,151.69	2,315,593.21	343,085.10	87.12	
	- งานตลาดสด	675,500.00	18,000.00	48,000.00	-	455,276.00	190,224.00		สำนักปลัดเทศบาล
	- งานโรงฆ่าสัตว์	2,547,100.00	621,770.00	1,150,540.00	5,151.69	1,860,317.21	152,861.10		สำนักสาธารณสุข
	รายจ่ายเพื่อการลงทุน	-	4,179,000.00	-	-	22,900.00	4,156,100.00	0.55	
	- งานโรงฆ่าสัตว์ (ค่าครุภัณฑ์)	-	4,179,000.00	-	-	22,900.00	4,156,100.00		สำนักสาธารณสุข
12	แผนงานงบกลาง	233,144,600.00	2,235,000.00	27,109,900.00	98,643.00	190,309,553.46	17,861,503.54	91.42	
	- รายจ่ายประจำ	233,144,600.00	2,235,000.00	27,109,900.00	98,643.00	190,309,553.46	17,861,503.54	91.42	
	- รายจ่ายเพื่อการลงทุน	-	-	-	-	-	-		
การเบิกจ่ายในภาพรวม		1,190,000,000.00	232,727,518.18	232,727,518.18	34,309,224.50	936,311,149.39	219,379,626.11	81.56	
รวมรายจ่ายประจำ		1,061,185,950.00	112,385,649.18	112,022,699.18	25,124,910.80	928,870,983.39	107,553,005.81	89.87	
รวมงบลงทุน		128,814,050.00	120,341,869.00	120,704,819.00	9,184,313.70	7,440,166.00	107,334,720.30	12.94	

แผนภูมิเปรียบเทียบผลการเบิกจ่ายงบประมาณตามเทศบัญญัติฯ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 และ 2566 ระหว่างไตรมาสที่ 4/2565 และ ไตรมาสที่ 4/2566
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2566)

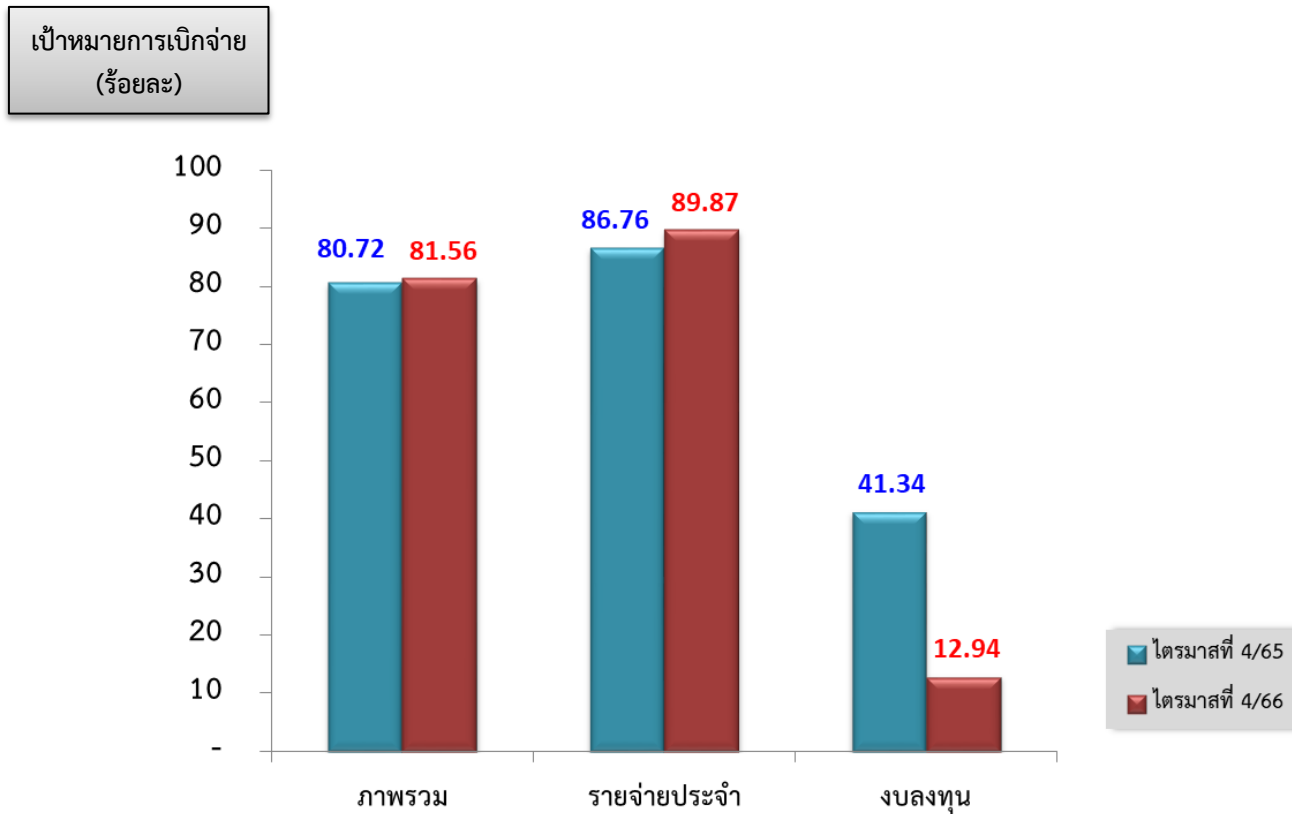

สรุปผลการเบิกจ่าย ได้ดังนี้

- การเบิกจ่ายในภาพรวม ในปีงบประมาณ พ.ศ.2566 สามารถเบิกจ่ายได้ **มากกว่า** ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 คิดเป็นร้อยละ **0.84**
- การเบิกจ่ายรายจ่ายประจำ ในปีงบประมาณ พ.ศ.2566 สามารถเบิกจ่ายได้ **มากกว่า** ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 คิดเป็นร้อยละ **3.11**
- การเบิกจ่ายงบลงทุน ในปีงบประมาณ พ.ศ.2565 สามารถเบิกจ่ายได้ **มากกว่า** ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 คิดเป็นร้อยละ **28.4**

รายงาน

ผลการดำเนินงานโครงการ

- ✓ จากงบประมาณตามเทศบัญญัติ ฯ
- ✓ จากงบประมาณที่จ่ายจากเงินสะสม



สรุปผลการดำเนินโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ณ ไตรมาสที่ 4/2566 (ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2566)

ที่	ยุทธศาสตร์การพัฒนา	ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น				ที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ				ที่ได้ดำเนินการ			
		โครงการ		งบประมาณ		โครงการ		งบประมาณ		โครงการ		งบประมาณ	
		จำนวน	ร้อยละ	จำนวน (บาท)	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน (บาท)	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน (บาท)	ร้อยละ
1	ด้านโครงสร้างพื้นฐาน	156	37.86	814,303,519.00	42.64	76	18.45	157,331,510.00	8.24	71	17.23	150,266,829.00	7.87
2	ด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว	10	2.43	49,240,000.00	2.58	6	1.46	4,100,000.00	0.21	5	1.21	4,100,000.00	0.21
3	ด้านการจัดการ ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม	14	3.40	807,809,600.00	42.30	5	1.21	1,041,147.00	0.05	5	1.21	1,041,147.00	0.05
4	ด้านสวัสดิการสังคมและคุณภาพ ชีวิต	124	30.10	35,054,730.00	1.84	120	29.13	28,449,390.00	1.49	113	27.43	27,962,190.00	1.46
5	ด้านการศึกษา การกีฬา ศาสนา ประเพณีและวัฒนธรรม	82	19.90	168,877,639.00	8.84	55	13.35	125,239,028.00	6.56	46	11.17	125,084,528.00	6.55
6	ด้านการบริหารจัดการที่ดี	26	6.31	34,491,300.00	1.81	18	4.37	3,820,250.00	0.20	16	3.88	3,420,250.00	0.18
รวมทั้งสิ้น		412	100.00	1,909,776,788.00	100.00	280	67.96	319,981,325.00	16.75	256	62.14	311,874,944.00	16.33

หมายเหตุ ที่ได้ดำเนินการ หมายถึง โครงการที่ดำเนินการเสร็จสิ้นรวมกับโครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ

สรุปผลการดำเนินโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ณ ไตรมาสที่ 4/2566 (ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2566)

จำนวนโครงการที่ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 มีทั้งหมด 280 โครงการ งบประมาณรวมทั้งสิ้น 319,981,325 บาท (สามร้อยสิบเก้าล้านเก้าแสนแปดหมื่นหนึ่งพันสามร้อยยี่สิบห้าบาทถ้วน)

1. โครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จำนวน 252 โครงการ งบประมาณ 242,126,325 บาท

ยุทธศาสตร์	รวมทั้งสิ้น			ดำเนินการเสร็จสิ้น			ระหว่างดำเนินการ			ยังไม่ดำเนินการ		โครงการที่ยกเลิก	
	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบประมาณที่เบิกจ่าย	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบประมาณที่เบิกจ่าย	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบประมาณที่เบิกจ่าย	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้
1. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน	48	79,476,510.00	1,085,242.25	2	955,000.00	905,000.00	41	71,456,829.00	180,242.25	-	-	5	7,064,681.00
2. ด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว	6	4,100,000.00	3,831,220.00	5	4,100,000.00	3,831,220.00	-	-	-	-	-	1	-
3. ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	5	1,041,147.00	507,217.00	4	541,147.00	507,217.00	1	500,000.00	-	-	-	-	-
4. ด้านสวัสดิการสังคมและคุณภาพชีวิต	120	28,449,390.00	18,866,337.97	111	22,803,760.00	18,866,337.97	2	5,158,430.00	-	7	487,200.00	-	-
5. ด้านการศึกษา การกีฬา ศาสนา ประเพณีและวัฒนธรรม	55	125,239,028.00	104,311,649.23	40	117,235,528.00	104,311,649.23	6	7,849,000.00	-	3	136,000.00	6	18,500.00
6. ด้านการบริหารจัดการที่ดี	18	3,820,250.00	1,444,674.00	13	1,820,250.00	1,444,674.00	3	1,600,000.00	-	2	400,000.00	-	-
รวม	252	242,126,325.00	130,046,340.45	175	147,455,685.00	129,866,098.20	53	86,564,259.00	180,242.25	12	1,023,200.00	12	7,083,181.00
คิดเป็นร้อยละ		100.00			69.44			21.03			4.76		4.76

2. โครงการที่จ่ายจากเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จำนวน 28 โครงการ งบประมาณ 77,855,000 บาท


ยุทธศาสตร์	รวมทั้งสิ้น			ดำเนินการเสร็จสิ้น			ระหว่างดำเนินการ			ยังไม่ดำเนินการ		โครงการที่ยกเลิก	
	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบประมาณที่เบิกจ่าย	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบประมาณที่เบิกจ่าย	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบประมาณที่เบิกจ่าย	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้
1. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน	28	77,855,000.00	18,457,907.00	16	27,575,000.00	18,457,907.00	12	50,280,000.00	-	-	-	-	-
รวม	28	77,855,000.00	18,457,907.00	16	27,575,000.00	18,457,907.00	12	50,280,000.00	-	-	-	-	-
คิดเป็นร้อยละ		100.00			57.14			42.86			0.00		0.00
รวมทั้งสิ้น	280	319,981,325.00	148,504,247.45	191	175,030,685.00	148,324,005.20	65	136,844,259.00	180,242.25	12	1,023,200.00	12	7,083,181.00
คิดเป็นร้อยละ		100.00			68.21			23.21			4.29		4.29

แผนภูมิแสดง

ผลการดำเนินโครงการในภาพรวมแยกรายยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

ประจำไตรมาสที่ 4/2566 (ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2566)


จำนวนโครงการ

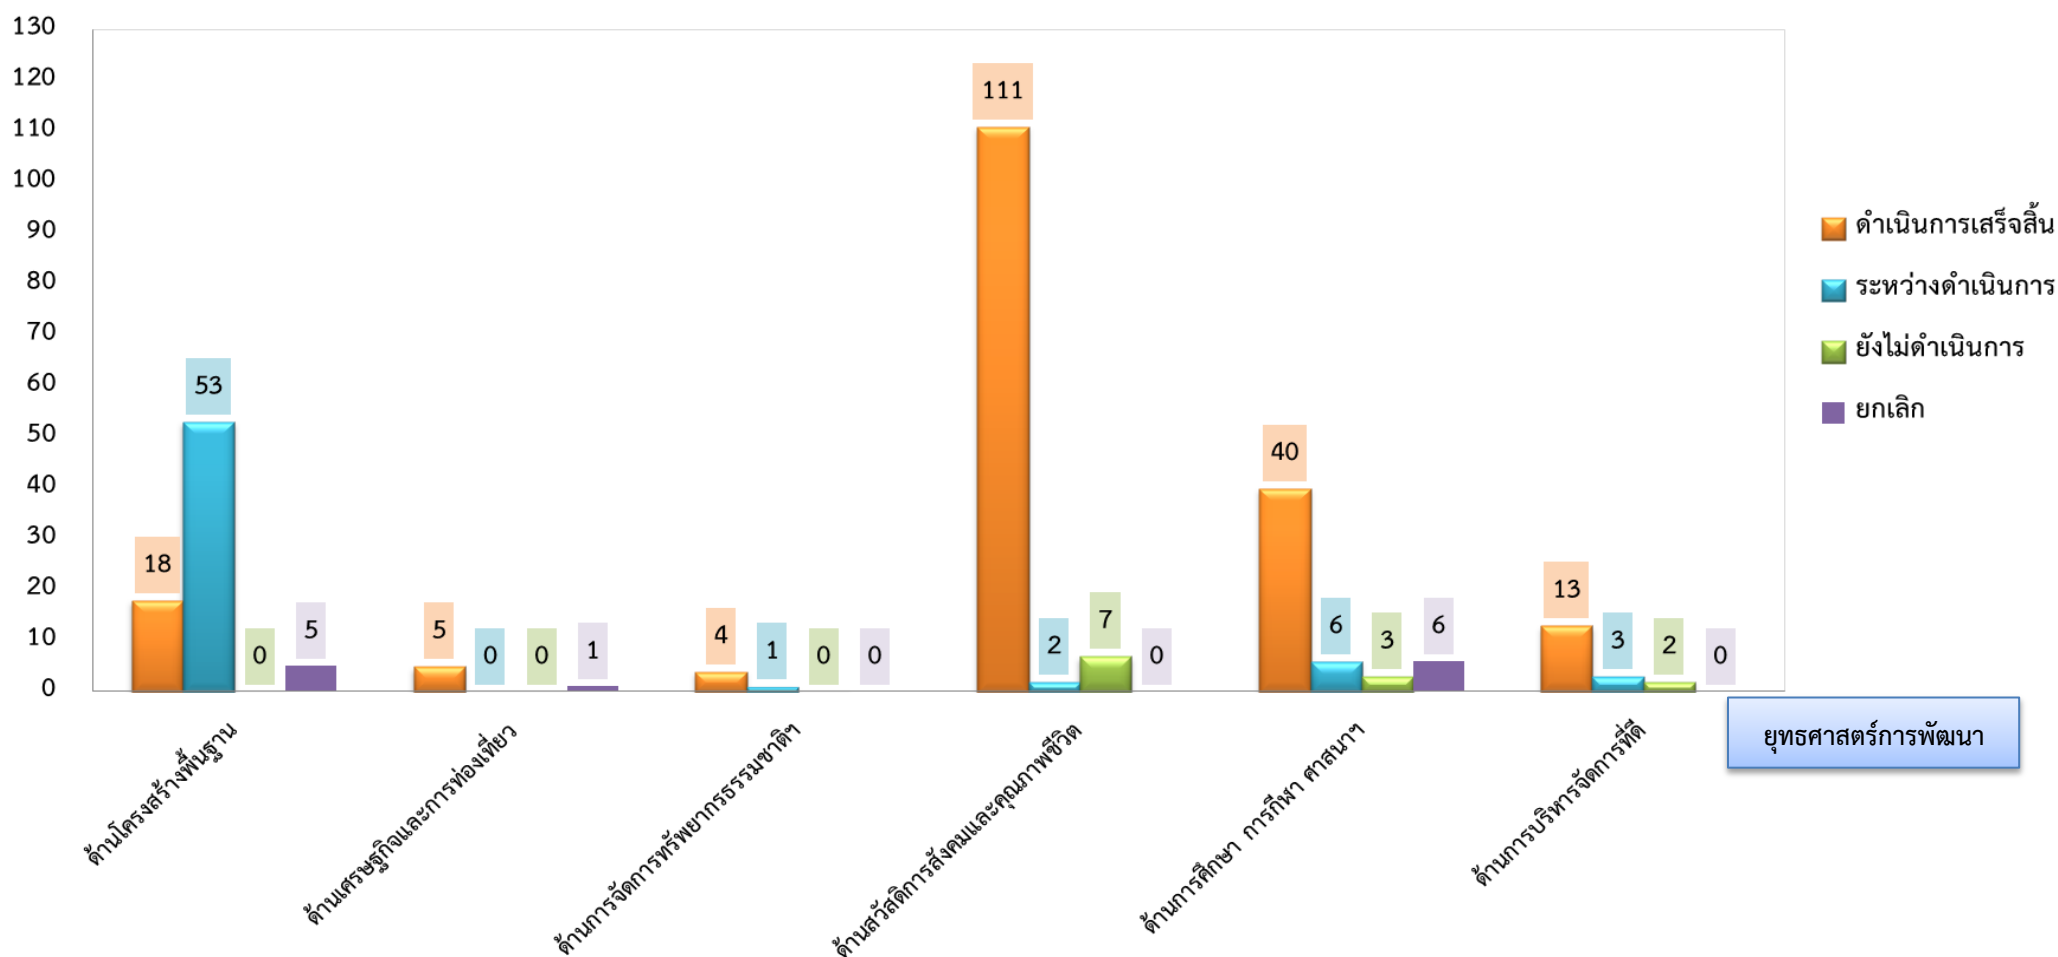

แผนภูมิแสดง

สถานะการดำเนินโครงการในภาพรวม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

ประจำไตรมาสที่ 4/2566 (ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2566)

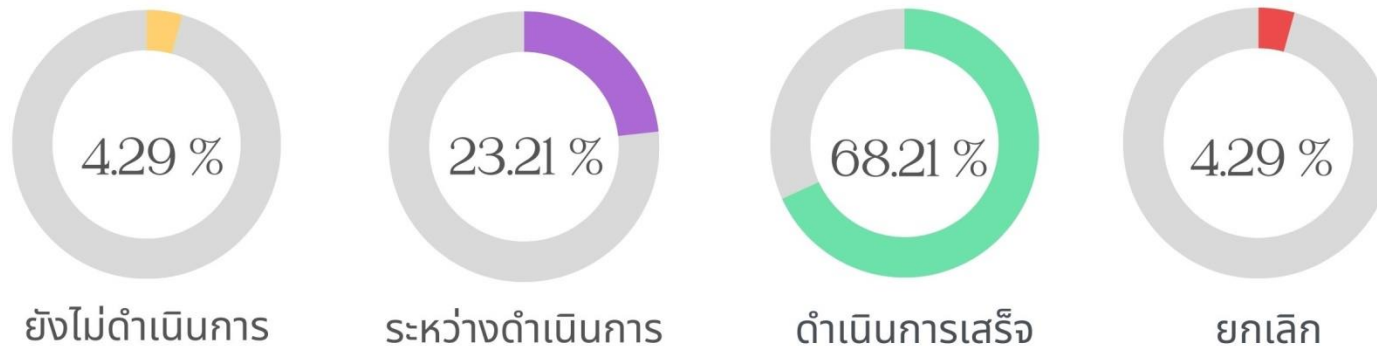

ตารางแสดงข้อมูลสถานะการดำเนินโครงการ

สถานะการดำเนินโครงการ	จำนวน (โครงการ)	ร้อยละ
ดำเนินการเสร็จสิ้น	191	68.21
ระหว่างดำเนินการ	65	23.21
ยังไม่ดำเนินการ	12	4.29
ยกเลิก	12	4.29
รวม	280	100.00

บัญชีรายละเอียด ผลการดำเนินงานโครงการ



รายงานผลการดำเนินงานโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
ณ ไตรมาสที่ 4/2566 (ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2566)

แบบรายงาน 2.1

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	โอนลด (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	ระยะเวลาที่ กำหนดไว้ตาม แผนดำเนินงาน	สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การดำเนินการตาม แผนการดำเนินงาน		
						ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			เป็นไป ตามที่กำหนด	ไม่เป็นไป ตามที่กำหนด	
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน													
1	โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ ถนนกาญจนาภิเษก 16 ซอย 4	68,040.00	-	-	พ.ย.65-ส.ค.66		การไฟฟ้าจัดซื้อจัดจ้าง (จ่ายครึ่งหนึ่งของเงิน งบประมาณ)		34,015.50	34,024.50		✓	
2	โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ ถนนชนเกษม 43 เชื่อมต่อถนนชนเกษม 47	118,390.00	-	-	พ.ย.65-ส.ค.66		การไฟฟ้าจัดซื้อจัดจ้าง (จ่ายครึ่งหนึ่งของเงิน งบประมาณ)		59,193.47	59,196.53		✓	
3	โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ ถนนตลาดล่าง 26 แยกขวา 2	39,570.00	-	-	พ.ย.65-ส.ค.66		การไฟฟ้าจัดซื้อจัดจ้าง (จ่ายครึ่งหนึ่งของเงิน งบประมาณ)		19,781.63	19,788.37		✓	
4	โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ ถนนปากน้ำ 5	57,940.00	-	-	พ.ย.65-ส.ค.66		การไฟฟ้าจัดซื้อจัดจ้าง (จ่ายครึ่งหนึ่งของเงิน งบประมาณ)		28,967.58	28,972.42		✓	
5	โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ ถนนคลองฉนาก	76,570.00	-	-	พ.ย.65-ส.ค.66		การไฟฟ้าจัดซื้อจัดจ้าง (จ่ายครึ่งหนึ่งของเงิน งบประมาณ)		38,284.07	38,285.93		✓	
6	โครงการก่อสร้างสะพานท่าเทียบเรือ พร้อมท่อน้ำขึ้นลง ชุมชนตลาดล่าง	660,000.00	-	-	มี.ค.-ก.ย.66		ขออนุญาต ทำสิ่งล่วงล้ำน้ำ กั้นเงินต่อสภาท้องถิ่น กรณีได้ก่อนนี้ผูกพัน การประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2566 วันที่ 20 ก.ย. 2567		-	660,000.00		✓	

รายงานผลการดำเนินงานโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
ณ ไตรมาสที่ 4/2566 (ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2566)

แบบรายงาน 2.1

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	โอนลด (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	ระยะเวลาที่ กำหนดไว้ตาม แผนดำเนินงาน	สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การดำเนินการตาม แผนการดำเนินงาน	
						ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			เป็นไป ตามที่กำหนด	ไม่เป็นไป ตามที่กำหนด
7	โครงการก่อสร้างสะพานทำเทียบเรือ พร้อมทุนขึ้นลง ชุมชนบางกุ้ง	720,000.00	-	-	มี.ค.-ก.ย.66		ขออนุญาต ทำสิ่งล่วงล้ำนํ้า กั้นเงินต่อสภาท้องถิ่น กรณีมิได้ก่อนนี้ผูกพัน การประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2566 วันที่ 20 ก.ย. 2567		-	720,000.00		✓
8	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ เกาะกลางบ้านบางทาลและศูนย์เรียนรู้ (ก่อสร้างเชื่อมป้องกันดินพังพร้อมทางเดิน)	19,980,000.00	14,954,000.00	-	ม.ค.66-ธ.ค.68		ยกเลิกโครงการ พื้นที่ก่อสร้างยังไม่พร้อม และยังไม่ได้รับอนุญาต ก่อสร้างสิ่งล่วงล้ำนํ้า จากกรมเจ้าท่า		-	5,026,000.00		
9	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณ ถนนตอนนอก จากสี่แยกอนามัย ถึงสี่แยกแสงเพชร	9,100,000.00	-	-	ก.พ.66-ส.ค.67		อยู่ระหว่างกรมราชทัณฑ์ รถถอนอาคารเรือนจำ ยังไม่ส่งมอบพื้นที่ให้กับ เทศบาล กั้นเงินต่อสภาท้องถิ่น กรณีมิได้ก่อนนี้ผูกพัน การประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2566 วันที่ 20 ก.ย. 2567		-	9,100,000.00		✓
10	โครงการปรับปรุงสะพาน ข้ามแม่น้ำตาปี (ช่วงที่ 2)	65,000,000.00	64,999,519.00	-	พ.ค.66-ส.ค.68		ยกเลิกโครงการ นำงบประมาณไปใช้ สำหรับโครงการอื่นเพื่อ แก้ไขปัญหาความ เดือดร้อนของประชาชน			481.00		

รายงานผลการดำเนินงานโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
ณ ไตรมาสที่ 4/2566 (ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2566)

แบบรายงาน 2.1

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	โอนลด (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	ระยะเวลาที่ กำหนดไว้ตาม แผนดำเนินงาน	สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การดำเนินการตาม แผนการดำเนินงาน	
						ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			เป็นไป ตามที่กำหนด	ไม่เป็นไป ตามที่กำหนด
11	โครงการปรับปรุงเส้นทางวิ่ง ริมบึงขุนทะเล (ชุมชนบึงขุนทะเล)	26,000,000.00	24,864,800.00	-	มี.ค.66-ก.พ.67		ยกเลิกโครงการ กรมโยธาธิการและ ผังเมืองยังไม่ได้ส่งมอบ พื้นที่ให้เทศบาล		-	1,135,200.00		
12	โครงการจ้างที่ปรึกษาเพื่อออกแบบปรับปรุง ภูมิทัศน์บึงขุนทะเล	2,500,000.00	-	-	มี.ค.-ก.ย.66		ขั้นตอนพัสดุ กันเงิน กรณีได้ก่อนนี้ ผูกพันไว้แล้วก่อนสิ้น ปีงบประมาณ		-	2,500,000.00		✓
13	โครงการขยายเขตประปา (ตั้งจ่ายรายการใหม่)	1,680,519.00	-	-	ม.ค.-ก.ย.66		ขั้นตอนพัสดุ กันเงินต่อสภาท้องถิ่น กรณีมิได้ก่อนนี้ผูกพัน การประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2566 วันที่ 20 ก.ย. 2566		-	1,680,519.00		✓
14	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ ถนนตลาดใหม่ 3/1 (ตั้งจ่ายรายการใหม่)	187,000.00	-	-	ม.ค.-ก.ย.66		จัดทำแบบแปลน กันเงินต่อสภาท้องถิ่น กรณีมิได้ก่อนนี้ผูกพัน การประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2566 วันที่ 20 ก.ย. 2566		-	187,000.00		✓
15	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ และผิวจราจรถนนตลาดใหม่ 13 (ตั้งจ่ายรายการใหม่)	937,000.00	-	-	มิ.ย.-ก.ย.66		ขออนุมัติราคากลาง ครั้งที่ 2 กันเงินต่อสภาท้องถิ่น กรณีมิได้ก่อนนี้ผูกพัน การประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2566 วันที่ 20 ก.ย. 2566		-	937,000.00		✓

รายงานผลการดำเนินงานโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
ณ ไตรมาสที่ 4/2566 (ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2566)

แบบรายงาน 2.1

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	โอนลด (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	ระยะเวลาที่ กำหนดไว้ตาม แผนดำเนินงาน	สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การดำเนินการตาม แผนการดำเนินงาน	
						ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			เป็นไป ตามที่กำหนด	ไม่เป็นไป ตามที่กำหนด
16	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ และผิวจราจรถนนปทุมพร 6 (ตั้งจ่ายรายการใหม่)	814,000.00	-	-	พ.ค.-ก.ย.67			✓	764,000.00	50,000.00	✓	
17	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ และผิวจราจรถนนปทุมพร 6/2 (ตั้งจ่ายรายการใหม่)	555,000.00	-	-	มิ.ย.-ก.ย.66		กำลังดำเนินการก่อสร้าง กันเงิน กรณีได้ก่อนนี้ ผูกพันไว้แล้วก่อนสิ้น ปีงบประมาณ		-	555,000.00		✓
18	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ และผิวจราจรถนนอำเภอ 8 (ตั้งจ่ายรายการใหม่)	756,000.00	-	-	ม.ค.-ก.ย.66		ยกเลิกโครงการ พื้นที่ก่อสร้างมีขนาดเล็ก เครื่องจักรไม่สามารถเข้า ทำงานได้ บริเวณด้านข้าง ติดกับอาคารพาณิชย์ เกรงจะเสียหายกับตัว อาคาร		-	756,000.00		
19	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ ถนนการเคหะต่อเนื่องถนนพ้อขุนทะเล 3 (ตั้งจ่ายรายการใหม่)	4,026,000.00	-	-	มิ.ย.-ก.ย.66		ขออนุมัติราคากลาง กันเงินต่อสภาท้องถิ่น กรณีได้ก่อนนี้ผูกพัน การประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2566 วันที่ 20 ก.ย. 2566		-	4,026,000.00		✓
20	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ และผิวจราจรถนนพ้อขุนทะเล 15/5 (ตั้งจ่ายรายการใหม่)	1,854,000.00	-	-	มิ.ย.-ก.ย.66		คณะกรรมการจัดทำแบบ รูปรายการงานก่อสร้าง กันเงินต่อสภาท้องถิ่น กรณีได้ก่อนนี้ผูกพัน การประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2566 วันที่ 20 ก.ย. 2566		-	1,854,000.00		✓

รายงานผลการดำเนินงานโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
ณ ไตรมาสที่ 4/2566 (ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2566)

แบบรายงาน 2.1

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	โอนลด (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	ระยะเวลาที่ กำหนดไว้ตาม แผนดำเนินงาน	สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การดำเนินการตาม แผนการดำเนินงาน	
						ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			เป็นไป ตามที่กำหนด	ไม่เป็นไป ตามที่กำหนด
21	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ และผิวจราจรถนนตอนนท 11 ซอยตรงข้ามสนามหญ้าเทียม (ตั้งจ่ายรายการใหม่)	779,000.00	-	-	พ.ค.-ก.ย.66		กำลังดำเนินการก่อสร้าง กันเงิน กรณีได้ก่อนนี้ ผูกพันไว้แล้วก่อนสิ้น ปีงบประมาณ		-	779,000.00		✓
22	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ ถนนตอนนท 37,39 (ตั้งจ่ายรายการใหม่)	2,341,000.00	-	-	พ.ค.-ก.ย.66		รอรังวัดที่ดิน กันเงินต่อสภาท้องถิ่น กรณีได้ก่อนนี้ผูกพัน การประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2566 วันที่ 20 ก.ย. 2566		-	2,341,000.00		✓
23	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ และผิวจราจรถนนข้างโรงเรียนเมือง สุราษฎร์ธานี แยกซ้าย 1 (ตั้งจ่ายรายการใหม่)	355,000.00	-	-	พ.ค.-ก.ย.66		รอรังวัดที่ดิน กันเงินต่อสภาท้องถิ่น กรณีได้ก่อนนี้ผูกพัน การประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2566 วันที่ 20 ก.ย. 2566		-	355,000.00		✓
24	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ ถนนชนเกษมบริเวณสี่แยกเสม็ดเรียง (ตั้งจ่ายรายการใหม่)	1,857,000.00	-	-	เม.ย.-ก.ย.66		รอรังวัดที่ดิน กันเงินต่อสภาท้องถิ่น กรณีได้ก่อนนี้ผูกพัน การประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2566 วันที่ 20 ก.ย. 2566		-	1,857,000.00		✓

รายงานผลการดำเนินงานโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
ณ ไตรมาสที่ 4/2566 (ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2566)

แบบรายงาน 2.1

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	โอนลด (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	ระยะเวลาที่ กำหนดไว้ตาม แผนดำเนินงาน	สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การดำเนินการตาม แผนการดำเนินงาน	
						ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			เป็นไป ตามที่กำหนด	ไม่เป็นไป ตามที่กำหนด
25	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ และผิวจราจรถนนโกลกฐู 1 (ตั้งจ่ายรายการใหม่)	1,877,000.00	-	-	เม.ย.-ก.ย.66		รอรังวัดที่ดิน กันเงินต่อสภาท้องถิ่น กรณีมิได้ก่อนนี้ผูกพัน การประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2566 วันที่ 20 ก.ย. 2566		-	1,877,000.00		✓
26	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ และผิวจราจรถนนโกลกฐู 3 (ตั้งจ่ายรายการใหม่)	1,978,000.00	-	-	เม.ย.-ก.ย.66		รอรังวัดที่ดิน กันเงินต่อสภาท้องถิ่น กรณีมิได้ก่อนนี้ผูกพัน การประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2566 วันที่ 20 ก.ย. 2566		-	1,978,000.00		✓
27	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ และผิวจราจรถนนสวนถั่ว 6 (ตั้งจ่ายรายการใหม่)	141,000.00	-	-	เม.ย.-ก.ย.66			✓	141,000.00	-	✓	
28	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ และผิวจราจรถนนยางงาม (หน้าหมู่บ้านบ้านสวยยางงาม) (ตั้งจ่ายรายการใหม่)	3,513,000.00	-	-	มี.ค.-ก.ย.66		ปรับปรุงแบบใหม่ ให้เหมาะสมกับชุมชน กันเงินต่อสภาท้องถิ่น กรณีมิได้ก่อนนี้ผูกพัน การประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2566 วันที่ 20 ก.ย. 2566		-	3,513,000.00		✓

รายงานผลการดำเนินงานโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
ณ ไตรมาสที่ 4/2566 (ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2566)

แบบรายงาน 2.1

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	โอนลด (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	ระยะเวลาที่ กำหนดไว้ตาม แผนดำเนินงาน	สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การดำเนินการตาม แผนการดำเนินงาน	
						ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			เป็นไป ตามที่กำหนด	ไม่เป็นไป ตามที่กำหนด
29	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ ถนนตลาดล่าง 24 (ตั้งจ่ายรายการใหม่)	2,960,000.00	-	-	มี.ค.-ก.ย.66		รอรังวัดที่ดิน กันเงินต่อสภาท้องถิ่น กรณีได้ก่อนนี้ผูกพัน การประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2566 วันที่ 20 ก.ย. 2566		-	2,960,000.00		✓
30	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ ถนนตลาดล่าง 24 (หลังหมู่บ้านสุขเจริญ) (ตั้งจ่ายรายการใหม่)	4,000,000.00	-	-	มี.ค.-ก.ย.66		รอรังวัดที่ดิน กันเงินต่อสภาท้องถิ่น กรณีได้ก่อนนี้ผูกพัน การประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2566 วันที่ 20 ก.ย. 2566		-	4,000,000.00		✓
31	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ และผิวจราจรถนนปากน้ำ 8/1 (ตั้งจ่ายรายการใหม่)	549,000.00	-	-	ก.พ.-ก.ย.66		กำลังดำเนินการก่อสร้าง กันเงิน กรณีได้ก่อนนี้ ผูกพันไว้แล้วก่อนสิ้น ปีงบประมาณ		-	549,000.00		✓
32	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ และผิวจราจรถนนกาญจนาภิเษก 1 แยก 3 (ตั้งจ่ายรายการใหม่)	970,000.00	-	-	ก.พ.-ก.ย.66		รอรังวัดที่ดิน กันเงินต่อสภาท้องถิ่น กรณีได้ก่อนนี้ผูกพัน การประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2566 วันที่ 20 ก.ย. 2566		-	970,000.00		✓
33	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ และผิวจราจรถนนกาญจนาภิเษก 1 แยก 4 (ตั้งจ่ายรายการใหม่)	729,000.00	-	-	ก.พ.-ก.ย.66		รอรังวัดที่ดิน กันเงินต่อสภาท้องถิ่น กรณีได้ก่อนนี้ผูกพัน การประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2566 วันที่ 20 ก.ย. 2566		-	729,000.00		✓

รายงานผลการดำเนินงานโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
ณ ไตรมาสที่ 4/2566 (ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2566)

แบบรายงาน 2.1

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	โอนลด (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	ระยะเวลาที่ กำหนดไว้ตาม แผนดำเนินงาน	สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การดำเนินการตาม แผนการดำเนินงาน	
						ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			เป็นไป ตามที่กำหนด	ไม่เป็นไป ตามที่กำหนด
34	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ และผิวจราจรถนนกาญจนาภิเษก 16 แยก 1 (ตั้งจ่ายรายการใหม่)	619,000.00	-	-	ม.ค.-ก.ย.66		รอรังวัดที่ดิน กันเงินต่อสภาท้องถิ่น กรณีมิได้ก่อนนี้ผูกพัน การประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2566 วันที่ 20 ก.ย. 2566		-	619,000.00		✓
35	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ และผิวจราจรถนนกาญจนาภิเษก 35/2 (ตั้งจ่ายรายการใหม่)	147,000.00	-	-	ม.ค.-ก.ย.66		ยกเลิกโครงการ ขอยพื้นที่ก่อสร้าง มีขนาดเล็ก เครื่องจักร ไม่สามารถเข้าทำงานได้		-	147,000.00		
36	โครงการก่อสร้างอาคารสถานีสูบน้ำ บ้านมะขาม (ตั้งจ่ายรายการใหม่)	1,130,000.00	-	-	มิ.ย.-ก.ย.66		ออกแบบ เขียนแบบ กันเงินต่อสภาท้องถิ่น กรณีมิได้ก่อนนี้ผูกพัน การประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2566 วันที่ 20 ก.ย. 2566		-	1,130,000.00		✓
37	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ และผิวจราจรถนนชนเกษม 26 (ตั้งจ่ายรายการใหม่)	2,927,000.00	-	-	ก.พ.-ก.ย.66		รอรังวัดที่ดิน กันเงินต่อสภาท้องถิ่น กรณีมิได้ก่อนนี้ผูกพัน การประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2566 วันที่ 20 ก.ย. 2566		-	2,927,000.00		✓

รายงานผลการดำเนินงานโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
ณ ไตรมาสที่ 4/2566 (ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2566)

แบบรายงาน 2.1

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	โอนลด (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	ระยะเวลาที่ กำหนดไว้ตาม แผนดำเนินงาน	สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การดำเนินการตาม แผนการดำเนินงาน	
						ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			เป็นไป ตามที่กำหนด	ไม่เป็นไป ตามที่กำหนด
38	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ ถนนโกลกัฐบริเวณแยกโรงเรียน เทศบาล 1 (ตั้งจ่ายรายการใหม่)	929,000.00	-	-	ก.พ.-ก.ย.66		จัดทำแบบแปลน กันเงินต่อสภาท้องถิ่น กรณีได้ก่อนนี้ผูกพัน การประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2566 วันที่ 20 ก.ย. 2566		-	929,000.00		✓
39	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและ ผิวจราจรถนนศรีเกษมหลังซอยบุญช่วย 3 พร้อมก่อสร้างอาคารสถานีสูบน้ำ และระบบเปิด-ปิดประตูกันน้ำ (ตั้งจ่ายรายการใหม่)	1,800,000.00	-	-	ก.พ.-ก.ย.66		จัดทำแบบแปลน กันเงินต่อสภาท้องถิ่น กรณีได้ก่อนนี้ผูกพัน การประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2566 วันที่ 20 ก.ย. 2566		-	1,800,000.00		✓
40	โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบ ค.ส.ล. พร้อมคูระบายน้ำ ทั้ง 2 ข้าง ถนนปรีดาราชบุรุษ แยกซ้าย 1 (ซอย ส.ดาวเทียม) (ตั้งจ่ายรายการใหม่)	2,000,000.00	-	-	ม.ค.-ก.ย.66		ขั้นตอนพัสดุ กันเงินต่อสภาท้องถิ่น กรณีได้ก่อนนี้ผูกพัน การประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2566 วันที่ 20 ก.ย. 2567		-	2,000,000.00		✓
41	โครงการขยายผิวจราจรถนนคอนนง ช่วงคอสะพานข้ามแม่น้ำตาปี (ตั้งจ่ายรายการใหม่)	5,000,000.00	3,522,200.00	-	ม.ค.-ก.ย.66		กำลังดำเนินการก่อสร้าง กันเงิน กรณีได้ก่อนนี้ ผูกพันไว้แล้วก่อนสิ้น ปีงบประมาณ		-	1,477,800.00		✓
42	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ และผิวจราจรถนนชนเกษม 30 (ตั้งจ่ายรายการใหม่)	1,950,000.00	-	-	ม.ค.-ก.ย.66		รอรังวัดที่ดิน กันเงินต่อสภาท้องถิ่น กรณีได้ก่อนนี้ผูกพัน การประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2566 วันที่ 20 ก.ย. 2566		-	1,950,000.00		✓

รายงานผลการดำเนินงานโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
ณ ไตรมาสที่ 4/2566 (ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2566)

แบบรายงาน 2.1

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	โอนลด (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	ระยะเวลาที่ กำหนดไว้ตาม แผนดำเนินงาน	สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การดำเนินการตาม แผนการดำเนินงาน	
						ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			เป็นไป ตามที่กำหนด	ไม่เป็นไป ตามที่กำหนด
43	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ และผิวจราจรถนนตลาดล่าง 41 (ตั้งจ่ายรายการใหม่)	436,000.00	-	-	ม.ค.-ก.ย.66		รอรังวัดที่ดิน กันเงินต่อสภาท้องถิ่น กรณีได้ก่อนนี้ผูกพัน การประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2566 วันที่ 20 ก.ย. 2566		-	436,000.00		✓
44	โครงการจ้างเหมาผู้ต้องขัง ชุดลอกท่อระบายน้ำ โดยวิธีจ้างเหมา (ตั้งจ่ายรายการใหม่)	2,500,000.00	-	-	พ.ค.-ก.ย.66		ผู้รับจ้างเข้ายื่นข้อเสนอ กันเงิน กรณีได้ก่อนนี้ ผูกพันไว้แล้วก่อนสิ้น ปีงบประมาณ		-	2,500,000.00		✓
45	โครงการขยายผิวจราจรแบบคอนกรีต เสริมเหล็กถนนปากน้ำ บริเวณหน้า หมู่บ้านเสวลักษณ์ 1 (ชุมชนบางกุ้ง) (ตั้งจ่ายรายการใหม่)	350,000.00	-	-	ก.ย.-ธ.ค.66		กันเงินต่อสภาท้องถิ่น กรณีได้ก่อนนี้ผูกพัน การประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2566 วันที่ 20 ก.ย. 2567		-	350,000.00		✓
46	โครงการติดตั้งเสาไฟ High Mast (ตั้งจ่ายรายการใหม่)	2,250,000.00	-	-	ก.ย.66-มี.ค.67		กันเงินต่อสภาท้องถิ่น กรณีได้ก่อนนี้ผูกพัน การประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2566 วันที่ 20 ก.ย. 2566		-	2,250,000.00		✓
47	โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ คอนกรีต (Over-lay) ถนนพ้อขุนทะเล ช่วงที่ 2 (ชุมชนบึงขุนทะเล) (ตั้งจ่ายรายการใหม่)	5,800,000.00	-	-	ต.ค.66-ก.พ.67		กันเงินต่อสภาท้องถิ่น กรณีได้ก่อนนี้ผูกพัน การประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2566 วันที่ 20 ก.ย. 2567		-	5,800,000.00		✓

รายงานผลการดำเนินงานโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
ณ ไตรมาสที่ 4/2566 (ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2566)

แบบรายงาน 2.1

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	โอนลด (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	ระยะเวลาที่ กำหนดไว้ตาม แผนดำเนินงาน	สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การดำเนินการตาม แผนการดำเนินงาน	
						ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			เป็นไป ตามที่กำหนด	ไม่เป็นไป ตามที่กำหนด
48	โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ คอนกรีต ถนนเมืองใหม่ (ชุมชนบางกุ้ง) (ตั้งจ่ายรายการใหม่)	2,800,000.00	-	-	ต.ค.66-ก.พ.67		กันเงินต่อสภาท้องถิ่น กรณีได้ก่อนนี้ผูกพัน การประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2566 วันที่ 20 ก.ย. 2568		-	2,800,000.00		✓
รวม		187,817,029.00	108,340,519.00	-					1,085,242.25	78,391,267.75		
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว												
49	โครงการเค้าทะดาว/สวัสดิ์ปีใหม่	500,000.00	500,000.00	-	ต.ค.65-ก.พ.66		ยกเลิกโครงการ งดกิจกรรมรื่นเริง เพื่อถวายแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณี สิริพัชร มหาวัชรราชธิดา		-	-		
50	โครงการตลาดสะพานโค้ง 100 ปี	500,000.00		200,000.00	ต.ค.65-ก.ย.66			✓	556,700.00	143,300.00	✓	
51	โครงการถนนคนเดิน	300,000.00	-	-	ต.ค.65-ก.ย.66			✓	214,800.00	85,200.00	✓	
52	โครงการเย็นทั่วหล้ามหาสงกรานต์	500,000.00	50,000.00	150,000.00	ม.ค.-มิ.ย.66			✓	575,600.00	24,400.00		✓
53	โครงการส่งเสริมกิจกรรมและประชาสัมพันธ์ การท่องเที่ยว เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี	1,750,000.00	-	150,000.00	ต.ค.65-ก.ย.66			✓	1,890,000.00	10,000.00	✓	
54	โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ สถานประกอบการด้านการท่องเที่ยว เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี (ตั้งจ่ายรายการใหม่)	600,000.00	-	-	มิ.ย.-ก.ย.66			✓	594,120.00	5,880.00	✓	
รวม		4,150,000.00	550,000.00	500,000.00					3,831,220.00	268,780.00		

รายงานผลการดำเนินงานโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
ณ ไตรมาสที่ 4/2566 (ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2566)

แบบรายงาน 2.1

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	โอนลด (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	ระยะเวลาที่ กำหนดไว้ตาม แผนดำเนินงาน	สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การดำเนินการตาม แผนการดำเนินงาน	
						ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			เป็นไป ตามที่กำหนด	ไม่เป็นไป ตามที่กำหนด
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม												
55	โครงการลดโลกร้อนกับ นครสุราษฎร์ธานี	200,000.00	64,425.00	-	ต.ค.65-ก.ย.66			✓	135,575.00	-	✓	
56	โครงการเฝ้าระวังสิ่งแวดล้อมเมือง	200,000.00	114,428.00	-	ต.ค.65-ก.ย.66			✓	85,572.00	-	✓	
57	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาเหตุรำคาญ ตามแนวทางพระราชบัญญัติ การสาธารณสุข พ.ศ. 2535	70,000.00	70,000.00	-	ต.ค.65-ก.ย.66			✓	-	-	✓	
58	โครงการลดขยะต้นทางกับนครสุราษฎร์ธานี	300,000.00	-	20,000.00	ต.ค.65-ก.ย.66			✓	286,070.00	33,930.00	✓	
59	โครงการซ่อมแซมปรับปรุงพื้น ลานอเนกประสงค์บริเวณสะพานริศ (ตั้งจ่ายรายการใหม่)	500,000.00	-	-	ก.ย.-ธ.ค.66		กันเงินต่อสภาท้องถิ่น กรณีได้ก่อนนี้ผูกพัน การประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2566 วันที่ 20 ก.ย. 2567		-	500,000.00	✓	
รวม		1,270,000.00	248,853.00	20,000.00					507,217.00	533,930.00		
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสวัสดิการสังคมและคุณภาพชีวิต												
60	โครงการฝึกอบรมซ่อมแผนป้องกันและระงับ อัคคีภัย	50,000.00	-	50,000.00	เม.ย.-พ.ค.66			✓	86,920.00	13,080.00	✓	
61	โครงการจัดตั้งศูนย์เฉพาะกิจช่วยเหลือ ผู้ประสบภัยในช่วงเทศกาล	50,000.00	-	-	ธ.ค.65-เม.ย.66			✓	43,425.00	6,575.00	✓	
62	โครงการฝึกอบรมและฝึกทบทวนอาสาสมัคร ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)	50,000.00	-	180,000.00	ส.ค.-ก.ย.66			✓	118,723.00	111,277.00	✓	
63	โครงการอบรมและพัฒนาศักยภาพ แกนนำสุขภาพชุมชน	1,201,300.00	87,500.00	10,000.00	พ.ย.65-พ.ค.66			✓	1,123,750.28	49.72	✓	
64	โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วม การดำเนินงานของแกนนำสุขภาพชุมชน	79,200.00	13,800.00	-	ต.ค.65-ก.ย.66			✓	64,800.00	600.00	✓	

รายงานผลการดำเนินงานโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
ณ ไตรมาสที่ 4/2566 (ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2566)

แบบรายงาน 2.1

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	โอนลด (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	ระยะเวลาที่ กำหนดไว้ตาม แผนดำเนินงาน	สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การดำเนินการตาม แผนการดำเนินงาน	
						ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			เป็นไป ตามที่กำหนด	ไม่เป็นไป ตามที่กำหนด
65	โครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพ อนามัยแม่และเด็กของสมเด็จพระกนิษฐา ธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	200,000.00	6,600.00	-	ก.ค.-ก.ย.66			✓	193,400.00	-	✓	
66	โครงการรณรงค์การควบคุม โรคขาดสารไอโอดีนของ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ เจ้าฟ้ามหจักรีสิรินธรฯ สยามบรมราชกุมารี	200,000.00	27,225.00	-	เม.ย.-มิ.ย.66			✓	172,775.00	-	✓	
67	โครงการปรับปรุงภาวะโภชนาการและ สุขภาพเด็กของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ เจ้าฟ้ามหจักรีสิรินธรฯ สยามบรมราชกุมารี	200,000.00	325.00	-	มิ.ย.-ส.ค.66			✓	199,675.00	-	✓	
68	โครงการอบรมด้านสุขาภิบาลอาหารสำหรับ ผู้ประกอบการ ด้านอาหารและผู้สัมผัสอาหาร	100,000.00	6,880.00	-	ธ.ค.65-มี.ค.66			✓	93,120.00	-	✓	
69	โครงการแม่ลูกพันธุ์ดี	57,000.00	-	-	ต.ค.65-ก.ย.66			✓	57,000.00	-	✓	
70	โครงการตลาดนัด ตลาดน้ำ บ้านดอน	200,000.00	40,120.00	-	ต.ค.65-ก.ย.66			✓	159,880.00	-	✓	
71	โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการและ ยกระดับสถานประกอบการจำหน่ายอาหาร ในเขตเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี	700,000.00	44,550.00	-	มิ.ย.-ส.ค.66			✓	655,450.00	-	✓	

รายงานผลการดำเนินงานโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
ณ ไตรมาสที่ 4/2566 (ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2566)

แบบรายงาน 2.1

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	โอนลด (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	ระยะเวลาที่ กำหนดไว้ตาม แผนดำเนินงาน	สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การดำเนินการตาม แผนการดำเนินงาน	
						ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			เป็นไป ตามที่กำหนด	ไม่เป็นไป ตามที่กำหนด
72	โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล ในโรงเรียนและชุมชนของ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรฯ สยามบรมราชกุมารี	400,000.00	87,850.00	-	ก.ค.-ส.ค.66			✓	312,150.00	-	✓	
73	โครงการช่วยลดการติดเอดส์ จากแม่สู่ลูกสภากาชาดไทย พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้า โสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ	200,000.00	875.00	-	ก.ค.-ก.ย.66			✓	199,125.00	-	✓	
74	โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหา ยาเสพติด To Be Number One (ศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่นในชุมชน/หมู่บ้าน) ของมูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี	200,000.00	50,115.00	-	ก.ค.-ก.ย.66			✓	149,885.00	-	✓	
75	โครงการอุดหนุนวัดกลางใหม่ เพื่อปรับปรุงซ่อมแซม฼มาปณสถาน (เตาเผาศพ)	2,000,000.00	-	-	ม.ค.-มิ.ย.66			✓	2,000,000.00	-	✓	
76	โครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายผู้สูงอายุ เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี	800,000.00	8,000.00	-	พ.ย.-ธ.ค.65			✓	791,950.00	50.00	✓	
77	โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิต บนพื้นฐานคุณค่าภูมิปัญญาสู่สังคมอายุยืน	170,000.00	-	-	พ.ย.65-ส.ค.66			✓	75,450.00	94,550.00	✓	
78	โครงการศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริม อาชีพผู้สูงอายุ (ศพอส.) เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี	250,000.00	-	-	ต.ค.65-ส.ค.66			✓	95,245.00	154,755.00	✓	
79	โครงการขับเคลื่อนกิจกรรมสภาเด็ก และเยาวชนเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี	50,000.00	11,470.00	-	พ.ย.65-ส.ค.66			✓	1,125.00	37,405.00	✓	

รายงานผลการดำเนินงานโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
ณ ไตรมาสที่ 4/2566 (ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2566)

แบบรายงาน 2.1

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	โอนลด (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	ระยะเวลาที่กำหนดไว้ตาม แผนดำเนินงาน	สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การดำเนินการตาม แผนการดำเนินงาน	
						ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			เป็นไป ตามที่กำหนด	ไม่เป็นไป ตามที่กำหนด
80	โครงการส่งเสริมและพัฒนาสวัสดิภาพเด็กและเยาวชน	150,000.00	-	-	ม.ค.-ส.ค.66			✓	55,200.00	94,800.00	✓	
81	โครงการฝึกอบรมและศึกษาเรียนรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้นำเด็กและเยาวชน	500,000.00	80,530.00	-	ม.ค.-ส.ค.66			✓	419,470.00	-	✓	
82	โครงการรณรงค์ป้องกันยาเสพติดในชุมชน	80,000.00	-	-	มิ.ย.-66			✓	71,775.00	8,225.00	✓	
83	โครงการพัฒนาศูนย์พักพิงเด็กในพื้นที่ทางภูมิศาสตร์ GIS ผู้รับเบี้ยผู้สูงอายุและผู้พิการ เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี	64,000.00	-	-	พ.ย.65-ส.ค.66	✓			-	64,000.00		✓
84	โครงการเสริมสร้างและพิทักษ์สิทธิสวัสดิการผู้รับเบี้ยยังชีพ	10,000.00	-	-	ต.ค.-ธ.ค.65			✓	9,999.69	0.31	✓	
85	โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสวัสดิการสังคม	50,000.00	-	-	เม.ย.-มิ.ย.66			✓	48,125.00	1,875.00	✓	
86	โครงการบริการทำบัตรประจำตัวคนพิการที่บ้านและส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (At Home Service: ID Card Registration for Person with Disabilities)	50,000.00	-	-	ต.ค.65-ก.ย.66			✓	43,685.00	6,315.00	✓	
87	โครงการบริการรับลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุถึงที่บ้าน (At Home Service : Allowance Registration)	50,000.00	-	-	ต.ค.65-ก.ย.66			✓	17,815.00	32,185.00	✓	
88	โครงการพัฒนาศักยภาพสตรี	800,000.00	-	-	ม.ค.-มิ.ย.66			✓	766,710.00	33,290.00	✓	
89	โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการกลุ่มผู้นำสตรีเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี	100,000.00	-	-	ต.ค.65-ก.ย.66			✓	16,100.00	83,900.00	✓	
90	โครงการสตรีต้นแบบในชุมชนผู้ทำหน้าที่มารดาที่สมบูรณ์แบบ	200,000.00	-	-	ก.ค.-ส.ค.66			✓	167,280.00	32,720.00	✓	

รายงานผลการดำเนินงานโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
ณ ไตรมาสที่ 4/2566 (ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2566)

แบบรายงาน 2.1

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	โอนลด (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	ระยะเวลาที่ กำหนดไว้ตาม แผนดำเนินงาน	สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การดำเนินการตาม แผนการดำเนินงาน	
						ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			เป็นไป ตามที่กำหนด	ไม่เป็นไป ตามที่กำหนด
91	โครงการส่งเสริมการใช้จักรยานเพื่อพัฒนา คุณภาพชีวิตประชาชนในชุมชน	20,000.00	-	-	มี.ค.-มิ.ย.66			✓	18,775.00	1,225.00	✓	
92	โครงการประกวดชุมชนเข้มแข็ง	200,000.00	-	-	ม.ค.-มิ.ย.66			✓	125,550.00	74,450.00	✓	
93	โครงการพัฒนาระบบการเรียนรู้ เพื่อสร้างชุมชนเข้มแข็งในการพัฒนาชุมชน	500,000.00	40,000.00	-	ธ.ค.65-ก.ย.66			✓	291,935.00	168,065.00	✓	
94	โครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการ เครือข่ายชุมชนคณะกรรมการเขตพัฒนา ชุมชน คณะกรรมการชุมชนและองค์กร ชุมชนอื่น ๆ	1,350,000.00	-	-	พ.ย.65-ก.ย.66			✓	933,350.00	416,650.00	✓	
95	โครงการแข่งขันกีฬาพื้นบ้านชุมชนสัมพันธ์	300,000.00	22,000.00	-	ธ.ค.-65			✓	241,860.00	36,140.00	✓	
96	โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ เครือข่ายผู้ผลิตผลิตภัณฑ์ชุมชน	42,000.00	-	-	พ.ย.65-ส.ค.66			✓	24,990.00	17,010.00	✓	
97	โครงการส่งเสริมและพัฒนา การยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชน และการเข้าถึงช่องทางการจำหน่าย อย่างรู้เท่าทัน	90,000.00	-	-	มิ.ย.-ส.ค.66			✓	69,790.00	20,210.00	✓	
98	โครงการส่งเสริมอาชีพผู้ว่างงาน	150,000.00	-	-	เม.ย.-ส.ค.66	✓			-	150,000.00		✓
99	โครงการอบรมการใช้เทคโนโลยีและ เครื่องมือการสื่อสารในยุคปัจจุบัน	50,000.00	-	-	พ.ย.65-ก.ย.66			✓	40,855.00	9,145.00	✓	
100	โครงการพัฒนาระบบข้อมูลครัวเรือนชุมชน เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี	50,000.00	-	-	พ.ย.65-ก.ย.66	✓			-	50,000.00		✓
101	โครงการส่งเสริมศักยภาพและพัฒนาระบบ สวัสดิการสังคม	20,000.00	-	-	พ.ย.65-ก.ย.66			✓	18,225.00	1,775.00	✓	

รายงานผลการดำเนินงานโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
ณ ไตรมาสที่ 4/2566 (ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2566)

แบบรายงาน 2.1

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	โอนลด (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	ระยะเวลาที่ กำหนดไว้ตาม แผนดำเนินงาน	สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การดำเนินการตาม แผนการดำเนินงาน	
						ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			เป็นไป ตามที่กำหนด	ไม่เป็นไป ตามที่กำหนด
102	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการซ่อมแซม เครื่องมือประมงชายฝั่ง/ชุมชนหาดตายวง	75,000.00	-	-	ม.ค.-ส.ค.66			✓	75,000.00	-	✓	
103	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการเลี้ยง และจัดการไก่ไข่ /ชุมชนบ้านบางทอง	77,400.00	-	-	ม.ค.-ส.ค.66			✓	77,400.00	-	✓	
104	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพ ปลูกผักปลอดสารพิษในกระถาง /ชุมชนคลองฉนาก	67,600.00	-	-	ม.ค.-ส.ค.66			✓	67,600.00	-	✓	
105	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพ การแปรรูปเครื่องต้มสมุนไพรและ เบเกอรี่สมุนไพร/ชุมชนตลาดล่าง	67,500.00	-	-	ม.ค.-ส.ค.66			✓	67,500.00	-	✓	
106	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพ ปลูกผักสวนครัวในตะกร้าพลาสติก /ชุมชนหัวแหลมพัฒนา	68,100.00	-	-	ม.ค.-ส.ค.66			✓	68,100.00	-	✓	
107	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพ การทำขนมไทย (ขนมฝอยทอง ขนมชั้น ขนมหม้อแกง ขนมจู้น)/ชุมชนหลังอาชีวะ	80,000.00	-	-	ม.ค.-ส.ค.66			✓	80,000.00	-	✓	
108	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพ การทำน้ำพริก (น้ำพริกโตปลาแห้ง น้ำพริกตาแดง น้ำพริกนรก น้ำพริกกุ้งเสียบ) /ชุมชนตลาดใหม่-ดอนนก	61,900.00	-	-	ม.ค.-ส.ค.66			✓	61,900.00	-	✓	
109	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพ การทำขนมไทย (ต้มใบกระพ้อ ข้าวต้มมัด แฟนซี) /ชุมชนวัดโพธาราม	60,000.00	-	-	ม.ค.-ส.ค.66			✓	60,000.00	-	✓	

รายงานผลการดำเนินงานโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
ณ ไตรมาสที่ 4/2566 (ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2566)

แบบรายงาน 2.1

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	โอนลด (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	ระยะเวลาที่ กำหนดไว้ตาม แผนดำเนินงาน	สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การดำเนินการตาม แผนการดำเนินงาน	
						ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			เป็นไป ตามที่กำหนด	ไม่เป็นไป ตามที่กำหนด
110	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพ การทำน้ำสลัด ชุดอาหารว่าง (สลัดโรล แซนวิช) และน้ำสมุนไพร (กระเจี๊ยบ อัญชัญ ชিং) /ชุมชนเทศบาล	69,800.00	-	-	ม.ค.-ส.ค.66			✓	69,800.00	-	✓	
111	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพ การเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์กระจุต /ชุมชนตาปี	80,000.00	-	-	ม.ค.-ส.ค.66			✓	80,000.00	-	✓	
112	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพ การทำขนม (ขนมปุยฝ้ายแพนชี,ขนมชั้น ดอกไม้,ขนมกล้วย, อาลัวไส้ทุเรียน, ขนมผกากรอง, ขนมบัวหิมะนมสด) /ชุมชนวัดไทร	80,000.00	-	-	ม.ค.-ส.ค.66			✓	80,000.00	-	✓	
113	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพ การเพ้นท์สีกากเพชรบนผ้าปาเต๊ะ /ชุมชนสหกรณ์ครู	63,000.00	-	-	ม.ค.-ส.ค.66			✓	63,000.00	-	✓	
114	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพ การทำขนมเทียนโบราณและ น้ำแก๊กฮวย/ชุมชนตลาดท่าเรือ	50,100.00	-	-	ม.ค.-ส.ค.66	✓			-	50,100.00		✓
115	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพ การทำขนม (เค้กฟรุตสลัด ขนมชั้น น้ำตาลสด) และน้ำสมุนไพร เพื่อสุขภาพ/ชุมชนตลาดเกษตร 2	80,000.00	-	-	ม.ค.-ส.ค.66			✓	80,000.00	-	✓	
116	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพ การทำเสื้อผ้ามัดย้อมพร้อมสกรีน /ชุมชนราษฎร์บำรุง-ดอนนก	56,600.00	-	-	ม.ค.-ส.ค.66			✓	56,600.00	-	✓	

รายงานผลการดำเนินงานโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
ณ ไตรมาสที่ 4/2566 (ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2566)

แบบรายงาน 2.1

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	โอนลด (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	ระยะเวลาที่ กำหนดไว้ตาม แผนดำเนินงาน	สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การดำเนินการตาม แผนการดำเนินงาน	
						ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			เป็นไป ตามที่กำหนด	ไม่เป็นไป ตามที่กำหนด
117	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพ การทำไวน์จากข้าวไรซ์เบอร์รี่และผลไม้/ชุมชน ราษฎร์อุทิศ	80,000.00	-	-	ม.ค.-ส.ค.66			✓	80,000.00	-	✓	
118	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพ ปลูกผักสวนครัวในตะกร้าพลาสติก /ชุมชนหน้าด่าน	69,500.00	-	-	ม.ค.-ส.ค.66			✓	69,500.00	-	✓	
119	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพ การทำถ่านอัดแท่ง /ชุมชนฝั่งบางใบไม้	66,200.00	-	-	ม.ค.-ส.ค.66			✓	66,200.00	-	✓	
120	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพ ทำเครื่องมือประมงชายฝั่ง /ชุมชนบ้านบางหลา	75,200.00	-	-	ม.ค.-ส.ค.66			✓	75,200.00	-	✓	
121	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพ การจัดสานกระเป๋จากเส้นพลาสติก /ชุมชนอ้อมค่ายวิภาวดีรังสิต	40,000.00	-	-	ม.ค.-ส.ค.66			✓	40,000.00	-	✓	
122	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพ ตัดเย็บกระเป๋าผ้าลดโลกร้อน /ชุมชนตลาดหน้าศูนย์สร้างทาง	73,000.00	-	-	ม.ค.-ส.ค.66			✓	73,000.00	-	✓	
123	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพ การทำเบเกอร์รี่ /ชุมชนสาวลักษณ์	59,500.00	-	-	ม.ค.-ส.ค.66			✓	59,500.00	-	✓	
124	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพ การทำผ้ามัดย้อม/ชุมชนบางกุ้ง 1	64,000.00	-	-	ม.ค.-ส.ค.66			✓	64,000.00	-	✓	
125	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพ การทำน้ำพริกพื้นบ้าน (น้ำพริกมะขาม น้ำพริกกาหมู น้ำพริกตะไคร้ น้ำพริกตาแดง) /ชุมชนบางกุ้ง 3	67,000.00	-	-	ม.ค.-ส.ค.66			✓	67,000.00	-	✓	

รายงานผลการดำเนินงานโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
ณ ไตรมาสที่ 4/2566 (ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2566)

แบบรายงาน 2.1

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	โอนลด (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	ระยะเวลาที่ กำหนดไว้ตาม แผนดำเนินงาน	สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การดำเนินการตาม แผนการดำเนินงาน	
						ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			เป็นไป ตามที่กำหนด	ไม่เป็นไป ตามที่กำหนด
126	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพ การแปรรูปผลิตภัณฑ์อาหารทะเล /ชุมชนหลังคั้ง	54,700.00	-	-	ม.ค.-ส.ค.66			✓	54,700.00	-	✓	
127	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพ การเลี้ยงปลาดุก /ชุมชนปากน้ำ	60,000.00	-	-	ม.ค.-ส.ค.66			✓	60,000.00	-	✓	
128	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพ การทำน้ายาซักผ้าและน้ายาปรับผ้านุ่ม /ชุมชนไทยสมุทร	36,800.00	-	-	ม.ค.-ส.ค.66	✓			-	36,800.00		✓
129	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพ การทำน้ายาเอนกประสงค์ /ชุมชนวัดท่าทอง	49,300.00	-	-	ม.ค.-ส.ค.66			✓	49,300.00	-	✓	
130	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพ การทำผ้ามัดย้อม /ชุมชนกาญจนวิถิ์ร่วมใจ	70,000.00	-	-	ม.ค.-ส.ค.66			✓	70,000.00	-	✓	
131	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพ การเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์กระจูด /ชุมชนโพหวาย	68,000.00	-	-	ม.ค.-ส.ค.66			✓	68,000.00	-	✓	
132	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพ การผลิตเครื่องมือประมงพื้นบ้าน /ชุมชนบางกุ้ง	60,000.00	-	-	ม.ค.-ส.ค.66			✓	60,000.00	-	✓	
133	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพ การทำผ้ามัดย้อม /ชุมชนสันติสุข	70,600.00	-	-	ม.ค.-ส.ค.66			✓	70,600.00	-	✓	
134	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพ การทำกระเป๋ากะจูดเคดูพาง /ชุมชนเปี่ยมสุข	70,700.00	-	-	ม.ค.-ส.ค.66			✓	70,700.00	-	✓	

รายงานผลการดำเนินงานโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
ณ ไตรมาสที่ 4/2566 (ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2566)

แบบรายงาน 2.1

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	โอนลด (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	ระยะเวลาที่ กำหนดไว้ตาม แผนดำเนินงาน	สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การดำเนินการตาม แผนการดำเนินงาน	
						ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			เป็นไป ตามที่กำหนด	ไม่เป็นไป ตามที่กำหนด
135	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพ การทำยาต้มสมุนไพร /ชุมชนมณฑลทหารบกที่ 45	65,300.00	-	-	ม.ค.-ส.ค.66	✓			-	65,300.00		✓
136	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพ การเพาะเห็ดนางฟ้า/ชุมชน ร.25 พัน 3	66,000.00	-	-	ม.ค.-ส.ค.66			✓	66,000.00	-	✓	
137	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพ การแปรรูป/ถนอมอาหารทะเล /ชุมชนบางกุ้ง2	61,500.00	-	-	ม.ค.-ส.ค.66			✓	61,500.00	-	✓	
138	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพ การผูกผ้าประดับอาคาร /ชุมชนกรมทหารราบที่ 25	65,000.00	-	-	ม.ค.-ส.ค.66			✓	65,000.00	-	✓	
139	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพ การสานกระเป๋จากเส้นพลาสติก /ชุมชนหน้าสนามกีฬา	70,000.00	-	-	ม.ค.-ส.ค.66			✓	70,000.00	-	✓	
140	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพ การทำไต้ปลาแห้งและแหนมต้ม /ชุมชนหน้าค่ายอส.	64,000.00	-	-	ม.ค.-ส.ค.66			✓	64,000.00	-	✓	
141	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพเกษตรอินทรีย์ อย่างยั่งยืน (ต่อเนื่องปี 2565) /ชุมชนลูกเสือ-การุณราชบุรี	76,000.00	-	-	ม.ค.-ส.ค.66			✓	76,000.00	-	✓	
142	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพ การแปรรูปและถนอมอาหาร ไข่เค็มแห้งและปลาต้มเค็มรส /ชุมชนเมตตารธรรม	64,000.00	-	-	ม.ค.-ส.ค.66			✓	64,000.00	-	✓	
143	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพ การพ่นท้แก้วและเครื่องใช้ ในครัวเรือน/ชุมชนหน้าศาลากลาง	62,000.00	-	-	ม.ค.-ส.ค.66			✓	62,000.00	-	✓	

รายงานผลการดำเนินงานโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
ณ ไตรมาสที่ 4/2566 (ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2566)

แบบรายงาน 2.1

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	โอนลด (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	ระยะเวลาที่ กำหนดไว้ตาม แผนดำเนินงาน	สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การดำเนินการตาม แผนการดำเนินงาน	
						ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			เป็นไป ตามที่กำหนด	ไม่เป็นไป ตามที่กำหนด
144	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพ การพัฒนาอาชีพเรียนการตัดผมชาย /ชุมชนเพชรวิลล่า	65,000.00	-	-	ม.ค.-ส.ค.66			✓	65,000.00	-	✓	
145	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพ การแพ้น้ำพริกเผ็ด/ชุมชนศรีธานี	75,000.00	-	-	ม.ค.-ส.ค.66			✓	75,000.00	-	✓	
146	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพสิ่งประดิษฐ์ ภูมิปัญญาไทยจากผ้าขาวม้า /ชุมชนหนองบัว	76,000.00	-	-	ม.ค.-ส.ค.66			✓	76,000.00	-	✓	
147	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพ การเลี้ยงปลานิลจิตรลดาในบ่อดิน /ชุมชนค่ายวิภาวดีรังสิต	64,000.00	-	-	ม.ค.-ส.ค.66			✓	64,000.00	-	✓	
148	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพ การทำน้ำพริกกากหมู น้ำพริกกุ้งสด ไต่ปลาแห้ง น้ำพริกตะไคร้ /ชุมชนศรีธานี-ยางงาม	77,000.00	-	-	ม.ค.-ส.ค.66			✓	77,000.00	-	✓	
149	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพ การเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์กระจุ๊ด /ชุมชนเสรีไทย	63,000.00	-	-	ม.ค.-ส.ค.66			✓	63,000.00	-	✓	
150	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพ ปลูกพืชผักพื้นบ้านและการทำน้ำมันหอม ระเหยจากสมุนไพร /ชุมชนเสรีพล	77,000.00	-	-	ม.ค.-ส.ค.66			✓	77,000.00	-	✓	
151	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพ เพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ด้วยศิลปะเดคูพาจ /ชุมชนวังเพชร	74,000.00	-	-	ม.ค.-ส.ค.66			✓	74,000.00	-	✓	
152	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพ การทำหมฝอยและคั่วกลิ้งไต่ปลาแห้ง /ชุมชนพวงเพชรพัฒนา	63,000.00	-	-	ม.ค.-ส.ค.66			✓	63,000.00	-	✓	

รายงานผลการดำเนินงานโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
ณ ไตรมาสที่ 4/2566 (ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2566)

แบบรายงาน 2.1

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	โอนลด (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	ระยะเวลาที่ กำหนดไว้ตาม แผนดำเนินงาน	สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การดำเนินการตาม แผนการดำเนินงาน	
						ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			เป็นไป ตามที่กำหนด	ไม่เป็นไป ตามที่กำหนด
153	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพ การทำหมฝอยและหมูกระเจก /ชุมชนตลาดดอนนอก	65,000.00	-	-	ม.ค.-ส.ค.66			✓	65,000.00	-	✓	
154	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพ การปลูกพืชผักสวนครัวเกษตรอินทรีย์วิถี ชุมชนเมือง (ต่อเนื่องปี2565) /ชุมชนเสม็ดเรียง	77,000.00	-	-	ม.ค.-ส.ค.66			✓	77,000.00	-	✓	
155	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพ การแปรรูปอาหาร /ชุมชนวัดกลางใหม่	75,000.00	-	-	ม.ค.-ส.ค.66			✓	75,000.00	-	✓	
156	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพ การทำขนมไทย/ชุมชนวัดหน้าเมือง	66,000.00	-	-	ม.ค.-ส.ค.66			✓	66,000.00	-	✓	
157	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพ การทำชุดอาหารเช้า/ชุมชนดงตาล	76,000.00	-	-	ม.ค.-ส.ค.66			✓	76,000.00	-	✓	
158	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพ การทำขนมไทย /ชุมชนเคหะชุมชน	69,000.00	-	-	ม.ค.-ส.ค.66			✓	69,000.00	-	✓	
159	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพ การทำขนมเบเกอรี่และขนมไทย /ชุมชนบึงขุนทะเล	73,000.00	-	-	ม.ค.-ส.ค.66			✓	73,000.00	-	✓	
160	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพ การทำเกษตรปลอดภัยในชุมชนเมือง /ชุมชนสิริสุข	76,000.00	-	-	ม.ค.-ส.ค.66			✓	76,000.00	-	✓	
161	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพ การเลี้ยงกิ้งก่ามุกรามในปล่องป่อ /ชุมชนศรีวิชัย	71,000.00	-	-	ม.ค.-ส.ค.66	✓			-	71,000.00		✓
162	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพ การทำเครื่องตีสมุนไพรรและขนมไทย /ชุมชนท่าแขก	72,000.00	-	-	ม.ค.-ส.ค.66			✓	72,000.00	-	✓	

รายงานผลการดำเนินงานโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
ณ ไตรมาสที่ 4/2566 (ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2566)

แบบรายงาน 2.1

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	โอนลด (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	ระยะเวลาที่ กำหนดไว้ตาม แผนดำเนินงาน	สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การดำเนินการตาม แผนการดำเนินงาน	
						ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			เป็นไป ตามที่กำหนด	ไม่เป็นไป ตามที่กำหนด
163	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพ การเพาะเห็ดนางฟ้าและเห็ดภูฐาน /ชุมชนท่ากูบ	60,000.00	-	-	ม.ค.-ส.ค.66			✓	60,000.00	-	✓	
164	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพ การทำขนมไทย/ชุมชนนาเนียน	62,000.00	-	-	ม.ค.-ส.ค.66			✓	62,000.00	-	✓	
165	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพ การทำกาแฟโมก้าพอด/ชุมชนในสีก	69,000.00	-	-	ม.ค.-ส.ค.66			✓	69,000.00	-	✓	
166	โครงการอุดหนุนส่งเสริมด้วยเทคนิค เดคูพาจ/ชุมชนรวมเพชรสามัคคี	72,000.00	-	-	ม.ค.-ส.ค.66			✓	72,000.00	-	✓	
167	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพ การพันธ์ผลิตภัณซ์ด้วยเทคนิค เดคูพาจ/ชุมชนมะขามเตี้ย	71,000.00	-	-	ม.ค.-ส.ค.66			✓	71,000.00	-	✓	
168	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพ การทำพวงหรีดและดอกไม้จันทน์ /ชุมชนทุ่งน้อย	65,000.00	-	-	ม.ค.-ส.ค.66			✓	65,000.00	-	✓	
169	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพ การทำไข่เค็มการแปรรูปอาหารจาก ไข่เค็ม/ชุมชนแหลมทราย	64,000.00	-	-	ม.ค.-ส.ค.66			✓	64,000.00	-	✓	
170	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพ การทำอาหารว่าง/ชุมชนย่านยาว	70,000.00	-	-	ม.ค.-ส.ค.66			✓	70,000.00	-	✓	
171	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพ การพันธ์ผ้าปาเต๊ะ/ชุมชนบ้านบางใหญ่	75,000.00	-	-	ม.ค.-ส.ค.66			✓	75,000.00	-	✓	

รายงานผลการดำเนินงานโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
ณ ไตรมาสที่ 4/2566 (ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2566)

แบบรายงาน 2.1

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	โอนลด (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	ระยะเวลาที่ กำหนดไว้ตาม แผนดำเนินงาน	สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การดำเนินการตาม แผนการดำเนินงาน	
						ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			เป็นไป ตามที่กำหนด	ไม่เป็นไป ตามที่กำหนด
172	โครงการสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และ ขึ้นทะเบียนสัตว์ ตามโครงการ สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจาก โรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้า นอองนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรชิตดิยราชนารี	80,000.00	54,100.00	-	ต.ค.65-ก.ย.66			✓	7,200.00	18,700.00	✓	
173	โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจาก โรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศ.ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒนวรชิตดิยราชนารี	399,800.00	139,800.00	-	ต.ค.65-ก.ย.66			✓	260,000.00	-	✓	
174	โครงการทำหมันสุนัข/แมวจรจัดที่อาศัย ในวัด 15 วัด และในชุมชน 70 ชุมชน	200,000.00	25,400.00	-	ต.ค.65-ก.ย.66			✓	174,560.00	40.00	✓	
175	โครงการอุดหนุนกองทุนสวัสดิการชุมชน เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี (งบกลาง)	2,007,500.00	-	-	ม.ค.-ก.ย.66			✓	56,940.00	1,950,560.00		✓
176	โครงการสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี (งบกลาง)	3,600,000.00	-	-	ต.ค.65-ก.ย.66			✓	3,600,000.00	-	✓	
177	โครงการปรับปรุงและซ่อมแซม โรงฆ่าสัตว์ เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี (ตั้งจ่ายรายการใหม่)	1,795,430.00	-	-	ม.ค.-เม.ย.66		ขั้นตอนพัสดุ กันเงินต่อสภาท้องถิ่น กรณีมิได้ก่อหนี้ผูกพัน การประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2566 วันที่ 20 ก.ย. 2566		-	1,795,430.00		✓

รายงานผลการดำเนินงานโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
ณ ไตรมาสที่ 4/2566 (ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2566)

แบบรายงาน 2.1

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	โอนลด (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	ระยะเวลาที่ กำหนดไว้ตาม แผนดำเนินงาน	สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การดำเนินการตาม แผนการดำเนินงาน	
						ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			เป็นไป ตามที่กำหนด	ไม่เป็นไป ตามที่กำหนด
178	โครงการช่วยเหลือประชาชนด้าน การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต (ตั้งจ่ายรายการใหม่)	800,000.00	-	-	ต.ค.-65-ก.ย.66			✓	288,200.00	511,800.00	✓	
179	โครงการปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพ ชีวิตและส่งเสริมผู้สูงอายุเทศบาลนครสุ ราษฎร์ธานี (ศพอส.) (ตั้งจ่ายรายการใหม่)	3,363,000.00	-	-	มิ.ย.-ก.ย.66		ขั้นตอนพัสดุ กันเงินต่อสภาท้องถิ่น กรณีได้ก่อหนี้ผูกพัน การประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2566 วันที่ 20 ก.ย. 2566		-	3,363,000.00	✓	
รวม		28,956,530.00	747,140.00	240,000.00					18,866,337.97	9,583,052.03		
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา การกีฬา ศาสนา ประเพณีและวัฒนธรรม												
180	โครงการจัดงาน/กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ/ เทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระ พระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี และพระบรมวงศานุวงศ์	300,000.00	-	550,000.00	ต.ค.65-ก.ย.66			✓	769,527.00	80,473.00	✓	
181	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา (งานระดับก่อนวัยเรียน-ประถม)	29,084,400.00	534,696.00	3,925,400.00	ต.ค.65-ก.ย.66			✓	30,805,435.96	1,669,668.04	✓	
182	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา (งานระดับมัธยม)	51,210,600.00	500,000.00	869,696.00	ต.ค.65-ก.ย.66			✓	44,012,195.79	7,568,100.21	✓	
183	โครงการอุดหนุนค่าอาหารกลางวันสำหรับ โรงเรียนบ้านบางใหญ่	898,800.00	-	117,400.00	ต.ค.65-ก.ย.66			✓	898,104.00	118,096.00	✓	
184	โครงการอุดหนุนค่าอาหารกลางวันสำหรับ โรงเรียนบ้านโพหวาย	1,344,000.00	26,000.00	-	ต.ค.65-ก.ย.66			✓	1,317,650.00	350.00	✓	
185	โครงการอุดหนุนค่าอาหารกลางวันสำหรับ โรงเรียนบ้านสันติสุข	588,000.00	28,650.00	-	ต.ค.65-ก.ย.66			✓	558,850.00	500.00	✓	

รายงานผลการดำเนินงานโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
ณ ไตรมาสที่ 4/2566 (ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2566)

แบบรายงาน 2.1

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	โอนลด (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	ระยะเวลาที่ กำหนดไว้ตาม แผนดำเนินงาน	สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การดำเนินการตาม แผนการดำเนินงาน	
						ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			เป็นไป ตามที่กำหนด	ไม่เป็นไป ตามที่กำหนด
186	โครงการอุดหนุนค่าอาหารกลางวันสำหรับ โรงเรียนบ้านสุขน	462,000.00	-	45,250.00	ต.ค.65-ก.ย.66			✓	461,458.00	45,792.00	✓	
187	โครงการอุดหนุนค่าอาหารกลางวันสำหรับ โรงเรียนวัดกลางใหม่	966,000.00	113,000.00	-	ต.ค.65-ก.ย.66			✓	852,300.00	700.00	✓	
188	โครงการอุดหนุนค่าอาหารกลางวันสำหรับ โรงเรียนวัดท่าทอง	1,050,000.00	-	59,700.00	ต.ค.65-ก.ย.66			✓	1,046,780.00	62,920.00	✓	
189	โครงการอุดหนุนค่าอาหารกลางวันสำหรับ โรงเรียนวัดโพธิ์นิมิต	1,461,600.00	147,000.00	-	ต.ค.65-ก.ย.66			✓	1,313,900.00	700.00	✓	
190	โครงการอุดหนุนค่าอาหารกลางวันสำหรับ โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี	7,350,000.00	-	182,538.00	ต.ค.65-ก.ย.66			✓	7,303,254.00	229,284.00	✓	
191	โครงการประชาสัมพันธ์การจัดการศึกษาของ เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี	800,000.00	541,150.00	-	ต.ค.65-ก.ย.66			✓	258,534.00	316.00	✓	
192	โครงการประเมินคุณภาพการจัดการศึกษา	300,000.00	246,000.00	-	ต.ค.65-ก.ย.66			✓	53,425.00	575.00	✓	
193	โครงการประเมินผลนักเรียนในระดับ การศึกษาขั้นพื้นฐาน	900,000.00	10,400.00	-	ต.ค.65-ก.ย.66			✓	872,652.00	16,948.00	✓	
194	โครงการสอบแข่งขันและพัฒนาคนเก่งระดับ การศึกษาขั้นพื้นฐาน	300,000.00	300,000.00	-	ต.ค.65-ก.ย.66		ยกเลิกโครงการ เนื่องจากกรมส่งเสริมการ ปกครองท้องถิ่น ไม่ได้จัดการแข่งขัน		-	-		
195	โครงการส่งเสริมธุรการชั้นเรียนหลักสูตร แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน	400,000.00	178,000.00	-	ธ.ค.65-พ.ค.66			✓	221,775.00	225.00	✓	
196	โครงการอบรมการผลิตและใช้สื่อการเรียน การสอน	80,000.00	-	-	ต.ค.-ธ.ค.65			✓	68,160.00	11,840.00	✓	
197	โครงการประชุมคณะกรรมการประสาน งานวิชาการ การจัดการศึกษาท้องถิ่นระดับ เทศบาล	100,000.00	20,000.00	-	มี.ค.-ก.ย.66			✓	51,475.00	28,525.00	✓	

รายงานผลการดำเนินงานโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
ณ ไตรมาสที่ 4/2566 (ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2566)

แบบรายงาน 2.1

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	โอนลด (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	ระยะเวลาที่ กำหนดไว้ตาม แผนดำเนินงาน	สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การดำเนินการตาม แผนการดำเนินงาน	
						ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			เป็นไป ตามที่กำหนด	ไม่เป็นไป ตามที่กำหนด
198	โครงการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา	100,000.00	48,000.00	-	ม.ค.-ก.ย.66			✓	-	52,000.00	✓	
199	โครงการการศึกษาเพื่อต่อต้าน ยาเสพติดในเด็กนักเรียน (D.A.R.E.)	100,000.00	100,000.00		พ.ค.-ก.ย.66		ยกเลิกโครงการ วัตถุประสงค์โครงการ ซ้ำซ้อนกับโครงการอบรม ผู้นำนักเรียน		-	-		
200	โครงการเข้าร่วมงานชุมนุมของลูกเสือท้องถิ่น ไทย	80,000.00	-	-	ก.ค.-ก.ย.66	✓			-	80,000.00		✓
201	โครงการอบรมผู้นำนักเรียน	50,000.00	-	-	ม.ค.-66			✓	49,055.00	945.00	✓	
202	โครงการสำรวจประสานโรงเรียน (1 ดำรวจ 1 โรงเรียน)	30,000.00	30,000.00	-	ม.ค.-มี.ค.66		ยกเลิกโครงการ วัตถุประสงค์โครงการ ซ้ำซ้อนกับโครงการอบรม ผู้นำนักเรียน		-	-		
203	โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชน	80,000.00	-	-	ก.ค.-ส.ค.66			✓	68,960.00	11,040.00	✓	
204	โครงการสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติด เด็กและเยาวชนนอกสถานศึกษา	50,000.00	49,700.00	-	มี.ค.66		ยกเลิกโครงการ กำหนดวัตถุประสงค์และ กลุ่มเป้าหมายไม่เป็นไป ตามอำนาจหน้าที่		-	300.00		
205	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับ ทุนการศึกษา สำหรับนักศึกษาและ การให้ความช่วยเหลือนักเรียน	700,000.00	-	-	ม.ค.-ส.ค.66			✓	589,462.00	110,538.00	✓	
206	โครงการส่งเสริมและพัฒนาหอสมุด เฉลิมพระเกียรติฯ	250,000.00	-	-	ต.ค.65-ก.ย.66			✓	250,000.00	-	✓	
207	โครงการห้องสมุดเคลื่อนที่	100,000.00	-	-	ต.ค.65-ก.ย.66			✓	64,504.00	35,496.00	✓	
208	โครงการจัดกิจกรรมฉลองวันเด็กแห่งชาติ	350,000.00	-	200,000.00	ต.ค.65-ม.ค.66			✓	486,768.00	63,232.00	✓	
209	โครงการจัดอบรมเด็กและเยาวชน ภาคฤดูร้อน	500,000.00	-	-	ก.พ.-พ.ค.66			✓	434,791.00	65,209.00	✓	

รายงานผลการดำเนินงานโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
ณ ไตรมาสที่ 4/2566 (ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2566)

แบบรายงาน 2.1

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	โอนลด (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	ระยะเวลาที่ กำหนดไว้ตาม แผนดำเนินงาน	สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การดำเนินการตาม แผนการดำเนินงาน	
						ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			เป็นไป ตามที่กำหนด	ไม่เป็นไป ตามที่กำหนด
210	โครงการส่งเสริมเข้าร่วมแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย ระดับภาคและระดับประเทศ	5,000,000.00	4,981,800.00	-	ต.ค.65-ก.ย.66		ยกเลิกโครงการ กรมส่งเสริมการปกครอง ท้องถิ่นไม่ได้ดำเนินการ จัดการแข่งขันดังกล่าว		-	18,200.00		
211	โครงการจัดแข่งขันกีฬานักเรียนอนุบาล	200,000.00	-	-	มิ.ย.-ส.ค.66			✓	189,292.00	10,708.00	✓	
212	โครงการจัดการแข่งขันกีฬานักเรียนเยาวชนและประชาชน	900,000.00	-	-	มี.ค.-พ.ค.66			✓	743,292.00	156,708.00	✓	
213	โครงการส่งเสริมกีฬาและกีฬานันทนาการของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี เข้าร่วมแข่งขันกับหน่วยงานอื่นๆ	200,000.00	-	-	ต.ค.65-ก.ย.66			✓	148,940.00	51,060.00	✓	
214	โครงการส่งเสริมโรงเรียนกีฬาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี เข้าร่วมแข่งขันรายการต่าง ๆ	500,000.00	-	500,000.00	ต.ค.65-ก.ย.66			✓	999,821.80	178.20	✓	
215	โครงการส่งเสริมและส่งเสริมเข้าร่วมการแข่งขันเรือพาย	50,000.00	-	-	ต.ค.65-ก.ย.66	✓			-	50,000.00		✓
216	โครงการจัดงานประเพณีวันขึ้นปีใหม่	300,000.00	60,000.00	-	ธ.ค.65-ม.ค.66			✓	238,800.00	1,200.00	✓	
217	โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์	650,000.00	-	-	เม.ย.66			✓	648,578.00	1,422.00	✓	
218	โครงการจัดงานประเพณีชักพระ - ทอดผ้าป่าและแข่งเรือยาว	7,000,000.00	-	-	ต.ค.65			✓	5,078,558.68	1,921,441.32	✓	
219	โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง	1,500,000.00	10,000.00	50,000.00	ต.ค.-ธ.ค.65			✓	1,538,680.00	1,320.00	✓	
220	โครงการอุดหนุนมัสยิดอิกอมะตุลอิสลาม (บ้านปากน้ำ)	400,000.00	39,960.00	-	ก.ค.-ส.ค.66			✓	355,000.00	5,040.00	✓	
221	โครงการส่งเสริมกิจกรรมทางศาสนาและภูมิปัญญาท้องถิ่น	10,000.00	4,000.00	-	ม.ค.-ก.ค.66	✓			-	6,000.00		✓

รายงานผลการดำเนินงานโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
ณ ไตรมาสที่ 4/2566 (ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2566)

แบบรายงาน 2.1

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	โอนลด (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	ระยะเวลาที่ กำหนดไว้ตาม แผนดำเนินงาน	สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การดำเนินการตาม แผนการดำเนินงาน	
						ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			เป็นไป ตามที่กำหนด	ไม่เป็นไป ตามที่กำหนด
222	โครงการก่อสร้างอ่างล้างอาหารนักเรียน	365,000.00	-	-	ต.ค.65-พ.ค.66		ขั้นตอนพัสดุ กันเงินต่อสภาท้องถิ่น กรณีได้ก่อนนี้ผูกพัน การประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2566 วันที่ 20 ก.ย. 2566		-	365,000.00		✓
223	โครงการต่อเติมหลังคาคลุมระหว่าง อาคารประชาชนภูมิ ๒,๓ อาคารหลังคาคลุมลานอเนกประสงค์	1,157,000.00	-	-	ต.ค.65-ก.ย.66		ขั้นตอนพัสดุ กันเงินต่อสภาท้องถิ่น กรณีได้ก่อนนี้ผูกพัน การประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2566 วันที่ 20 ก.ย. 2566		-	1,157,000.00		✓
224	โครงการก่อสร้างสนามเด็กเล่นโรงเรียน เทศบาล 1 (แดงอ่อนเดิมวิทยา) (ตั้งจ่ายรายการใหม่)	1,700,000.00	-	-	ธ.ค.65-ก.ย.66		ขั้นตอนพัสดุ กันเงินต่อสภาท้องถิ่น กรณีได้ก่อนนี้ผูกพัน การประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2566 วันที่ 20 ก.ย. 2566		-	1,700,000.00		✓
225	โครงการทาสีภายนอกอาคารเรียน 1,2,3 (ตั้งจ่ายรายการใหม่)	527,000.00	-	-	ธ.ค.65-ก.ย.66		ขั้นตอนพัสดุ กันเงิน กรณีได้ก่อนนี้ ผูกพันไว้แล้วก่อนสิ้น ปีงบประมาณ		-	527,000.00		✓
226	โครงการปรับปรุงกระเบื้องพื้นอาคาร อเนกประสงค์โรงเรียนเทศบาล 3 (ตลาดล่าง) (ตั้งจ่ายรายการใหม่)	422,000.00	-	-	ธ.ค.65-ก.ย.66			✓	422,000.00	-	✓	

รายงานผลการดำเนินงานโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
ณ ไตรมาสที่ 4/2566 (ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2566)

แบบรายงาน 2.1

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	โอนลด (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	ระยะเวลาที่ กำหนดไว้ตาม แผนดำเนินงาน	สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การดำเนินการตาม แผนการดำเนินงาน	
						ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			เป็นไป ตามที่กำหนด	ไม่เป็นไป ตามที่กำหนด
227	โครงการปรับปรุงปูพื้นกระเบื้องและติดตั้ง รั้วสแตนเลสหน้าอาคารประชาชนภูมิ 3 (ตั้งจ่ายรายการใหม่)	111,000.00	-	-	ธ.ค.65-ก.ย.66			✓	111,000.00	-	✓	
228	โครงการเสริมสร้างรูปแบบหรือ สื่อการสอนสำหรับนักเรียนที่เรียนรู้ซ้ำ (ตั้งจ่ายรายการใหม่)	300,000.00	70,000.00	-	ก.พ.-พ.ค.66			✓	229,221.00	779.00	✓	
229	โครงการจัดการแข่งขันกรีฑาโรงเรียนในสังกัด เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี (ตั้งจ่ายรายการใหม่)	300,000.00	300,000.00	-	มิ.ย.-ส.ค.66		ยกเลิกโครงการ เนื่องจากสนามกีฬากลาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี ซึ่งใช้เป็นสถานที่จัดการ แข่งขันดังกล่าว ปิดปรับปรุง ต่อเติม ซ่อมแซม		-	-		
230	โครงการพัฒนาศักยภาพพนักงานครูและ บุคลากรทางการศึกษา (ตั้งจ่ายรายการใหม่)	400,000.00	-	-	พ.ค.-ก.ย.66			✓	334,320.00	65,680.00	✓	
231	โครงการพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนและผู้เรียน ตามหลักสูตรพื้นฐานเน้นการจัดการเรียนการ สอนในรูปแบบ Coding & Digital Business (ตั้งจ่ายรายการใหม่)	700,000.00	-	-	มิ.ย.-ก.ย.66			✓	303,545.00	396,455.00	✓	
232	โครงการจัดทำระบบสารสนเทศเด็กปฐมวัย สำนักงานการศึกษา เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี (ตั้งจ่ายรายการใหม่)	100,000.00	-	-	มิ.ย.-ก.ย.66		ขั้นตอนพัสดุ กันเงิน กรณีได้ก่อนนี้ ผูกพันไว้แล้วก่อนสิ้น ปีงบประมาณ		-	100,000.00		✓

รายงานผลการดำเนินงานโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
ณ ไตรมาสที่ 4/2566 (ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2566)

แบบรายงาน 2.1

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	โอนลด (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	ระยะเวลาที่กำหนดไว้ตาม แผนดำเนินงาน	สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การดำเนินการตาม แผนการดำเนินงาน	
						ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			เป็นไป ตามที่กำหนด	ไม่เป็นไป ตามที่กำหนด
233	โครงการปรับปรุงอาคารสนามแบดมินตัน (ตั้งจ่ายรายการใหม่)	4,000,000.00	-	-	มิ.ย.-ก.ย.66		คณะกรรมการกำหนด ราคากลาง กันเงินต่อสภาท้องถิ่น กรณีได้ก่อนนี้ผูกพัน การประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2566 วันที่ 20 ก.ย. 2566		-	4,000,000.00		✓
234	โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาหลักสูตร Coding (ตั้งจ่ายรายการใหม่)	300,000.00	-	-	ส.ค.-ก.ย.66			✓	161,585.00	138,415.00	✓	
รวม		127,077,400.00	8,338,356.00	6,499,984.00					104,311,649.23	20,927,378.77		
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี												
235	โครงการจัดกิจกรรมการให้บริการสาธารณะ เชิงบูรณาการเนื่องในวันเทศบาล	80,000.00	24,550.00	-	เม.ย.-65			✓	55,450.00	-	✓	
236	โครงการประกวดองค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี	40,000.00	40,000.00	-	ม.ค.-เม.ย.66			✓	-	-	✓	
237	โครงการเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี พบชุมชน	400,000.00	-	-	ต.ค.65-ก.ย.66			✓	293,485.00	106,515.00	✓	
238	โครงการจัดกิจกรรมการให้บริการสาธารณะ เชิงบูรณาการ เนื่องในวันท้องถิ่นไทย "18 มีนา วันท้องถิ่นไทย"	10,000.00	-	-	มี.ค.-66			✓	10,000.00	-	✓	
239	โครงการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น และ เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง	350,000.00	50,000.00	-	พ.ย.65-ก.ย.66			✓	246,785.00	53,215.00	✓	

รายงานผลการดำเนินงานโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
ณ ไตรมาสที่ 4/2566 (ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2566)

แบบรายงาน 2.1

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	โอนลด (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	ระยะเวลาที่ กำหนดไว้ตาม แผนดำเนินงาน	สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การดำเนินการตาม แผนการดำเนินงาน	
						ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			เป็นไป ตามที่กำหนด	ไม่เป็นไป ตามที่กำหนด
240	โครงการจัดทำแผนการดำเนินงานประจำปี และเพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง/แก้ไข	70,000.00	-	-	ต.ค.65-ก.ย.66			✓	41,540.00	28,460.00	✓	
241	โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ที่เกี่ยวข้องกับแผนพัฒนาท้องถิ่น	137,000.00	10,700.00	-	ก.พ.-มี.ค.66			✓	81,200.00	45,100.00	✓	
242	โครงการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี	30,000.00	3,400.00	-	ต.ค.65-ก.ย.66			✓	23,675.00	2,925.00	✓	
243	โครงการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี (จ้างที่ปรึกษา)	250,000.00	-	-	ต.ค.65-ก.ย.66		ผู้รับจ้างดำเนินการตาม สัญญา กันเงิน กรณีได้ก่อนนี้ ผูกพันไว้แล้วก่อนสิ้น ปีงบประมาณ		-	250,000.00	✓	
244	โครงการผลิตและเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ ทาง YouTube	35,000.00	-	-	ต.ค.65-ก.ย.66			✓	-	35,000.00	✓	
245	โครงการประชาสัมพันธ์การชำระภาษีท้องถิ่น	200,000.00	162,400.00	-	พ.ย.65-ก.ย.66			✓	26,000.00	11,600.00	✓	
246	โครงการปรับปรุงและสำรวจข้อมูลการจัดทำ แผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	300,000.00	-	-	ต.ค.65-ก.ย.66	✓			-	300,000.00		✓
247	โครงการเชื่อมต่อโปรแกรมแผนที่ภาษี กับสำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลนคร สุราษฎร์ธานี	100,000.00	-	-	ต.ค.65-ก.ย.66	✓			-	100,000.00		✓
248	โครงการให้ความรู้ด้านกฎหมาย ที่เกี่ยวข้องในชีวิตประจำวัน	80,000.00	-	-	ส.ค.-66			✓	43,950.00	36,050.00	✓	
249	โครงการยกระดับการบริหารจัดการ บ้านเมืองที่ดี เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี (ตั้งจ่ายรายการใหม่)	179,300.00	-	-	มี.ค.-ก.ย.66			✓	132,190.00	47,110.00	✓	

รายงานผลการดำเนินงานโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
ณ ไตรมาสที่ 4/2566 (ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2566)

แบบรายงาน 2.1

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	โอนลด (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	ระยะเวลาที่กำหนดไว้ตาม แผนดำเนินงาน	สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การดำเนินการตาม แผนการดำเนินงาน	
						ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			เป็นไป ตามที่กำหนด	ไม่เป็นไป ตามที่กำหนด
250	โครงการเปิดอาคารสำนักงานเทศบาลนคร สุราษฎร์ธานี (9 ชั้น) (ตั้งจ่ายรายการใหม่)	500,000.00	-	-	ก.พ.-66			✓	490,399.00	9,601.00	✓	
251	โครงการปรับปรุงเคาน์เตอร์บริการประชาชน สำนักงานเทศบาลนคร สุราษฎร์ธานี (ตั้งจ่ายรายการใหม่)	500,000.00	-	-	ต.ค.-ธ.ค.66		กันเงินต่อสภาท้องถิ่น กรณีได้ก่อนนี้ผูกพัน การประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2566 วันที่ 20 ก.ย. 2566		-	500,000.00		✓
252	โครงการก่อสร้างป้ายสำหรับติดตั้งจอ LED บริเวณสี่แยกวัดโพธิ์ (ตั้งจ่ายรายการใหม่)	850,000.00	-	-	ต.ค.66-มี.ค.67		กันเงินต่อสภาท้องถิ่น กรณีได้ก่อนนี้ผูกพัน การประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2566 วันที่ 20 ก.ย. 2566		-	850,000.00		✓
รวม		4,111,300.00	291,050.00	-					1,444,674.00	2,375,576.00		
รวมทุกยุทธศาสตร์		353,382,259.00	118,515,918.00	7,259,984.00					130,046,340.45	112,079,984.55		

รายงานผลการดำเนินงานโครงการที่จ่ายจากเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
ณ ไตรมาสที่ 4/2566 (ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2566)

แบบรายงาน 2.2

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาที่ กำหนดไว้ตาม แผนดำเนินงาน	สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การดำเนินการตาม แผนการดำเนินงาน	
				ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			เป็นไป ตามที่กำหนด	ไม่เป็นไป ตามที่กำหนด
	ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน									
1	โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนวิภาวดี STA 0+000-1+409	5,483,000.00	ธ.ค.65-ก.พ.66			✓	3,744,756.00	1,738,244.00	✓	
2	โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนดอนนก STA 0+175-0+725	2,833,000.00	ธ.ค.65-ก.พ.66			✓	1,953,428.00	879,572.00	✓	
3	โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนศรีตาปี STA 0+000-0+222	1,709,000.00	ธ.ค.65-ก.พ.66			✓	1,167,237.00	541,763.00	✓	
4	โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนปากน้ำ STA 4+030-4+372	3,508,000.00	ธ.ค.65-ก.พ.66			✓	2,572,053.00	935,947.00		✓
5	โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนท่าทอง 3	2,004,000.00	ธ.ค.65-ก.พ.66			✓	1,418,440.00	585,560.00		✓
6	โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนท่าทอง 5	1,834,000.00	ธ.ค.65-ก.พ.66			✓	1,298,393.00	535,607.00		✓
7	โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนเลียงเมือง 18	678,000.00	ธ.ค.65-ก.พ.66			✓	480,114.00	197,886.00		✓
8	โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนตลาดล่าง STA 0+670-2+315	8,568,000.00	ม.ค.-มี.ค.66		ขั้นตอนพัสดุ e-biding		-	8,568,000.00		✓
9	โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนศรีวิชัย ซอย 59	1,994,000.00	ม.ค.-มี.ค.66		ขั้นตอนพัสดุ วิจารณ์ร่าง TOR		-	1,994,000.00		✓
10	โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนเปรมฤดี	1,011,000.00	ม.ค.-มี.ค.66		ขั้นตอนพัสดุ วิจารณ์ร่าง TOR		-	1,011,000.00		✓

รายงานผลการดำเนินงานโครงการที่จ่ายจากเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
ณ ไตรมาสที่ 4/2566 (ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2566)

แบบรายงาน 2.2

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาที่ กำหนดไว้ตาม แผนดำเนินงาน	สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การดำเนินการตาม แผนการดำเนินงาน	
				ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			เป็นไป ตามที่กำหนด	ไม่เป็นไป ตามที่กำหนด
11	โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนชนเกษม 49 STA 0+460-1+000	1,865,000.00	ม.ค.-มี.ค.66		ขั้นตอนพัสดุ วิจารณ์ร่าง TOR		-	1,865,000.00		✓
12	โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนบางใหญ่ 16	410,000.00	ม.ค.-มี.ค.66		ขั้นตอนพัสดุ วิจารณ์ร่าง TOR		-	410,000.00		✓
13	โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนบางใหญ่ 21	308,000.00	ม.ค.-มี.ค.66		ขั้นตอนพัสดุ วิจารณ์ร่าง TOR		-	308,000.00		✓
14	โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนบางใหญ่ 23	218,000.00	ม.ค.-มี.ค.66		ขั้นตอนพัสดุ วิจารณ์ร่าง TOR		-	218,000.00		✓
15	โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนเปรมจิตประชา	1,372,000.00	ก.พ.-เม.ย.66		ขั้นตอนพัสดุ วิจารณ์ร่าง TOR		-	1,372,000.00		✓
16	โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนอำเภอ STA 0+000-0+875	4,224,000.00	ก.พ.-เม.ย.66			✓	2,862,038	1,361,962.00		✓
17	โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนวัดโพธิ์ 2	968,000.00	ก.พ.-เม.ย.66			✓	685,128	282,872.00		✓
18	โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนลูกเสือ 13	154,000.00	ก.พ.-เม.ย.66			✓	109,120	44,880.00		✓
19	โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนชนเกษม 32/1	507,000.00	ก.พ.-เม.ย.66			✓	371,940	135,060.00		✓
20	โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนชนเกษม 48/5	388,000.00	ก.พ.-เม.ย.66			✓	284,914	103,086.00		✓
21	โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนยางงาม 13	2,373,000.00	ก.พ.-เม.ย.66			✓	843,488	1,529,512.00		✓

รายงานผลการดำเนินงานโครงการที่จ่ายจากเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
ณ ไตรมาสที่ 4/2566 (ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2566)

แบบรายงาน 2.2

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาที่ กำหนดไว้ตาม แผนดำเนินงาน	สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การดำเนินการตาม แผนการดำเนินงาน	
				ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			เป็นไป ตามที่กำหนด	ไม่เป็นไป ตามที่กำหนด
22	โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนสวนถั่ว 2	219,000.00	ก.พ.-เม.ย.66			✓	157,828	61,172.00		✓
23	โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนปากน้ำ 3/1	228,000.00	ก.พ.-เม.ย.66			✓	167,776	60,224.00		✓
24	โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนบุญช่วย 4	465,000.00	ก.พ.-เม.ย.66			✓	341,254	123,746.00		✓
25	โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนท่าโรงช้าง STA 0+000-1+398	7,662,000.00	ส.ค.-ธ.ค.66		ขั้นตอนพัสดุ		-	7,662,000.00	✓	
26	โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบแอสฟัลต์คอนกรีต (Over-lay) ถนนโกลกรัฐ (ชุมชนหนองบัว,ชุมชนศรีธานี-ยาง งาม,ชุมชนค่าย อส.)	19,800,000.00	มิ.ย.-ก.ย.66		ขั้นตอนพัสดุ		-	19,800,000.00		✓
27	โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบแอสฟัลต์คอนกรีต (Over-lay) ถนนพ้อขุนทะเล จากแยกตาปานช่วงที่ 1 (Sta 0+000 ถึง Sta 1+100) (ชุมชนบึงขุนทะเล)	6,200,000.00	มิ.ย.-ก.ย.66		ขั้นตอนพัสดุ		-	6,200,000.00		✓
28	โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบแอสฟัลต์คอนกรีต ถนนตีเหล็กและซอยแยก (ตลาดศาลเจ้า) (ชุมชนวัดไทร)	872,000.00	มิ.ย.-ก.ย.66		ขั้นตอนพัสดุ		-	872,000.00		✓
รวม		77,855,000.00					18,457,907.00	59,397,093.00		

สรุปผลการดำเนินโครงการที่จ่ายจากเงินสะสม/เงินทุนสำรองเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ที่ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ) ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ณ ไตรมาสที่ 4/2566 (ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2566)													
จำนวนโครงการที่จ่ายจากเงินสะสม/เงินทุนสำรองเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ที่ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ มีทั้งหมด 15 โครงการ งบประมาณ 253,568,000 บาท (สองร้อยห้าสิบสามล้านห้าแสนหกหมื่นแปดพันบาทถ้วน) มีรายละเอียดผลการดำเนินงาน ดังนี้													
โครงการที่จ่ายจากเงินสะสม/เงินทุนสำรองเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำนวน 15 โครงการ งบประมาณ 253,568,000 บาท													
ยุทธศาสตร์	รวมทั้งสิ้น			ดำเนินการเสร็จสิ้น			ระหว่างดำเนินการ			ยังไม่ดำเนินการ		โครงการที่ยกเลิก	
	โครง	งบประมาณ	งบประมาณ	โครง	งบประมาณ	งบประมาณ	โครง	งบประมาณ	งบประมาณ	โครง	งบประมาณ	โครง	งบประมาณ
	การ	ที่ตั้งไว้	ที่เบิกจ่าย	การ	ที่ตั้งไว้	ที่เบิกจ่าย	การ	ที่ตั้งไว้	ที่เบิกจ่าย	การ	ที่ตั้งไว้	การ	ที่ตั้งไว้
1.ด้านโครงสร้างพื้นฐาน	14	245,568,000.00	-	-	-	-	9	200,368,000.00	-	-	-	5	45,200,000.00
6. ด้านการบริหารจัดการที่ดี	1	8,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	8,000,000.00
รวม	15	253,568,000.00	-	-	-	-	9	200,368,000.00	-	-	-	6	53,200,000.00
คิดเป็นร้อยละ	100.00			-			60.00			0.00		40.00	

รายงานผลการดำเนินงานโครงการที่จ่ายจากเงินสะสม/เงินทุนสำรองเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
(ที่ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ) ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
ณ ไตรมาสที่ 4/2566 (ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2566)

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาที่กำหนดไว้ตามแผนดำเนินงาน	สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	การดำเนินการตามแผนการดำเนินงาน	
				ยังไม่ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการเสร็จสิ้น			เป็นไปตามที่กำหนด	ไม่เป็นไปตามที่กำหนด
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน										
1	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจรถนนโศลกฤษฎ์ 18/2	1,960,000.00	มิ.ย.-ก.ย.65		กำลังก่อสร้าง		-	1,960,000.00		✓
2	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ ถนนสุขน 1 แยกขวา 1	6,500,000.00	ก.ค.-ธ.ค.65		ยกเลิกโครงการ ไม่สามารถก่อนหน้าผู้กผัน ได้ทันภายในเวลา เป็นอันพับไปตาม ระเบียบ		-	6,500,000.00		
3	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจรถนนโรงเรียนกีฬาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี	9,000,000.00	ก.ค.-ธ.ค.65		ยกเลิกโครงการ เจ้าของที่ดินไม่ยินยอม ที่จะอุทิศให้เป็น ทางสาธารณประโยชน์		-	9,000,000.00		
4	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจรถนนกาญจนาภิเษก 30 ตอน 3	6,200,000.00	ก.ค.-ธ.ค.65		กำลังก่อสร้าง		-	6,200,000.00		✓
5	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ ถนนก้านหินขึ้น	3,600,000.00	มิ.ย.-ก.ย.65		ยกเลิกโครงการ ไม่สามารถก่อนหน้าผู้กผัน ได้ทันภายในเวลา เป็นอันพับไปตาม ระเบียบ		-	3,600,000.00		

รายงานผลการดำเนินงานโครงการที่จ่ายจากเงินสะสม/เงินทุนสำรองเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
(ที่ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ) ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
ณ ไตรมาสที่ 4/2566 (ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2566)

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาที่กำหนดไว้ตามแผนดำเนินงาน	สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	การดำเนินการตามแผนการดำเนินงาน	
				ยังไม่ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการเสร็จสิ้น			เป็นไปตามที่กำหนด	ไม่เป็นไปตามที่กำหนด
6	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจรถนนวัดโพธิ์-บางใหญ่ 28/1	1,100,000.00	มิ.ย.-ส.ค.65		ยกเลิกโครงการปริมาณงานคลาดเคลื่อน ไม่สอดคล้องกับสถานที่ก่อสร้างจริง ทำให้ไม่สามารถก่อสร้างได้		-	1,100,000.00		
7	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจรถนนชนเกษม 29 ตอน 2	3,500,000.00	มิ.ย.-ก.ย.65		ขั้นตอนพัสดุ		-	3,500,000.00		✓
8	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจรถนนอำเภอ 15/1	2,600,000.00	ก.ค.-ต.ค.65		ก่อสร้างแล้วเสร็จ รอการเบิกจ่าย		-	2,600,000.00		✓
9	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจรถนนศรีเกษม 20 แยกขวา 3	1,800,000.00	ก.ค.-ธ.ค.65		ขั้นตอนพัสดุ		-	1,800,000.00		✓
10	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจรถนนศรีวิชัย 21/20	950,000.00	มิ.ย.-ส.ค.65		ขั้นตอนพัสดุ		-	950,000.00		✓
11	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจรถนนพ้อขุนทะเล 10/7 แยกซ้าย 2	900,000.00	มิ.ย.-ส.ค.65		ขั้นตอนพัสดุ		-	900,000.00		✓
12	โครงการปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้าเป็นเคเบิลใต้ดินบริเวณถนนชนเกษม	67,468,000.00	มิ.ย.-ก.ย.65		การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค รอเซ็นสัญญากับผู้รับจ้าง		-	67,468,000.00		✓
13	โครงการปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้าเป็นเคเบิลใต้ดินบริเวณถนนตลาดใหม่	114,990,000.00	มิ.ย.-ก.ย.65		การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค รอเซ็นสัญญากับผู้รับจ้าง		-	114,990,000.00		✓

รายงานผลการดำเนินงานโครงการที่จ่ายจากเงินสะสม/เงินทุนสำรองเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
(ที่ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ) ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
ณ ไตรมาสที่ 4/2566 (ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2566)

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาที่กำหนดไว้ตามแผนดำเนินงาน	สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	การดำเนินการตามแผนการดำเนินงาน	
				ยังไม่ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการเสร็จสิ้น			เป็นไปตามที่กำหนด	ไม่เป็นไปตามที่กำหนด
14	โครงการปรับปรุงสะพานข้ามแม่น้ำตาปี (ช่วงที่ 1)	25,000,000.00	ธ.ค.65-ก.ค.67		ยกเลิกโครงการ นำงบประมาณไปใช้ สำหรับโครงการอื่นเพื่อ แก้ไขปัญหาความ เดือดร้อนของประชาชน		-	25,000,000.00		
รวม		245,568,000.00					-	245,568,000.00		
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี										
15	โครงการก่อสร้างอาคารสถานธนาอนุบาลเทศบาลนคร สุราษฎร์ธานี แห่งที่ 2	8,000,000.00	ม.ค.-ก.ย.66		ยกเลิกโครงการ ตามมติสภาเทศบาลฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2566 เมื่อวันที่ 29 พ.ค. 2566		-	8,000,000.00		
รวม		8,000,000.00					-	8,000,000.00		
รวมทุกยุทธศาสตร์		253,568,000.00					-	253,568,000.00		

สรุปผลการดำเนินโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2565

ที่ขออนุมัติกันเงินไว้ (ที่ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ)

ณ ไตรมาสที่ 4/2566 (ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2566)

จำนวนโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2565 ที่ขออนุมัติกันเงินไว้ และยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ มีทั้งหมด **51 โครงการ** งบประมาณ **98,736,500 บาท** (เก้าสิบล้านเจ็ดแสนสามหมื่นหกพันห้าร้อยบาทถ้วน) มีรายละเอียดผลการดำเนินงาน ดังนี้

1. โครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ที่ขออนุมัติกันเงินไว้ (ที่ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ) จำนวน **3 โครงการ** งบประมาณที่กันเงินไว้ **25,991,500 บาท**

ยุทธศาสตร์	รวมทั้งสิ้น			ดำเนินการเสร็จสิ้น			ระหว่างดำเนินการ			ยังไม่ดำเนินการ		โครงการที่ยกเลิก	
	โครงการ	งบประมาณที่กันเงินไว้	งบประมาณที่เบิกจ่าย	โครงการ	งบประมาณที่กันเงินไว้	งบประมาณที่เบิกจ่าย	โครงการ	งบประมาณที่กันเงินไว้	งบประมาณที่เบิกจ่าย	โครงการ	งบประมาณที่กันเงินไว้	โครงการ	งบประมาณที่กันเงินไว้
5. ด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น	2	991,500.00	800,000.00	1	855,000.00	800,000.00	-	-	-	-	-	1	136,500.00
6. ด้านการบริหารจัดการที่ดี	1	25,000,000.00	-	-	-	-	1	25,000,000.00	-	-	-	-	-
รวม	3	25,991,500.00	800,000.00	1	855,000.00	800,000.00	1	25,000,000.00	-	-	-	1	136,500.00
คิดเป็นร้อยละ		100.00			33.33			33.33			0.00		33.33

2. โครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ที่ขออนุมัติกันเงินไว้ จำนวน **48 โครงการ** งบประมาณที่กันเงินไว้ **72,745,000 บาท**

ยุทธศาสตร์	รวมทั้งสิ้น			ดำเนินการเสร็จสิ้น			ระหว่างดำเนินการ			ยังไม่ดำเนินการ		โครงการที่ยกเลิก	
	โครงการ	งบประมาณที่กันเงินไว้	งบประมาณที่เบิกจ่าย	โครงการ	งบประมาณที่กันเงินไว้	งบประมาณที่เบิกจ่าย	โครงการ	งบประมาณที่กันเงินไว้	งบประมาณที่เบิกจ่าย	โครงการ	งบประมาณที่กันเงินไว้	โครงการ	งบประมาณที่กันเงินไว้
1. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน	42	59,263,000.00	6,764,360.00	13	6,938,000.00	6,764,360.00	26	34,876,000.00	-	-	-	3	17,449,000.00
2. ด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว	2	7,200,000.00	3,722,200.00	2	7,200,000.00	3,722,200.00	-	-	-	-	-	-	-
4. ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต	1	500,000.00	300,000.00	1	500,000.00	300,000.00	-	-	-	-	-	-	-
5. ด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น	2	5,535,000.00	-	-	-	-	2	5,535,000.00	-	-	-	-	-
6. ด้านการบริหารจัดการที่ดี	1	247,000.00	247,000.00	1	247,000.00	247,000.00	-	-	-	-	-	-	-
รวม	48	72,745,000.00	11,033,560.00	17	14,885,000.00	11,033,560.00	28	40,411,000.00	-	-	-	3	17,449,000.00
คิดเป็นร้อยละ		100.00			35.42			58.33			0.00		6.25

รวม	51	98,736,500.00	11,833,560.00	18	15,740,000.00	11,833,560.00	29	65,411,000.00	-	-	-	4	17,585,500.00
คิดเป็นร้อยละ		100.00			35.29			56.86			0.00		7.84

รายงานผลการดำเนินงานโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
 ที่ขออนุมัติกันเงินไว้ (ที่ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ) ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
 ณ ไตรมาสที่ 4/2566 (ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2566)

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณ ตามเทศบัญญัติ (บาท)	งบประมาณ ที่กันเงิน (บาท)	สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)
				ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น		
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น								
1	โครงการติดตั้งหลังคากันสาดอาคารเรียน 2 (เวชพิสิฐ) โรงเรียนเทศบาล 1 (แดงอ่อนเผดิมวิทยา)	136,500.00	136,500.00		ยกเลิกโครงการ เนื่องจากไม่มีผู้รับจ้าง		-	136,500.00
2	โครงการปรับปรุงต่อเติม โรงประกอบอาหาร โรงเรียน เทศบาล ๑ (แดงอ่อนเผดิมวิทยา)	855,000.00	855,000.00			✓	800,000.00	55,000.00
รวม		991,500.00	991,500.00				800,000.00	191,500.00
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี								
3	โครงการก่อสร้างศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลนคร สุราษฎร์ธานี (สวนหลวง ร. 9)	25,000,000.00	25,000,000.00		อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง กันเงิน กรณีได้ก่อนนี้ผูกพัน ไว้แล้วก่อนสิ้นปีงบประมาณ		-	25,000,000.00
รวม		25,000,000.00	25,000,000.00				-	25,000,000.00
รวมทุกยุทธศาสตร์		25,991,500.00	25,991,500.00				800,000.00	25,191,500.00

รายงานผลการดำเนินงานโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ที่ขออนุมัติกันเงินไว้ (ที่ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ) ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

ณ ไตรมาสที่ 4/2566 (ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2566)

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณ ตามเทศบัญญัติ (บาท)	งบประมาณ ที่กันเงิน (บาท)	ระยะเวลาที่ กำหนดไว้ตาม แผนดำเนินงาน	สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การดำเนินการตาม แผนการดำเนินงาน	
					ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			เป็นไป ตามที่กำหนด	ไม่เป็นไป ตามที่กำหนด
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน											
1	โครงการก่อสร้างทางเชื่อมถนนชนเกษม 43,45,47	1,500,000.00	1,500,000.00	ต.ค.-ธ.ค.65		อยู่ระหว่างก่อสร้าง กันเงิน กรณีได้ก่อนนี้ ผูกพันไว้แล้วก่อนสิ้น ปีงบประมาณ		-	1,500,000.00		✓
2	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำถนนกาญจนาภิเษก (แยกถนนอำเภอถึงถนนเทพมิตร (ชุมชนศรีธานี-ยางงาม)	3,763,000.00	3,763,000.00	ต.ค.-ธ.ค.65		ก่อสร้างแล้วเสร็จ รอการ เบิกจ่าย กันเงิน กรณีได้ก่อนนี้ ผูกพันไว้แล้วก่อนสิ้น ปีงบประมาณ		-	3,763,000.00		✓
3	โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลติก คอนกรีต ถนนเสม็ดเรียง ซอย 1	349,000.00	349,000.00	ธ.ค.65-เม.ย.66		ยกเลิกโครงการ เนื่องจากข้อขัดข้องกับงาน ท่อระบายน้ำ		-	349,000.00		
4	โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลติก คอนกรีต ถนนเสม็ดเรียง ซอย 8	370,000.00	370,000.00	ธ.ค.65-เม.ย.66			✓	370,000.00	-		✓
5	โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลติก คอนกรีต ถนนเสม็ดเรียง ซอย 8 แยกขวา 1,2,3	542,000.00	542,000.00	ธ.ค.65-เม.ย.66			✓	542,000.00	-		✓
6	โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลติก คอนกรีต ถนนเสม็ดเรียง ซอย 10	218,000.00	218,000.00	ธ.ค.65-เม.ย.66			✓	218,000.00	-		✓
7	โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลติก คอนกรีต ถนนเสม็ดเรียง ซอย 11	143,000.00	143,000.00	พ.ย.65-มี.ค.66			✓	143,000.00	-		✓
8	โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลติก คอนกรีต ถนนเสม็ดเรียง ซอย 14	333,000.00	333,000.00	ธ.ค.65-เม.ย.66			✓	333,000.00	-		✓
9	โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลติก คอนกรีต ถนนเสม็ดเรียง ซอย 14 แยกขวา 1	51,000.00	51,000.00	ธ.ค.65-เม.ย.66			✓	51,000.00	-		✓
10	โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลติก คอนกรีต ถนนเสม็ดเรียง ซอย 16	222,000.00	222,000.00	ธ.ค.65-เม.ย.66			✓	222,000.00	-		✓

รายงานผลการดำเนินงานโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ที่ขออนุมัติกันเงินไว้ (ที่ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ) ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

ณ ไตรมาสที่ 4/2566 (ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2566)

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณ ตามเทศบัญญัติ (บาท)	งบประมาณ ที่กันเงิน (บาท)	ระยะเวลาที่ กำหนดไว้ตาม แผนดำเนินงาน	สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การดำเนินการตาม แผนการดำเนินงาน	
					ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			เป็นไป ตามที่กำหนด	ไม่เป็นไป ตามที่กำหนด
11	โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลติก คอนกรีต ถนนเสม็ดเรียง ซอย 18	99,000.00	99,000.00	ธ.ค.65-เม.ย.66			✓	99,000.00	-		✓
12	โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลติก คอนกรีต ถนนเสม็ดเรียง ซอย 22	365,000.00	365,000.00	ธ.ค.65-เม.ย.66			✓	365,000.00	-		✓
13	โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลติก คอนกรีต ถนนบ้านดอน	978,000.00	978,000.00	พ.ย.65-มี.ค.66			✓	978,000.00	-		✓
14	โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลติก คอนกรีต ถนนต้นโพธิ์	965,000.00	965,000.00	พ.ย.65-มี.ค.66			✓	965,000.00	-		✓
15	โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลติก คอนกรีต ถนนศรีตาปี 1 ซอยบ้านริมน้ำ	1,737,000.00	1,737,000.00	พ.ย.65-มี.ค.66			✓	1,563,360.00	173,640.00		✓
16	โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลติก คอนกรีต ถนนเสรีไท	915,000.00	915,000.00	ธ.ค.65-เม.ย.66			✓	915,000.00	-		✓
17	โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบ ค.ส.ล. ถนนดีเหล็ก และซอยแยก (ตลาดศาลเจ้า) (ชุมชนวัดไทร)	2,100,000.00	2,100,000.00	ต.ค.65-มี.ค.66		ยกเลิกโครงการ ตามมติสภาเทศบาลฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2566 เมื่อวันที่ 29 พ.ค. 2566		-	2,100,000.00		
18	โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบแอสฟัลติกคอนกรีต ถนน ศรีเกษม ซอย 20	746,000.00	746,000.00	ม.ค.-พ.ค.66		ทำสัญญาแล้ว ผู้รับจ้าง หจก.อนันมณี กันเงิน กรณีได้ก่อนนี้ ผูกพันไว้แล้วก่อนสิ้น ปีงบประมาณ		-	746,000.00		✓
19	โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบแอสฟัลติกคอนกรีต ถนน ชนเกษม ซอย 50/1	439,000.00	439,000.00	ม.ค.-พ.ค.66		ทำสัญญาแล้ว ผู้รับจ้าง หจก.อนันมณี กันเงิน กรณีได้ก่อนนี้ ผูกพันไว้แล้วก่อนสิ้น ปีงบประมาณ		-	439,000.00		✓

รายงานผลการดำเนินงานโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ที่ขออนุมัติกันเงินไว้ (ที่ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ) ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

ณ ไตรมาสที่ 4/2566 (ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2566)

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณ ตามเทศบัญญัติ (บาท)	งบประมาณ ที่กันเงิน (บาท)	ระยะเวลาที่ กำหนดไว้ตาม แผนดำเนินงาน	สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมา งเหลือ (บาท)	การดำเนินการตาม แผนการดำเนินงาน	
					ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			เป็นไป ตามที่กำหนด	ไม่เป็นไป ตามที่กำหนด
20	โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบแอสฟัลติกคอนกรีต ถนน ชนเกษม ซอย 31	433,000.00	433,000.00	ม.ค.-พ.ค.66		ทำสัญญาแล้ว ผู้รับจ้าง หจก.อาร์เคซี กันเงิน กรณีได้ก่อนนี้ ผูกพันไว้แล้วก่อนสิ้น ปีงบประมาณ		-	433,000.00		✓
21	โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบแอสฟัลติกคอนกรีต ถนน ราษฎร์อุทิศ ซอย 9	697,000.00	697,000.00	ม.ค.-พ.ค.66		ทำสัญญาแล้ว ผู้รับจ้าง หจก.อาร์เคซี กันเงิน กรณีได้ก่อนนี้ ผูกพันไว้แล้วก่อนสิ้น ปีงบประมาณ		-	697,000.00		✓
22	โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบแอสฟัลติกคอนกรีต ถนน ดอนนก ซอย 16	112,000.00	112,000.00	ม.ค.-พ.ค.66		ทำสัญญาแล้ว ผู้รับจ้าง หจก.อาร์เคซี กันเงิน กรณีได้ก่อนนี้ ผูกพันไว้แล้วก่อนสิ้น ปีงบประมาณ		-	112,000.00		✓
23	โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบแอสฟัลติกคอนกรีต ถนน ดอนนก ซอย 18	218,000.00	218,000.00	ม.ค.-พ.ค.66		ทำสัญญาแล้ว ผู้รับจ้าง หจก.อาร์เคซี กันเงิน กรณีได้ก่อนนี้ ผูกพันไว้แล้วก่อนสิ้น ปีงบประมาณ		-	218,000.00		✓
24	โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบแอสฟัลติกคอนกรีต ถนน ดอนนก ซอย 20	504,000.00	504,000.00	ม.ค.-พ.ค.66		ทำสัญญาแล้ว ผู้รับจ้าง หจก.อาร์เคซี กันเงิน กรณีได้ก่อนนี้ ผูกพันไว้แล้วก่อนสิ้น ปีงบประมาณ		-	504,000.00		✓
25	โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบแอสฟัลติกคอนกรีต ถนน ดอนนก ซอย 22	241,000.00	241,000.00	ม.ค.-พ.ค.66		ทำสัญญาแล้ว ผู้รับจ้าง หจก.อาร์เคซี กันเงิน กรณีได้ก่อนนี้ ผูกพันไว้แล้วก่อนสิ้น ปีงบประมาณ		-	241,000.00		✓

รายงานผลการดำเนินงานโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ที่ขออนุมัติกันเงินไว้ (ที่ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ) ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

ณ ไตรมาสที่ 4/2566 (ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2566)

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณ ตามเทศบัญญัติ (บาท)	งบประมาณ ที่กันเงิน (บาท)	ระยะเวลาที่ กำหนดไว้ตาม แผนดำเนินงาน	สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมา งคงเหลือ (บาท)	การดำเนินการตาม แผนการดำเนินงาน	
					ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			เป็นไป ตามที่กำหนด	ไม่เป็นไป ตามที่กำหนด
26	โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบแอสฟัลติกคอนกรีต ถนน ชนเกษม ซอย 41	694,000.00	694,000.00	ม.ค.-พ.ค.66		ทำสัญญาแล้ว ผู้รับจ้าง หจก.อาร์เคซี กันเงิน กรณีได้ก่อนนี้ ผูกพันไว้แล้วก่อนสิ้น ปีงบประมาณ		-	694,000.00		✓
27	โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบแอสฟัลติกคอนกรีต ถนน รัฐรังสรรค์ ซอย 1	631,000.00	631,000.00	ม.ค.-พ.ค.66		ทำสัญญาแล้ว ผู้รับจ้าง หจก.อาร์เคซี กันเงิน กรณีได้ก่อนนี้ ผูกพันไว้แล้วก่อนสิ้น ปีงบประมาณ		-	631,000.00		✓
28	โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบแอสฟัลติกคอนกรีต ถนน รัฐรังสรรค์ ซอย 2	571,000.00	571,000.00	ม.ค.-พ.ค.66		ทำสัญญาแล้ว ผู้รับจ้าง หจก.อาร์เคซี กันเงิน กรณีได้ก่อนนี้ ผูกพันไว้แล้วก่อนสิ้น ปีงบประมาณ		-	571,000.00		✓
29	โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบแอสฟัลติกคอนกรีต ถนน สวนหลวง	592,000.00	592,000.00	ม.ค.-พ.ค.66		ทำสัญญาแล้ว ผู้รับจ้าง หจก.อาร์เคซี กันเงิน กรณีได้ก่อนนี้ ผูกพันไว้แล้วก่อนสิ้น ปีงบประมาณ		-	592,000.00		✓
30	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำถนนเลี่ยงเมือง 8/1	800,000.00	800,000.00	ม.ค.-พ.ค.66		รอสำนักงานที่ดินนัดรังวัด ขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน กรณีได้ก่อนนี้ผูกพัน การประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2566 วันที่ 20 ก.ย. 2567		-	800,000.00		✓

รายงานผลการดำเนินงานโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ที่ขออนุมัติกันเงินไว้ (ที่ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ) ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

ณ ไตรมาสที่ 4/2566 (ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2566)

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณ ตามเทศบัญญัติ (บาท)	งบประมาณ ที่กันเงิน (บาท)	ระยะเวลาที่ กำหนดไว้ตาม แผนดำเนินงาน	สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การดำเนินการตาม แผนการดำเนินงาน	
					ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			เป็นไป ตามที่กำหนด	ไม่เป็นไป ตามที่กำหนด
31	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจร ถนนมายเทอเรส	770,000.00	770,000.00	ม.ค.-พ.ค.66		รอลำางานที่ต่นนั้ดรงวั้ด ขยายเวลาเบอจ่ายเงิน กรณมมได้ก่อหน้ผู้กพ้น การประชมสภาเทศบาล สมัยวีสามัญ สมัยที่ 2 ประจาปี 2566 วันที่ 20 ก.ย. 2567		-	770,000.00		✓
32	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจร ถนนพ้อขุนทะเล 6	1,710,000.00	1,710,000.00	ก.พ.-ส.ค.66		รอลำางานที่ต่นนั้ดรงวั้ด ขยายเวลาเบอจ่ายเงิน กรณมมได้ก่อหน้ผู้กพ้น การประชมสภาเทศบาล สมัยวีสามัญ สมัยที่ 2 ประจาปี 2566 วันที่ 20 ก.ย. 2567		-	1,710,000.00		✓
33	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจร ถนนราษฎร์อุทิศ 4	1,300,000.00	1,300,000.00	ก.พ.-ส.ค.66		รอลำางานที่ต่นนั้ดรงวั้ด ขยายเวลาเบอจ่ายเงิน กรณมมได้ก่อหน้ผู้กพ้น การประชมสภาเทศบาล สมัยวีสามัญ สมัยที่ 2 ประจาปี 2566 วันที่ 20 ก.ย. 2567		-	1,300,000.00		✓

รายงานผลการดำเนินงานโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ที่ขออนุมัติกันเงินไว้ (ที่ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ) ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

ณ ไตรมาสที่ 4/2566 (ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2566)

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณ ตามเทศบัญญัติ (บาท)	งบประมาณ ที่กันเงิน (บาท)	ระยะเวลาที่ กำหนดไว้ตาม แผนดำเนินงาน	สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การดำเนินการตาม แผนการดำเนินงาน	
					ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			เป็นไป ตามที่กำหนด	ไม่เป็นไป ตามที่กำหนด
34	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำถนนศรีวิชัย 21/27	1,050,000.00	1,050,000.00	ก.พ.-ส.ค.66		รอลำางานที่ดินนั้ดรงวัด ขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน กรณีได้ก่อนนี้ผู้กพัน การประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2566 วันที่ 20 ก.ย. 2567		-	1,050,000.00		✓
35	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจร ถนนเสม็ดเรียง 1	3,200,000.00	3,200,000.00	ก.พ.-ส.ค.66		รอลำางานที่ดินนั้ดรงวัด ขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน กรณีได้ก่อนนี้ผู้กพัน การประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2566 วันที่ 20 ก.ย. 2567		-	3,200,000.00		✓
36	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำถนนบุญช่วย 7	2,600,000.00	2,600,000.00	ก.พ.-ส.ค.66		รอลำางานที่ดินนั้ดรงวัด ขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน กรณีได้ก่อนนี้ผู้กพัน การประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2566 วันที่ 20 ก.ย. 2567		-	2,600,000.00		✓

รายงานผลการดำเนินงานโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ที่ขออนุมัติกันเงินไว้ (ที่ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ) ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

ณ ไตรมาสที่ 4/2566 (ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2566)

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณ ตามเทศบัญญัติ (บาท)	งบประมาณ ที่กันเงิน (บาท)	ระยะเวลาที่ กำหนดไว้ตาม แผนดำเนินงาน	สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมา งเหลือ (บาท)	การดำเนินการตาม แผนการดำเนินงาน	
					ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			เป็นไป ตามที่กำหนด	ไม่เป็นไป ตามที่กำหนด
37	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจร ถนนศรีเกษม 2 แยกซ้าย 2,3	1,600,000.00	1,600,000.00	ก.พ.-ส.ค.66		รอสำนักงานที่ดิน น้ดรงวัด ขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน กรณีได้ก่อนนี้ผู้กพัน การประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2566 วันที่ 20 ก.ย. 2567		-	1,600,000.00		✓
38	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจร ถนนศรีเกษม 20 แยกซ้าย 2,3,4	4,600,000.00	4,600,000.00	ก.พ.-ส.ค.66		รอสำนักงานที่ดิน น้ดรงวัด ขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน กรณีได้ก่อนนี้ผู้กพัน การประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2566 วันที่ 20 ก.ย. 2567		-	4,600,000.00		✓
39	โครงการขยายเขตประปา	3,805,000.00	3,805,000.00	ก.พ.-ส.ค.66		คณะกรรมการจัดทำแบบ รูปรายการงานก่อสร้าง กันเงิน กรณีได้ก่อนนี้ผู้กพัน ไว้แล้วก่อนสิ้นปีงบประมาณ		-	3,805,000.00		✓
40	โครงการก่อสร้างสถานีขนถ่ายมูลฝอย	15,000,000.00	15,000,000.00	ก.พ.-ก.ย.66		ยกเลิกโครงการ ตามมติสภาเทศบาลฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2566 เมื่อวันที่ 29 พ.ค. 2566		-	15,000,000.00		

รายงานผลการดำเนินงานโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ที่ขออนุมัติกันเงินไว้ (ที่ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ) ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

ณ ไตรมาสที่ 4/2566 (ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2566)

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณ ตามเทศบัญญัติ (บาท)	งบประมาณ ที่กันเงิน (บาท)	ระยะเวลาที่ กำหนดไว้ตาม แผนดำเนินงาน	สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมา งเหลือ (บาท)	การดำเนินการตาม แผนการดำเนินงาน	
					ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			เป็นไป ตามที่กำหนด	ไม่เป็นไป ตามที่กำหนด
41	โครงการก่อสร้างถนนคลองฉาก - หัวแหลมพัฒนา (ทางเข้าศาลพ่อตาหินกลิ้ง)	600,000.00	600,000.00	ก.พ.-มิ.ย.66		อยู่ระหว่างดำเนินการ ก่อสร้าง กันเงิน กรณีได้ก่อหนี้ ผูกพันไว้แล้วก่อนสิ้น ปีงบประมาณ		-	600,000.00		✓
42	โครงการก่อสร้างปรับปรุงทางเท้า ถนนอำเภอ ตั้งแต่ ร้านกำปั่น ถึงแยก รพช. (ชุมชนหนองบัว)	1,700,000.00	1,700,000.00	มี.ค.-ส.ค.66		จัดทำราคากลาง ขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน กรณีได้ก่อหนี้ผูกพัน การประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2566 วันที่ 20 ก.ย. 2567		-	1,700,000.00		✓
รวม		59,263,000.00	59,263,000.00					6,764,360.00	52,498,640.00		
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว											
43	โครงการก่อสร้างหอนาฬิกา	6,800,000.00	6,800,000.00	ต.ค.65-ก.ย.66			✓	3,322,200.00	3,477,800.00	✓	
44	โครงการก่อสร้างเวทีการแสดงสวนศรिताปี	400,000.00	400,000.00	ต.ค.65-มี.ค.66			✓	400,000.00	-		✓
รวม		7,200,000.00	7,200,000.00					3,722,200.00	3,477,800.00		
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต											
45	โครงการสนามเด็กเล่นบริเวณสวนศรिताปี	500,000.00	500,000.00	ต.ค.65-ม.ค.66			✓	300,000.00	200,000.00		✓
รวม		500,000.00	500,000.00					300,000.00	200,000.00		
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทางการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น											
46	โครงการปรับปรุงหลังคาและฝ้าเพดาน - อาคารตรีพฤชา - อาคารปฐมโพธิ์ - อาคารธรรมมาภิบาล โรงเรียนเทศบาล 4 (วัดโพธาราม)	2,700,000.00	2,700,000.00	ต.ค.65-พ.ค.66		ตรวจรับงานงวดสุดท้าย กันเงิน กรณีได้ก่อหนี้ ผูกพันไว้แล้วก่อนสิ้น ปีงบประมาณ		-	2,700,000.00		✓

รายงานผลการดำเนินงานโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ที่ขออนุมัติกันเงินไว้ (ที่ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ) ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

ณ ไตรมาสที่ 4/2566 (ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2566)

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณ ตามเทศบัญญัติ (บาท)	งบประมาณ ที่กันเงิน (บาท)	ระยะเวลาที่ กำหนดไว้ตาม แผนดำเนินงาน	สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การดำเนินการตาม แผนการดำเนินงาน	
					ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			เป็นไป ตามที่กำหนด	ไม่เป็นไป ตามที่กำหนด
47	โครงการปรับปรุงห้องน้ำ-ห้องส้วม - อาคารตรีพุกษา - อาคารปฐมโพธิ์ - อาคารธรรมมาภิบาล โรงเรียนเทศบาล 4 (วัดโพธาราม)	2,835,000.00	2,835,000.00	ต.ค.65-พ.ค.66		บริหารสัญญา กันเงิน กรณีได้ก่อนนี้ ผูกพันไว้แล้วก่อนสิ้น ปีงบประมาณ		-	2,835,000.00		✓
รวม		5,535,000.00	5,535,000.00					0.00	5,535,000.00		
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี											
48	โครงการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนคร สุราษฎร์ธานี (จ้างที่ปรึกษา)	250,000.00	247,000.00	ต.ค.65-ม.ค.66			✓	247,000.00	-		✓
รวม		250,000.00	247,000.00					247,000.00	-		
รวมทุกยุทธศาสตร์		72,748,000.00	72,745,000.00					11,033,560.00	61,711,440.00	-	-
