



รายงานติดตาม

ผลการเบิกจ่ายและผลการดำเนินโครงการ
ตามแผนพัฒนาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

ประจำปีงบประมาณที่ 2/2567

(ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567)



คำนำ

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ครั้งที่ 4/2566 เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2566 ได้กำหนดแนวทางวิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 กำหนดให้มีการติดตามผลการเบิกจ่ายและผลการดำเนินโครงการตามแผนพัฒนาฯ ประจำเดือนและประจำไตรมาส โดยมอบหมายให้งานวิจัยและประเมินผลจัดทำรายงานสรุปผลในภาพรวมนำเสนอผู้บริหารทราบทุกสิ้นเดือน และเสนอต่อคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีทราบและให้ข้อเสนอแนะ ทุกสิ้นไตรมาส

ทั้งนี้เพื่อติดตามความก้าวหน้าและผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีอย่างต่อเนื่องและเกิดประโยชน์ต่อการดำเนินงานของหน่วยงานต่อไป



สารบัญ



หน้า 1

แผนภูมิแสดงผลการเบิกจ่ายงบประมาณตามเทศบัญญัติฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567)

หน้า 2

สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณตามเทศบัญญัติถึงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567)

หน้า 6

รายงานผลการดำเนินโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567)

หน้า 8

แผนภูมิแสดงผลการดำเนินโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567)

หน้า 10

สรุปผลการดำเนินโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567)

หน้า 11

บัญชีรายละเอียดผลการดำเนินโครงการตามเทศบัญญัติถึงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567)

หน้า 31

บัญชีรายละเอียดผลการดำเนินโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565-2566 ที่จ่ายจากเงินสะสม ที่ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ (ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567)


หน้า 35

บัญชีรายละเอียดผลการดำเนินโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564-2566 ที่ขออนุมัติกันเงินไว้ ที่ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ (ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567)

แผนภูมิแสดงผลการเบิกจ่ายงบประมาณตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

ประจำปีงบประมาณที่ 2 /2567 ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

เป้าหมายการเบิกจ่าย ร้อยละ 50

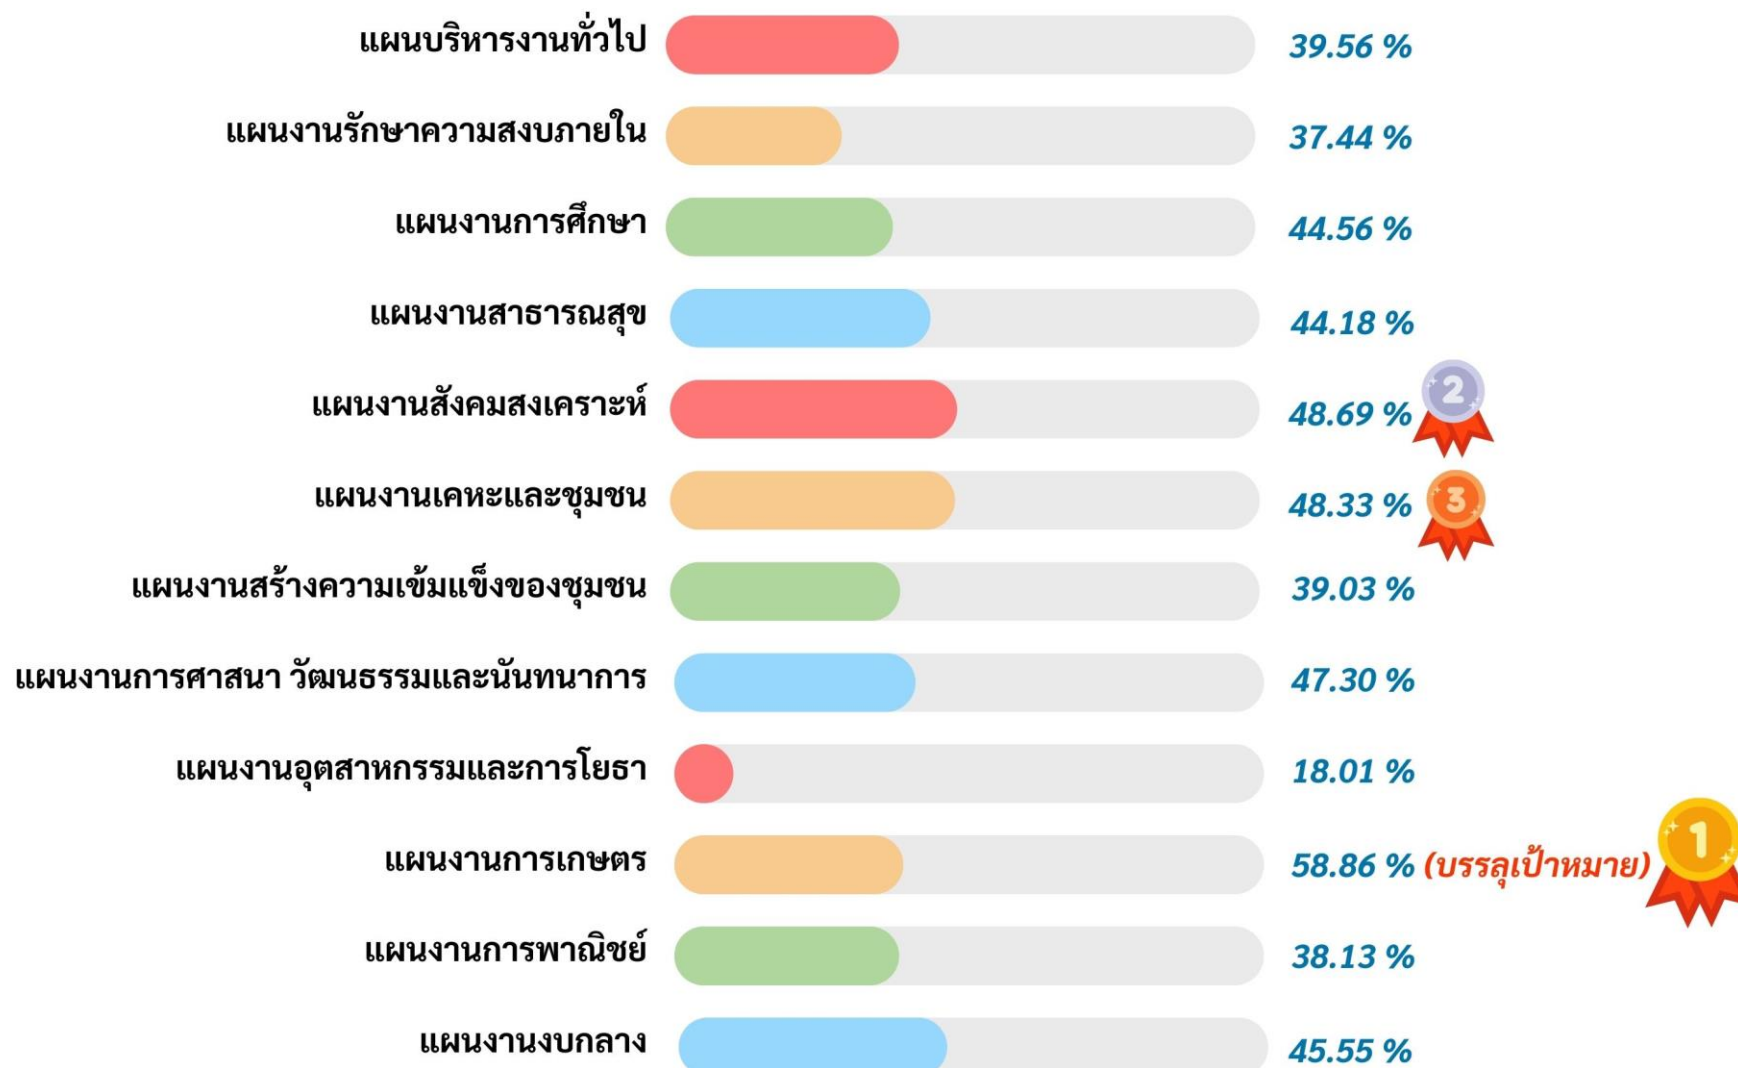

สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

ประจำไตรมาสที่ 2/2567 (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567)



เป้าหมายการเบิกจ่าย ไตรมาสที่ 2/2567

- > รายจ่ายประจำ ร้อยละ 55 (ของรายจ่ายประจำทั้งหมด)
- > งบลงทุน ร้อยละ 45 (ของงบลงทุนทั้งหมด)
- > การเบิกจ่ายในภาพรวม ร้อยละ 50 (ของงบประมาณทั้งหมด)

ลำดับ	แผนงาน / งาน	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	การโอนงบประมาณ		การเบิกจ่าย		งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การเบิกจ่าย (ร้อยละ)	หน่วยงาน ผู้เบิก
			โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	ผูกพัน (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)			
1	แผนงานบริหารงานทั่วไป	141,265,840.00	3,530,450.00	1,694,250.00	5,542,276.94	51,064,558.90	86,495,204.16	39.56	
	รายจ่ายประจำ	140,227,790.00	3,284,600.00	1,694,250.00	5,537,776.94	50,232,108.90	86,048,254.16	39.32	
	- งานบริหารทั่วไป	94,472,800.00	1,122,700.00	1,318,750.00	4,912,953.75	30,940,771.83	58,423,024.42		สป./กองยุทธฯ/กจ.
	- งานวางแผนสถิติและวิชาการ	4,591,600.00	18,000.00	33,000.00	22,496.00	1,899,873.80	2,654,230.20		กองยุทธฯ
	- งานบริหารงานคลัง	40,272,000.00	2,123,900.00	322,500.00	567,327.19	17,151,854.60	24,354,218.21		คลัง/สารสนเทศฯ
	- งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน	891,390.00	20,000.00	20,000.00	35,000.00	239,608.67	616,781.33		หน่วยตรวจสอบภายใน
	รายจ่ายเพื่อการลงทุน	1,038,050.00	245,850.00	-	4,500.00	832,450.00	446,950.00	65.19	
	- งานบริหารทั่วไป (ครุภัณฑ์)	1,038,050.00	245,850.00	-	4,500.00	832,450.00	446,950.00		
2	แผนงานรักษาความสงบภายใน	33,067,900.00	896,500.00	1,296,500.00	507,480.07	11,722,455.78	20,437,964.15	37.44	
	รายจ่ายประจำ	33,026,400.00	740,500.00	1,296,500.00	507,480.07	11,680,955.78	20,281,964.15	37.54	
	- งานเทศกิจ	10,877,200.00	113,500.00	113,500.00	203,917.20	4,256,233.69	6,417,049.11		สำนักปลัดเทศบาล
	- งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	17,526,600.00	69,000.00	225,000.00	152,188.72	5,831,879.74	11,386,531.54		
	- งานจราจร	4,622,600.00	558,000.00	958,000.00	151,374.15	1,592,842.35	2,478,383.50		สำนักช่าง
	รายจ่ายเพื่อการลงทุน	41,500.00	156,000.00	-	-	41,500.00	156,000.00	21.01	
	-งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย(ครุภัณฑ์)	41,500.00	156,000.00	-	-	41,500.00	156,000.00		

ลำดับ	แผนงาน / งาน	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	การโอนงบประมาณ		การเบิกจ่าย		งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การเบิกจ่าย (ร้อยละ)	หน่วยงาน ผู้เบิก
			โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	ผูกพัน (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)			
3	แผนงานการศึกษา	315,744,300.00	1,142,725.00	1,217,125.00	6,531,967.70	134,123,303.06	175,014,629.24	44.56	
	รายจ่ายประจำ	315,179,300.00	1,065,625.00	1,217,125.00	6,371,967.70	134,123,303.06	174,532,529.24	44.60	
	- งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	8,123,100.00	13,845.00	410,145.00	75,938.17	2,794,520.45	4,856,341.38		สำนักงานการศึกษา
	- งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	172,264,500.00	171,780.00	439,780.00	4,201,621.87	75,764,074.06	92,030,804.07		
	- งานระดับมัธยมศึกษา	128,350,800.00	880,000.00	-	2,059,471.07	53,538,437.16	73,632,891.77		
	- งานศึกษาไม่กำหนดระดับ	6,440,900.00	-	367,200.00	34,936.59	2,026,271.39	4,012,492.02		
	รายจ่ายเพื่อการลงทุน	565,000.00	77,100.00	-	160,000.00	-	482,100.00	24.92	
	- งานระดับก่อนวัยเรียนฯ (ครุภัณฑ์)	565,000.00	-	-	160,000.00	-	405,000.00		
	- งานศึกษาไม่กำหนดระดับ (ครุภัณฑ์)	-	77,100.00	-	-	-	77,100.00		
4	แผนงานสาธารณสุข	66,042,600.00	651,300.00	330,620.00	1,350,062.84	27,970,198.29	37,043,018.87	44.18	
	รายจ่ายประจำ	65,622,200.00	651,300.00	330,620.00	1,261,062.84	27,898,798.29	36,783,018.87	44.22	
	- งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	9,074,500.00	114,100.00	144,720.00	305,083.00	4,039,940.61	4,698,856.39		สำนักงานสาธารณสุข
	- งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	18,364,700.00	77,500.00	185,900.00	531,175.52	6,059,389.64	11,665,734.84		
	- งานศูนย์บริการสาธารณสุข	38,183,000.00	459,700.00	-	424,804.32	17,799,468.04	20,418,427.64		
	รายจ่ายเพื่อการลงทุน	420,400.00	-	-	89,000.00	71,400.00	260,000.00	38.15	
	- งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข (ครุภัณฑ์)	71,400.00	-	-	-	71,400.00	-		สำนักงานสาธารณสุข
	- งานศูนย์บริการสาธารณสุข (ครุภัณฑ์)	349,000.00	-	-	89,000.00	-	260,000.00		
5	แผนงานสังคมสงเคราะห์	11,783,390.00	35,000.00	35,000.00	502,247.41	5,235,616.62	6,045,525.97	48.69	
	รายจ่ายประจำ	11,756,690.00	35,000.00	35,000.00	502,247.41	5,208,916.62	6,045,525.97	48.58	
	- งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์	4,960,700.00	20,000.00	20,000.00	2,582.41	2,188,321.94	2,769,795.65		กองสวัสดิการสังคม
	- งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	6,795,990.00	15,000.00	15,000.00	499,665.00	3,020,594.68	3,275,730.32		
	รายจ่ายเพื่อการลงทุน	26,700.00	-	-	-	26,700.00	-	-	
	- งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์(ครุภัณฑ์)	26,700.00	-	-	-	26,700.00	-		สำนักช่าง

ลำดับ	แผนงาน / งาน	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	การโอนงบประมาณ		การเบิกจ่าย		งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การเบิกจ่าย (ร้อยละ)	หน่วยงาน ผู้เบิก
			โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	ผูกพัน (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)			
6	แผนงานเคหะและชุมชน	185,454,570.00	6,793,200.00	3,340,640.00	20,605,368.03	70,697,244.85	97,604,517.12	48.33	
	รายจ่ายประจำ	160,454,570.00	6,793,200.00	3,340,640.00	20,605,368.03	70,697,244.85	72,604,517.12	55.70	
	- งานไฟฟ้าและประปา	321,270.00	-	-	-	321,233.26	36.74		สำนักช่าง
	- งานสวนสาธารณะ	10,119,800.00	660,200.00	18,200.00	282,948.54	5,695,422.30	4,783,429.16		
	- งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	131,277,300.00	1,154,000.00	2,519,440.00	19,142,210.58	56,600,743.90	54,168,905.52		สช. / สธ.
	- งานบำบัดน้ำเสีย	18,736,200.00	4,979,000.00	803,000.00	1,180,208.91	8,079,845.39	13,652,145.70		สำนักช่าง
	รายจ่ายเพื่อการลงทุน	25,000,000.00	-	-	-	-	25,000,000.00	-	
	- งานสวนสาธารณะ (ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)	5,000,000.00	-	-	-	-	5,000,000.00		สช. / สธ.
	- งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล (ค่าครุภัณฑ์)	20,000,000.00	-	-	-	-	20,000,000.00		สช. / สธ.
7	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	18,726,600.00	-	-	1,457,208.00	5,851,708.10	11,417,683.90	39.03	
	รายจ่ายประจำ	18,726,600.00	-	-	1,457,208.00	5,851,708.10	11,417,683.90	39.03	
	- งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	18,726,600.00	-	-	1,457,208.00	5,851,708.10	11,417,683.90		กองสวัสดิการสังคม
	รายจ่ายเพื่อการลงทุน	-	-	-	-	-	-		
8	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและ นันทนาการ	25,594,500.00	1,060,000.00	186,000.00	433,567.77	12,085,936.54	13,948,995.69	47.30	
	รายจ่ายประจำ	25,525,000.00	1,050,000.00	186,000.00	433,567.77	12,016,436.54	13,938,995.69	47.18	
	- งานกีฬาและนันทนาการ	8,767,400.00	-	-	274,406.87	774,702.64	7,718,290.49		สำนักการศึกษา
	- งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	12,487,900.00	-	93,000.00	58,900.00	8,810,580.30	3,525,419.70		
	- งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว	4,269,700.00	1,050,000.00	93,000.00	100,260.90	2,431,153.60	2,695,285.50		สำนักปลัดเทศบาล
	รายจ่ายเพื่อการลงทุน	69,500.00	10,000.00	-	-	69,500.00	10,000.00	87.42	
	- งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น (ค่าครุภัณฑ์)	-	10,000.00	-	-	-	10,000.00		
	- งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมฯ (ค่าครุภัณฑ์)	69,500.00	-	-	-	69,500.00	-		

ลำดับ	แผนงาน / งาน	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	การโอนงบประมาณ		การเบิกจ่าย		งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การเบิกจ่าย (ร้อยละ)	หน่วยงาน ผู้เบิก
			โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	ผูกพัน (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)			
9	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	150,346,390.00	3,426,000.00	7,986,000.00	2,140,840.55	24,111,689.02	119,533,860.43	18.01	
	รายจ่ายประจำ	57,412,740.00	3,390,000.00	6,921,000.00	2,140,840.55	23,565,489.02	28,175,410.43	47.71	
	- งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมฯ	7,341,300.00	295,000.00	435,000.00	96,984.69	2,994,090.93	4,110,224.38		สำนักงานช่าง
	- งานก่อสร้าง	50,071,440.00	3,095,000.00	6,486,000.00	2,043,855.86	20,571,398.09	24,065,186.05		
	รายจ่ายเพื่อการลงทุน	92,933,650.00	36,000.00	1,065,000.00	-	546,200.00	91,358,450.00	0.59	
	- งานบริหารทั่วไป (ค่าครุภัณฑ์)	-	36,000.00	-	-	-	36,000.00		สำนักงานช่าง
	- งานก่อสร้าง (ค่าครุภัณฑ์)	26,578,450.00	-	-	-	546,200.00	26,032,250.00		สำนักงานช่าง
	- งานก่อสร้าง (ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)	66,355,200.00	-	1,065,000.00	-	-	65,290,200.00		สำนักงานช่าง
10	แผนงานการเกษตร	6,699,900.00	-	142,000.00	508,496.80	3,351,678.29	2,697,724.91	58.86	
	รายจ่ายประจำ	6,699,900.00	-	142,000.00	508,496.80	3,351,678.29	2,697,724.91	58.86	
	- งานส่งเสริมการเกษตร	6,699,900.00	-	142,000.00	508,496.80	3,351,678.29	2,697,724.91		สำนักงานช่าง
	รายจ่ายเพื่อการลงทุน	-	-	-	-	-	-		
11	แผนงานการพาณิชย์	3,296,200.00	123,760.00	25,000.00	75,534.40	1,219,027.30	2,100,398.30	38.13	
	รายจ่ายประจำ	3,296,200.00	123,760.00	25,000.00	75,534.40	1,219,027.30	2,100,398.30	38.13	
	- งานตลาดสด	651,100.00	-	-	29,704.42	223,006.82	398,388.76		สำนักปลัดเทศบาล
	- งานโรงฆ่าสัตว์	2,645,100.00	123,760.00	25,000.00	45,829.98	996,020.48	1,702,009.54		สำนักสาธารณสุขฯ
	รายจ่ายเพื่อการลงทุน	-	-	-	-	-	-	-	
12	แผนงานงบกลาง	241,977,810.00	200,000.00	1,605,800.00	596,437.00	108,988,336.83	130,987,236.17	45.55	
	รายจ่ายประจำ	241,977,810.00	200,000.00	1,605,800.00	596,437.00	108,988,336.83	130,987,236.17	45.55	
	รายจ่ายเพื่อการลงทุน	-	-	-	-	-	-		
	การเบิกจ่ายในภาพรวม	1,200,000,000.00	17,858,935.00	17,858,935.00	40,251,487.51	456,421,753.58	703,326,758.91	41.39	
	รวมรายจ่ายประจำ	1,079,905,200.00	17,333,985.00	16,793,935.00	39,997,987.51	454,834,003.58	585,613,258.91	45.80	
	รวมงบลงทุน	120,094,800.00	524,950.00	1,065,000.00	253,500.00	1,587,750.00	117,713,500.00	1.54	

รายงาน

ผลการดำเนินโครงการ

- ✓ โครงการที่ตั้งจ่ายจากงบประมาณตามเทศบัญญัติ ฯ
- ✓ โครงการที่ตั้งจ่ายจากเงินสะสม
- ✓ โครงการที่อนุมัติกันเงินไว้ (ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ)

สรุปผลการดำเนินโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

ประจำไตรมาสที่ 2/2567 (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567)

ที่	ยุทธศาสตร์การพัฒนา	ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น				ที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ				ที่ได้ดำเนินการ			
		โครงการ		งบประมาณ		โครงการ		งบประมาณ		โครงการ		งบประมาณ	
		จำนวน	ร้อยละ	จำนวน (บาท)	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน (บาท)	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน (บาท)	ร้อยละ
1	ด้านโครงสร้างพื้นฐาน	152	40.00	1,192,893,043.00	43.81	40	10.53	332,746,918.00	12.22	9	2.37	4,739,270.00	0.17
2	ด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว	11	2.89	50,895,000.00	1.87	8	2.11	14,277,000.00	0.52	5	1.32	3,877,000.00	0.14
3	ด้านการจัดการ ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม	9	2.37	944,770,000.00	34.69	4	1.05	5,700,000.00	0.21	3	0.79	700,000.00	0.03
4	ด้านสวัสดิการสังคมและคุณภาพ ชีวิต	123	32.37	97,719,680.00	3.59	111	29.21	45,694,600.00	1.68	61	16.05	38,249,600.00	1.40
5	ด้านการศึกษา การกีฬา ศาสนา ประเพณีและวัฒนธรรม	67	17.63	430,893,800.00	15.82	46	12.11	137,868,800.00	5.06	34	8.95	130,190,900.00	4.78
6	ด้านการบริหารจัดการที่ดี	18	4.74	6,010,000.00	0.22	14	3.68	2,925,000.00	0.11	8	2.11	1,825,000.00	0.07
รวมทั้งสิ้น		380	100.00	2,723,181,523.00	100.00	223	58.68	539,212,318.00	19.80	120	31.58	179,581,770.00	6.59


หมายเหตุ ที่ได้ดำเนินการ หมายถึง โครงการที่ดำเนินการเสร็จสิ้นรวมกับโครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ

แผนภูมิแสดง

ผลการดำเนินโครงการในภาพรวมแยกรายยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
ประจำไตรมาสที่ 2/2567 (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567)

● ดำเนินการเสร็จ ● ระหว่างดำเนินการ ● ยังไม่ดำเนินการ ● ยกเลิก

ยุทธศาสตร์การพัฒนา

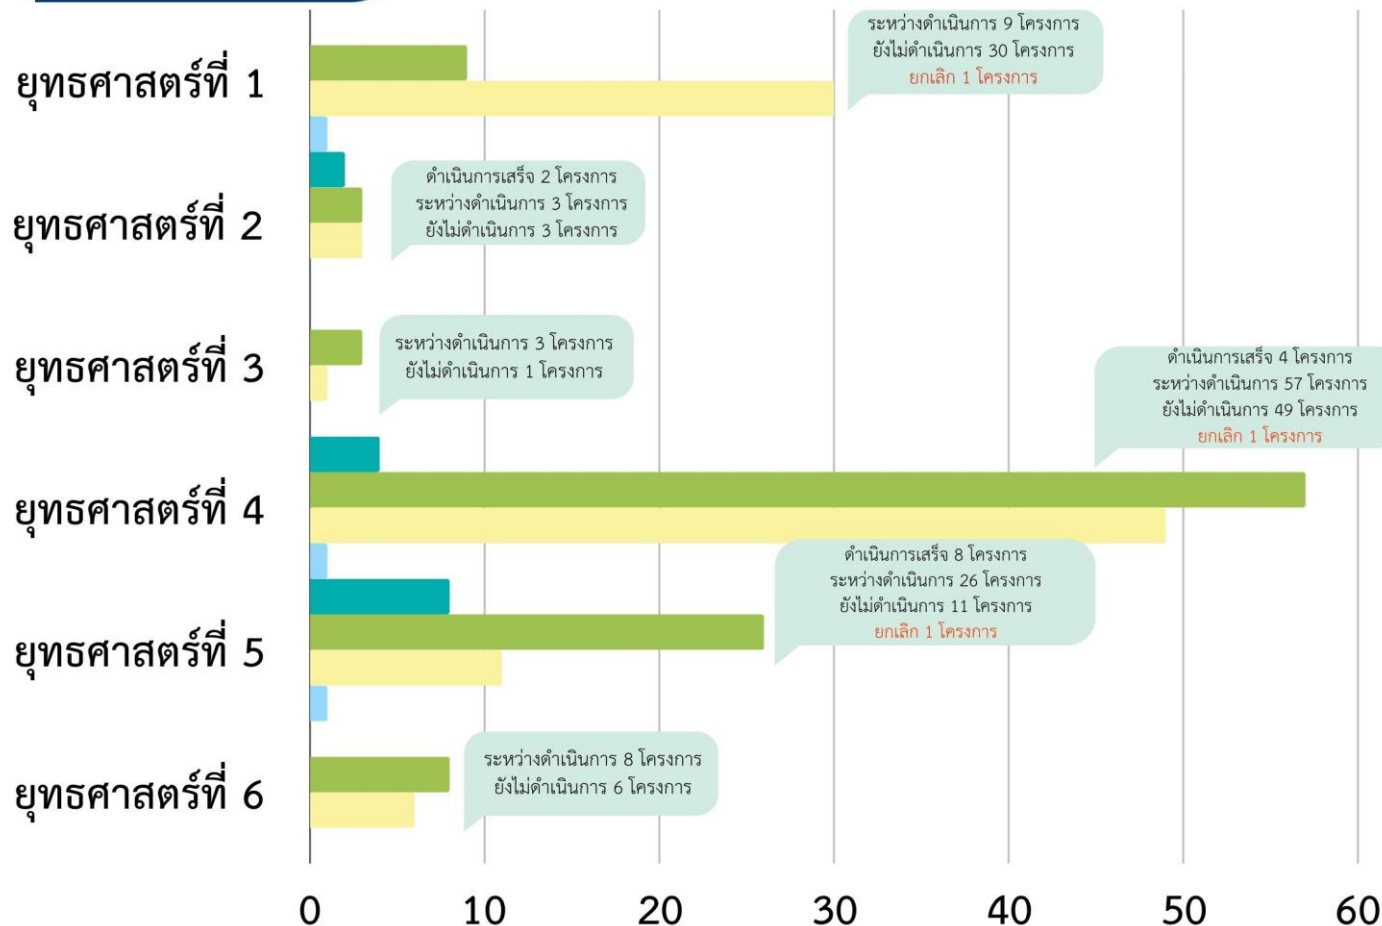

- 
- ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
 - ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว
 - ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 - ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านสวัสดิการสังคมและคุณภาพชีวิต
 - ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการศึกษา การกีฬา ศาสนา ประเพณีและวัฒนธรรม
 - ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการบริหารจัดการที่ดี

หน่วย : ร้อยละ

แผนภูมิแสดง

สถานะการดำเนินโครงการในภาพรวม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
ประจำไตรมาสที่ 2/2567 (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567)

ร้อยละ
6.28

ดำเนินการเสร็จ
จำนวน 14 โครงการ

ร้อยละ
47.53

อยู่ระหว่างดำเนินการ
จำนวน 106 โครงการ


ร้อยละ
44.84

ยังไม่ดำเนินการ
จำนวน 100 โครงการ

ร้อยละ
1.35

ยกเลิก
จำนวน 1 โครงการ

ยังไม่ดำเนินการ
44.8%

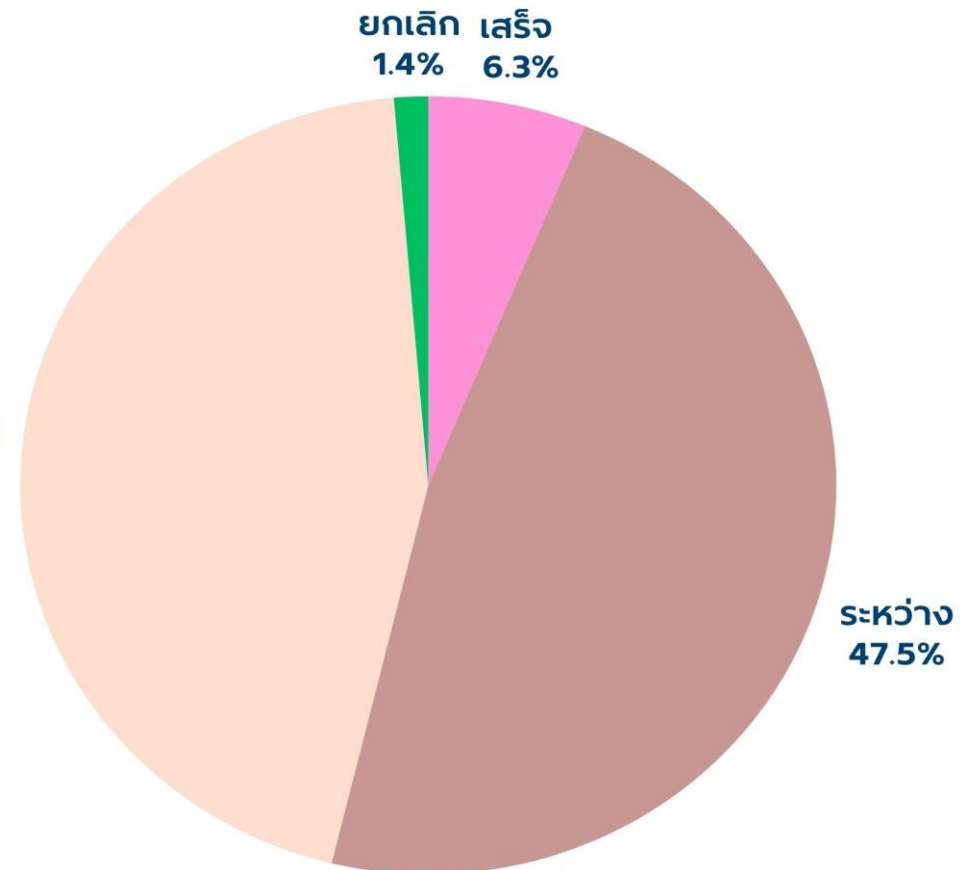


สรุปผลการดำเนินโครงการในภาพรวม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

ประจำปีไตรมาสที่ 2/2567 (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567)

จำนวนโครงการที่ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ.2567 มีทั้งหมด 223 โครงการ
งบประมาณรวมทั้งสิ้น 539,212,318 บาท (ห้าร้อยสามสิบเก้าล้านสองแสนหนึ่งหมื่นสองพันสามร้อยสิบแปดบาทถ้วน)
มีรายละเอียดผลการดำเนินงาน ดังนี้

1. โครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 จำนวน 191 โครงการ งบประมาณ 206,786,670 บาท														
ยุทธศาสตร์	รวมทั้งสิ้น			ดำเนินการเสร็จสิ้น			ระหว่างดำเนินการ			ยังไม่ดำเนินการ		โครงการที่ยกเลิก		
	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบประมาณที่เบิกจ่าย	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบประมาณที่เบิกจ่าย	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบประมาณที่เบิกจ่าย	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	
1. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน	8	321,270.00	292,292.97	-	-	-	7	321,270.00	292,292.97	-	-	1	-	
2. ด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว	8	14,277,000.00	2,093,716.00	2	1,477,000.00	1,477,000.00	3	2,400,000.00	616,716.00	3	10,400,000.00	-	-	
3. ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	4	5,700,000.00	131,360.00	-	-	-	3	700,000.00	131,360.00	1	5,000,000.00	-	-	
4. ด้านสวัสดิการสังคมและคุณภาพชีวิต	111	45,694,600.00	4,087,987.52	4	1,210,000.00	1,125,678.52	57	37,039,600.00	2,962,309.00	49	7,415,000.00	1	30,000.00	
5. ด้านการศึกษา การกีฬา ศาสนา ประเพณีและวัฒนธรรม	46	137,868,800.00	48,943,437.00	8	9,612,000.00	8,317,576.50	26	120,578,900.00	40,625,860.50	11	7,677,900.00	1	-	
6. ด้านการบริหารจัดการที่ดี	14	2,925,000.00	235,598.00	-	-	-	8	1,825,000.00	235,598.00	6	1,100,000.00	-	-	
รวม	191	206,786,670.00	55,784,391.49	14	12,299,000.00	10,920,255.02	104	162,864,770.00	44,864,136.47	70	31,592,900.00	3	30,000.00	
คิดเป็นร้อยละ		100.00			7.33			54.45			36.65		1.57	
2. โครงการที่จ่ายจากเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 จำนวน 32 โครงการ งบประมาณ 332,425,648 บาท														
ยุทธศาสตร์	รวมทั้งสิ้น			ดำเนินการเสร็จสิ้น			ระหว่างดำเนินการ			ยังไม่ดำเนินการ		โครงการที่ยกเลิก		
	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบประมาณที่เบิกจ่าย	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบประมาณที่เบิกจ่าย	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบประมาณที่เบิกจ่าย	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	
1. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน	32	332,425,648.00	-	-	-	-	2	4,418,000.00	-	30	328,007,648.00	-	-	
รวม	32	332,425,648.00	-	-	-	-	2	4,418,000.00	-	30	328,007,648.00	-	-	
คิดเป็นร้อยละ		100.00			0.00			6.25			93.75		0.00	
รวมทั้งสิ้น	223	539,212,318.00	55,784,391.49	14	12,299,000.00	10,920,255.02	106	167,282,770.00	44,864,136.47	100	359,600,548.00	3	30,000.00	
คิดเป็นร้อยละ		100.00			6.28			47.53			44.84		1.35	

บัญชีรายละเอียด
ผลการดำเนินโครงการที่ถ่ายจาก
งบประมาณตามเทศบัญญัติฯ

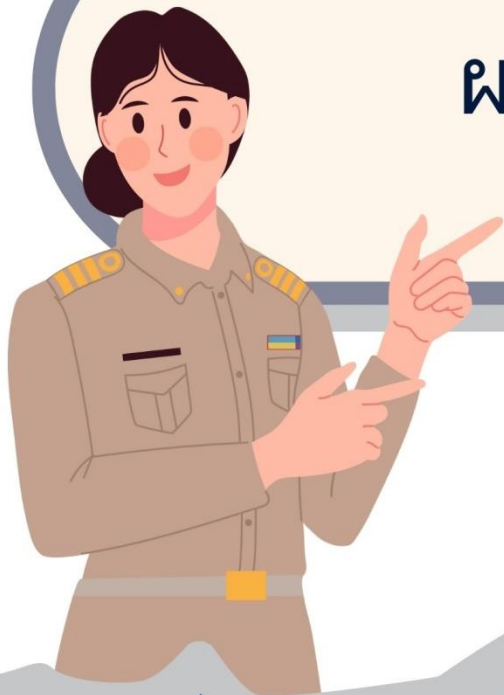

สรุปผลการดำเนินโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
ณ เดือนมีนาคม 2567 (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567)

จำนวนโครงการที่ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 มีทั้งหมด 223 โครงการ งบประมาณรวมทั้งสิ้น 539,212,318 บาท (ห้าร้อยสามสิบเก้าล้านสองแสนหนึ่งหมื่นสองพันสามร้อยสิบแปดบาทถ้วน)
มีรายละเอียดผลการดำเนินงาน ดังนี้

1. โครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 จำนวน 191 โครงการ งบประมาณ 206,786,670 บาท

ยุทธศาสตร์	รวมทั้งสิ้น			ดำเนินการเสร็จสิ้น			ระหว่างดำเนินการ			ยังไม่ดำเนินการ		โครงการที่ยกเลิก	
	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบประมาณที่เบิกจ่าย	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบประมาณที่เบิกจ่าย	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบประมาณที่เบิกจ่าย	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้
1. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน	8	321,270.00	292,292.97	-	-	-	7	321,270.00	292,292.97	-	-	1	-
2. ด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว	8	14,277,000.00	2,093,716.00	2	1,477,000.00	1,477,000.00	3	2,400,000.00	616,716.00	3	10,400,000.00	-	-
3. ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	4	5,700,000.00	131,360.00	-	-	-	3	700,000.00	131,360.00	1	5,000,000.00	-	-
4. ด้านสวัสดิการสังคมและคุณภาพชีวิต	111	45,694,600.00	4,087,987.52	4	1,210,000.00	1,125,678.52	57	37,039,600.00	2,962,309.00	49	7,415,000.00	1	30,000.00
5. ด้านการศึกษา การกีฬา ศาสนา ประเพณีและวัฒนธรรม	46	137,868,800.00	48,943,437.00	8	9,612,000.00	8,317,576.50	26	120,578,900.00	40,625,860.50	11	7,677,900.00	1	-
6. ด้านการบริหารจัดการที่ดี	14	2,925,000.00	235,598.00	-	-	-	8	1,825,000.00	235,598.00	6	1,100,000.00	-	-
รวม	191	206,786,670.00	55,784,391.49	14	12,299,000.00	10,920,255.02	104	162,864,770.00	44,864,136.47	70	31,592,900.00	3	30,000.00
คิดเป็นร้อยละ		100.00			7.33			54.45			36.65		1.57

2. โครงการที่จ่ายจากเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 จำนวน 32 โครงการ งบประมาณ 332,425,648 บาท

ยุทธศาสตร์	รวมทั้งสิ้น			ดำเนินการเสร็จสิ้น			ระหว่างดำเนินการ			ยังไม่ดำเนินการ		โครงการที่ยกเลิก	
	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบประมาณที่เบิกจ่าย	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบประมาณที่เบิกจ่าย	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบประมาณที่เบิกจ่าย	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้
1. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน	32	332,425,648.00	-	-	-	-	2	4,418,000.00	-	30	328,007,648.00	-	-
รวม	32	332,425,648.00	-	-	-	-	2	4,418,000.00	-	30	328,007,648.00	-	-
คิดเป็นร้อยละ		100.00			0.00			6.25			93.75		0.00
รวมทั้งสิ้น	223	539,212,318.00	55,784,391.49	14	12,299,000.00	10,920,255.02	106	167,282,770.00	44,864,136.47	100	359,600,548.00	3	30,000.00
คิดเป็นร้อยละ		100.00			6.28			47.53			44.84		1.35

รายงานผลการดำเนินงานโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
ณ เดือนมีนาคม 2567 (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567)

แบบรายงาน 2.1

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	ระยะเวลาที่กำหนดไว้ ตามแผนดำเนินงาน		สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การดำเนินการตาม แผนการดำเนินงาน	
							ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			เป็นไป ตามที่กำหนด	ไม่เป็นไป ตามที่กำหนด
					วันที่เริ่มต้น	วันที่สิ้นสุด							
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน													
1	โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะถนนโกลรัฐ 19	74,940.00	-	-	1 พ.ย. 66	31 ส.ค. 67		การดำเนินการของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัดสุราษฎร์ธานี		45,999.30	28,940.70	✓	
2	โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะถนนศรีวิชัย 31/1	40,700.00	-	-	1 พ.ย. 66	31 ส.ค. 67		การดำเนินการของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัดสุราษฎร์ธานี		40,698.52	1.48	✓	
3	โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะถนนพ่อขุนทะเล 13/1/1	44,000.00	-	-	1 พ.ย. 66	31 ส.ค. 67		การดำเนินการของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัดสุราษฎร์ธานี		43,991.98	8.02	✓	
4	โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะถนนชนเกษม 39/1	37,040.00	-	-	1 พ.ย. 66	31 ส.ค. 67		การดำเนินการของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัดสุราษฎร์ธานี		37,031.63	8.37	✓	
5	โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะถนนกาญจนาภิเษก ขยายตรงข้าม วัดโพธิ์นิมิต	33,640.00	-	-	1 พ.ย. 66	31 ส.ค. 67		การดำเนินการของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัดสุราษฎร์ธานี		33,631.17	8.83	✓	
6	โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะถนนกาญจนาภิเษก 3	46,000.00	-	-	1 พ.ย. 66	31 ส.ค. 67		การดำเนินการของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัดสุราษฎร์ธานี		45,999.30	0.70	✓	
7	โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะถนนกาญจนาภิเษก 16 ซอย 18	44,950.00	-	-	1 พ.ย. 66	31 ส.ค. 67		การดำเนินการของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัดสุราษฎร์ธานี		44,941.07	8.93	✓	
8	โครงการขยายผิวจราจรและปรับปรุงทางเท้าถนนหน้าเมือง ทั้ง 2 ข้าง ตั้งแต่แยกถนนหลวงอนุวัตรไปจนถึงถนนกาญจนาภิเษก (ชุมชนหน้าด่าน,ชุมชนโพหวาย,ชุมชนตลาดล่าง)	1,065,000.00	-	1,065,000.00	1 มี.ค. 67	30 ก.ย. 67		ยกเลิกโครงการ เนื่องจากโครงการไม่ได้รับ เงินสมทบโครงการ เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำหรับ โครงการก่อสร้าง/ ซ่อมสร้าง/ปรับปรุง ซ่อมแซมถนนทางหลวง ท้องถิ่น (ถนนถ่ายโอน ภารกิจและถนน อปท.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567		-	-		
รวม		1,386,270.00	-	1,065,000.00						292,292.97	28,977.03		

รายงานผลการดำเนินงานโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

ณ เดือนมีนาคม 2567 (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567)

แบบรายงาน 2.1

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	ระยะเวลาที่กำหนดไว้ ตามแผนดำเนินงาน		สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การดำเนินการตาม แผนการดำเนินงาน	
							ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			เป็นไป ตามที่กำหนด	ไม่เป็นไป ตามที่กำหนด
					วันที่เริ่มต้น	วันที่สิ้นสุด							
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว													
9	โครงการเย็นทั่วหล้า มหาสงกรานต์	500,000.00	1,000,000.00	-	1 เม.ย. 67	30 เม.ย. 67		ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง		-	1,500,000.00	✓	
10	โครงการเคาท์ดาวน/สวัสดีปีใหม่	500,000.00	-	8,000.00	1 ธ.ค. 66	31 ม.ค. 67			✓	492,000.00	-	✓	
11	โครงการส่งเสริมกิจกรรมและประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี	1,000,000.00	-	15,000.00	1 ต.ค. 66	30 ก.ย. 67			✓	985,000.00	-	✓	
12	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ริมเขื่อนแม่น้ำตาปีถนนบ้านดอน (ช่วงที่ 3)	5,500,000.00	-	-	1 ม.ค. 67	31 ส.ค. 67	✓			-	5,500,000.00		✓
13	โครงการถนนคนเดิน	400,000.00	-	-	1 ต.ค. 66	30 ก.ย. 67		จำหน่ายสินค้า วันเสาร์-อาทิตย์		254,918.00	145,082.00	✓	
14	โครงการตลาดสะพานโค้ง 100 ปี	500,000.00	-	-	1 ต.ค. 66	30 ก.ย. 67		จำหน่ายสินค้า วันเสาร์-อาทิตย์		361,798.00	138,202.00	✓	
15	โครงการก่อสร้างหลังคาคลุมทางเดินตลาดนัดตลาดน้ำบ้านดอน	2,900,000.00	-	-	1 ธ.ค. 66	30 มิ.ย. 67	✓			-	2,900,000.00		✓
16	โครงการก่อสร้างสะพานทางเดินชุมชนบางหลา	2,000,000.00	-	-	1 ก.พ. 67	30 มิ.ย. 67	✓			-	2,000,000.00		✓
รวม		13,300,000.00	1,000,000.00	23,000.00						2,093,716.00	12,183,284.00		
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม													
17	โครงการเฝ้าระวังสิ่งแวดล้อมเมือง	200,000.00	-	-	1 ต.ค. 66	30 ก.ย. 67		เฝ้าระวังตรวจคุณภาพน้ำ ในแหล่งน้ำสาธารณะ ในเขตเทศบาล จำนวน 21 จุด		-	200,000.00	✓	
18	โครงการลดโลกร้อนกับนครสุราษฎร์ธานี	200,000.00	-	-	1 ต.ค. 66	30 ก.ย. 67		จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้เพื่อ เพิ่มพื้นที่สีเขียว		121,960.00	78,040.00	✓	
19	โครงการลดขยะต้นทางกับนครสุราษฎร์ธานี	300,000.00	-	-	1 ต.ค. 66	30 ก.ย. 67		ดำเนินกิจกรรมส่งเสริม ลดปริมาณ/คัดแยก ขยะทั่วไป, กิจกรรม ส่งเสริมลดปริมาณ/ คัดแยกขยะรีไซเคิล, กิจกรรมส่งเสริม ลดปริมาณ/คัดแยก ขยะอันตราย, กิจกรรม ส่งเสริมลดปริมาณ/ คัดแยกขยะอินทรีย์		9,400.00	290,600.00	✓	
20	โครงการปรับปรุงสนามเด็กเล่นสวนหลวง ร.9	5,000,000.00	-	-	1 ก.พ. 67	30 ก.ย. 67	✓			-	5,000,000.00		✓
รวม		5,700,000.00	-	-						131,360.00	5,568,640.00		

รายงานผลการดำเนินงานโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
ณ เดือนมีนาคม 2567 (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567)

แบบรายงาน 2.1

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	ระยะเวลาที่กำหนดไว้ ตามแผนดำเนินงาน		สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การดำเนินการตาม แผนการดำเนินงาน	
							ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			เป็นไป ตามที่กำหนด	ไม่เป็นไป ตามที่กำหนด
					วันที่เริ่มต้น	วันที่สิ้นสุด							
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสวัสดิการสังคมและคุณภาพชีวิต													
21	โครงการแม่ลูกพันดี	57,000.00	-	-	1 ต.ค. 66	30 ก.ย. 67		ตรวจพื้นที่หญิงตั้งครรภ์ ที่มาฝากครรภ์ที่ ศูนย์บริการสาธารณสุข ทั้ง 4 ศูนย์ฯ, ตรวจ สุขภาพช่องปากเด็ก อายุ 4 เดือน - 4 ปี		52,860.00	4,140.00	✓	
22	โครงการแข่งขันกีฬาพื้นบ้านชุมชนสัมพันธ์	300,000.00	-	-	1 ธ.ค. 66	31 ม.ค. 67			✓	286,815.00	13,185.00	✓	
23	โครงการเสริมสร้างและพิทักษ์สิทธิสวัสดิการผู้รับเบี้ยยังชีพ	30,000.00	-	-	1 ต.ค. 66	31 มี.ค. 67			✓	29,998.52	1.48	✓	
24	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพเพาะเห็ด และแปรรูปเห็ด (น้ำพริกเห็ด, เห็ดอบกรอบสมุนไพร)/ชุมชนเสรีพล	30,000.00	-	-	1 ก.พ. 67	30 ก.ย. 67		ส่งฎีกาเบิกจ่ายเงิน		30,000.00	-	✓	
25	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพสวนครัวพอเพียงชุมชนเมือง/ชุมชน หนองบัว	30,000.00	-	-	1 ก.พ. 67	30 ก.ย. 67		ส่งฎีกาเบิกจ่ายเงิน		30,000.00	-	✓	
26	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพสร้างสร้งร้านค้างานพื้นผ้าพัฒนา ศักยภาพชุมชน/ชุมชนเสม็ดเรียง	30,000.00	-	-	1 ก.พ. 67	30 ก.ย. 67		ส่งฎีกาเบิกจ่ายเงิน		30,000.00	-	✓	
27	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพพัฒนาอาชีพพื้นผ้าปาเต๊ะ/ ชุมชนเพชรวิไลสำ	30,000.00	-	-	1 ก.พ. 67	30 ก.ย. 67	✓			-	30,000.00	✓	
28	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพปลูกผักสวนครัวและสมุนไพร ในตะกร้าพลาสติก/ชุมชนหัวแหลมพัฒนา	30,000.00	-	-	1 ก.พ. 67	30 ก.ย. 67	✓			-	30,000.00	✓	
29	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพทำผ้า Eco Print ผ้าพิมพ์ลาย จากธรรมชาติ/ชุมชนค่ายวิภาวดีรังสิต	30,000.00	-	-	1 ก.พ. 67	30 ก.ย. 67	✓			-	30,000.00	✓	
30	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการแปรรูปและถนอมอาหาร/ ชุมชนศรีวิชัย	30,000.00	-	-	1 ก.พ. 67	30 ก.ย. 67	✓			-	30,000.00	✓	
31	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการเลี้ยงไก่ไข่/ชุมชนบ้านบางทอง	30,000.00	-	-	1 ก.พ. 67	30 ก.ย. 67	✓			-	30,000.00	✓	
32	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการเลี้ยงไก่ไข่/ชุมชน ร.25 พัน3	30,000.00	-	-	1 ก.พ. 67	30 ก.ย. 67		ส่งฎีกาเบิกจ่ายเงิน		30,000.00	-	✓	
33	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการแพ้นที่ผ้าปาเต๊ะและการปัก เลื่อม/ชุมชนตาปี	30,000.00	-	-	1 ก.พ. 67	30 ก.ย. 67		ส่งฎีกาเบิกจ่ายเงิน		30,000.00	-	✓	
34	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการแพ้นที่ผ้าปาเต๊ะ/ชุมชนวัด ท่าทอง	30,000.00	-	-	1 ก.พ. 67	30 ก.ย. 67	✓			-	30,000.00	✓	

รายงานผลการดำเนินงานโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
ณ เดือนมีนาคม 2567 (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567)

แบบรายงาน 2.1

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	ระยะเวลาที่กำหนดไว้ ตามแผนดำเนินงาน		สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การดำเนินการตาม แผนการดำเนินงาน	
							ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			เป็นไป ตามที่กำหนด	ไม่เป็นไป ตามที่กำหนด
					วันที่เริ่มต้น	วันที่สิ้นสุด							
35	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการแพ้น้ำปาเต๊ะ/ชุมชนกาญจนวิถี ร่วมใจ	30,000.00	-	-	1 ก.พ. 67	30 ก.ย. 67		ส่งฎีกาเบิกจ่ายเงิน		30,000.00	-	✓	
36	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการแพ้น้ำผ้างลายไทย/ชุมชน ลูกเสือถาวรราษฎร์	30,000.00	-	-	1 ก.พ. 67	30 ก.ย. 67		ส่งฎีกาเบิกจ่ายเงิน		30,000.00	-	✓	
37	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการเพิ่มมูลค่าหัตถกรรมและ กระเป๋ากิจสานเคคูพาจ/ชุมชนเมตตาธรรม	30,000.00	-	-	1 ก.พ. 67	30 ก.ย. 67		ส่งฎีกาเบิกจ่ายเงิน		30,000.00	-	✓	
38	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ด้วย ศิลปะเคคูพาจ/ชุมชนวังเพชร	30,000.00	-	-	1 ก.พ. 67	30 ก.ย. 67		ส่งฎีกาเบิกจ่ายเงิน		30,000.00	-	✓	
39	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการสานกระเป๋จากเส้น พลาสติก/ชุมชนเคหะชุมชน	30,000.00	-	-	1 ก.พ. 67	30 ก.ย. 67		ส่งฎีกาเบิกจ่ายเงิน		30,000.00	-	✓	
40	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการสานกระเป๋จากเส้น พลาสติก/ชุมชนวัดหน้าเมือง	30,000.00	-	-	1 ก.พ. 67	30 ก.ย. 67		ส่งฎีกาเบิกจ่ายเงิน		30,000.00	-	✓	
41	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการสานกระเป๋จากเส้น พลาสติก/ชุมชนนาเนียน	30,000.00	-	-	1 ก.พ. 67	30 ก.ย. 67		ส่งฎีกาเบิกจ่ายเงิน		30,000.00	-	✓	
42	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการสานกระเป๋จากเส้น พลาสติก/ชุมชนดงตาล	30,000.00	-	-	1 ก.พ. 67	30 ก.ย. 67		ส่งฎีกาเบิกจ่ายเงิน		30,000.00	-	✓	
43	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการผูกผ้าและทำของชำร่วย/ ชุมชนเสรีไท	30,000.00	-	-	1 ก.พ. 67	30 ก.ย. 67		ส่งฎีกาเบิกจ่ายเงิน		30,000.00	-	✓	
44	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการผูกผ้าตามงานพิธีต่างๆ /ชุมชน ท่าแขก	30,000.00	-	-	1 ก.พ. 67	30 ก.ย. 67		ส่งฎีกาเบิกจ่ายเงิน		30,000.00	-	✓	
45	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการผลิตเครื่องมือประมง พื้นบ้าน(ลอบดักกุ้ง ปลา)/ชุมชนบางกุ้ง	30,000.00	-	-	1 ก.พ. 67	30 ก.ย. 67	✓			-	30,000.00	✓	
46	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการผลิตอาหารและการแปรรูป อาหาร/ชุมชนทุ่งน้อย	30,000.00	-	-	1 ก.พ. 67	30 ก.ย. 67		ส่งฎีกาเบิกจ่ายเงิน		30,000.00	-	✓	
47	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการปักผ้าด้วยมุก, เลื่อมลูกปัด, ข้ออ้อยคริสตัล ลงบนผ้าปาเต๊ะ/ชุมชนสหกรณ์ครู	30,000.00	-	-	1 ก.พ. 67	30 ก.ย. 67		ส่งฎีกาเบิกจ่ายเงิน		30,000.00	-	✓	
48	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการปลูกผักไฮโดรโปนิกส์/ชุมชน เปี่ยมสุข	30,000.00	-	-	1 ก.พ. 67	30 ก.ย. 67		ส่งฎีกาเบิกจ่ายเงิน		30,000.00	-	✓	
49	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการปลูกผักไฮโดรโปนิกส์/ ชุมชนปากน้ำ	30,000.00	-	-	1 ก.พ. 67	30 ก.ย. 67	✓			-	30,000.00	✓	

รายงานผลการดำเนินงานโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
ณ เดือนมีนาคม 2567 (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567)

แบบรายงาน 2.1

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	ระยะเวลาที่กำหนดไว้ ตามแผนดำเนินงาน		สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การดำเนินการตาม แผนการดำเนินงาน	
							ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			เป็นไป ตามที่กำหนด	ไม่เป็นไป ตามที่กำหนด
					วันที่เริ่มต้น	วันที่สิ้นสุด							
50	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการทำโอเครื่องหอม ยาหม่อง น้ำมันเหลือง จากสมุนไพร/ชุมชนบางกุ้ง3	30,000.00	-	-	1 ก.พ. 67	30 ก.ย. 67		ส่งฎีกาเบิกจ่ายเงิน		30,000.00	-	✓	
51	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการทำแหนม ไส้กรอก ปลาต้ม/ ชุมชนบางกุ้ง2	30,000.00	-	-	1 ก.พ. 67	30 ก.ย. 67		ส่งฎีกาเบิกจ่ายเงิน		30,000.00	-	✓	
52	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการทำเหรียญโปรยทาน และ ดอกไม้จันทน์/ชุมชนวัดโพธิ์वास	30,000.00	-	-	1 ก.พ. 67	30 ก.ย. 67	✓			-	30,000.00	✓	
53	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการทำเสื้อและกระโปรงมัดย้อม/ ชุมชนหน้าค่าย อส.	30,000.00	-	-	1 ก.พ. 67	30 ก.ย. 67		ส่งฎีกาเบิกจ่ายเงิน		30,000.00	-	✓	
54	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการทำเครื่องมือประมง ชายฝั่ง/ชุมชนคลองฉนาก	30,000.00	-	-	1 ก.พ. 67	30 ก.ย. 67	✓			-	30,000.00	✓	
55	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการทำอาหารพื้นบ้านและ น้ำพริก/ชุมชนบึงขุนทะเล	30,000.00	-	-	1 ก.พ. 67	30 ก.ย. 67		ส่งฎีกาเบิกจ่ายเงิน		30,000.00	-	✓	
56	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการทำหมกรอบ หมูแดง เป็ดย่าง น้ำผึ้ง/ชุมชนตลาดล่าง	30,000.00	-	-	1 ก.พ. 67	30 ก.ย. 67	✓			-	30,000.00	✓	
57	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการทำสมุนไพรอบไอน้ำเพื่อ สุขภาพ/ชุมชนหน้าศาลากลาง	30,000.00	-	-	1 ก.พ. 67	30 ก.ย. 67		ส่งฎีกาเบิกจ่ายเงิน		30,000.00	-	✓	
58	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการทำผ้ามัดย้อม/ชุมชนแหลมทราย	30,000.00	-	-	1 ก.พ. 67	30 ก.ย. 67		ส่งฎีกาเบิกจ่ายเงิน		30,000.00	-	✓	
59	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการทำผ้ามัดย้อม/ชุมชน เทศบาล	30,000.00	-	-	1 ก.พ. 67	30 ก.ย. 67	✓			-	30,000.00	✓	
60	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการทำผ้ามัดย้อม/ชุมชนหลังคลัง	30,000.00	-	-	1 ก.พ. 67	30 ก.ย. 67	✓			-	30,000.00	✓	
61	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการทำผ้ามัดย้อม/ชุมชนหน้า สนามกีฬา	30,000.00	-	-	1 ก.พ. 67	30 ก.ย. 67	✓			-	30,000.00	✓	
62	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการทำผ้ามัดย้อม/ชุมชนหน้าด่าน	30,000.00	-	-	1 ก.พ. 67	30 ก.ย. 67	✓			-	30,000.00	✓	
63	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการทำผ้ามัดย้อม/ชุมชนสิริสุข	30,000.00	-	-	1 ก.พ. 67	30 ก.ย. 67	✓			-	30,000.00	✓	
64	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการทำผ้ามัดย้อม/ชุมชนรวม เพชรสามัคคี	30,000.00	-	-	1 ก.พ. 67	30 ก.ย. 67		ส่งฎีกาเบิกจ่ายเงิน		30,000.00	-	✓	
65	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการทำผ้ามัดย้อม/ชุมชนย่านยาว	30,000.00	-	-	1 ก.พ. 67	30 ก.ย. 67	✓			-	30,000.00	✓	
66	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการทำผ้ามัดย้อม/ชุมชนตลาดใหม่- ดอนนก	30,000.00	-	-	1 ก.พ. 67	30 ก.ย. 67	✓			-	30,000.00	✓	

รายงานผลการดำเนินงานโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
ณ เดือนมีนาคม 2567 (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567)

แบบรายงาน 2.1

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	ระยะเวลาที่กำหนดไว้ ตามแผนดำเนินงาน		สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การดำเนินการตาม แผนการดำเนินงาน	
							ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			เป็นไป ตามที่กำหนด	ไม่เป็นไป ตามที่กำหนด
					วันที่เริ่มต้น	วันที่สิ้นสุด							
67	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการทำผ้ามัดย้อม/ชุมชนตลาด ดอนนก	30,000.00	-	-	1 ก.พ. 67	30 ก.ย. 67		ชุมชนไม่ประสงค์ รับเงินอุดหนุนเพื่อ ดำเนินโครงการ		-	30,000.00		
68	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการทำผ้ามัดย้อม(ต่อเนื่อง 66)/ ชุมชนสันติสุข	30,000.00	-	-	1 ก.พ. 67	30 ก.ย. 67	✓			-	30,000.00	✓	
69	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการทำผ้ามัดย้อม /ชุมชนวัด กลางใหม่	30,000.00	-	-	1 ก.พ. 67	30 ก.ย. 67	✓			-	30,000.00	✓	
70	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการทำผ้ามัดย้อม /ชุมชน มะขามเตี้ย	30,000.00	-	-	1 ก.พ. 67	30 ก.ย. 67		ส่งฎีกาเบิกจ่ายเงิน		30,000.00	-	✓	
71	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการทำผ้ามัดย้อม (เสื้อ, ผ้าพัน, หมวก)/ชุมชนศรีธานี	30,000.00	-	-	1 ก.พ. 67	30 ก.ย. 67		ส่งฎีกาเบิกจ่ายเงิน		30,000.00	-	✓	
72	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการทำผ้ามัดย้อม (ต่อเนื่อง 66) / ชุมชนบางกุ้ง1	30,000.00	-	-	1 ก.พ. 67	30 ก.ย. 67	✓			-	30,000.00	✓	
73	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการทำผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทย (ยาหม่องสมุนไพร , ลูกประคบ, สบู่สมุนไพร, ยาสระผม สมุนไพร) /ชุมชนฝั่งบางใบไม้	30,000.00	-	-	1 ก.พ. 67	30 ก.ย. 67	✓			-	30,000.00	✓	
74	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการทำน้ำพริกและเครื่องแกงปักษ์ใต้/ ชุมชนโนลิก	30,000.00	-	-	1 ก.พ. 67	30 ก.ย. 67	✓			-	30,000.00	✓	
75	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการทำน้ำพริกกากหมู ไตปลาแห้ง/ ชุมชนตลาดหน้าศูนย์สร้างทาง	30,000.00	-	-	1 ก.พ. 67	30 ก.ย. 67	✓			-	30,000.00	✓	
76	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการทำน้ำพริก (น้ำพริกตาแดง น้ำพริกมันปู ปลาหวาน และกุ้งหวาน) /ชุมชนบ้านบางหลา	30,000.00	-	-	1 ก.พ. 67	30 ก.ย. 67	✓			-	30,000.00	✓	
77	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการทำขนมไทย/ชุมชนราษฎร์บำรุง ดอนนก	30,000.00	-	-	1 ก.พ. 67	30 ก.ย. 67	✓			-	30,000.00	✓	
78	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการทำขนมไทย/ชุมชนท่ากูบ	30,000.00	-	-	1 ก.พ. 67	30 ก.ย. 67		ส่งฎีกาเบิกจ่ายเงิน		30,000.00	-	✓	
79	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการทำขนมไทย/ชุมชนกรม ทหารราบที่ 25	30,000.00	-	-	1 ก.พ. 67	30 ก.ย. 67		ส่งฎีกาเบิกจ่ายเงิน		30,000.00	-	✓	
80	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการทำขนมไทย (ขนมเมืกดขนุน, ขนมทองหยิบ, ขนมเผือกกวน, ขนมถั่วกวน)/ชุมชนหลังอาชีวะ	30,000.00	-	-	1 ก.พ. 67	30 ก.ย. 67	✓			-	30,000.00	✓	

รายงานผลการดำเนินงานโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
ณ เดือนมีนาคม 2567 (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567)

แบบรายงาน 2.1

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	ระยะเวลาที่กำหนดไว้ ตามแผนดำเนินงาน		สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การดำเนินการตาม แผนการดำเนินงาน	
							ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			เป็นไป ตามที่กำหนด	ไม่เป็นไป ตามที่กำหนด
					วันที่เริ่มต้น	วันที่สิ้นสุด							
81	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการทำขนมไทย (ขนมถ้วย, ขนมสาคุไส้หมู, ข้าวต้มมัด, ขนมทองหยิบ, ขนมทองหยอด, ขนมวันกะทิ)/ชุมชนวัดไทร	30,000.00	-	-	1 ก.พ. 67	30 ก.ย. 67		ส่งฎีกาเบิกจ่ายเงิน		30,000.00	-	✓	
82	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการทำขนมเปียะใส่ไข่เค็มลาวา/ชุมชนราษฎร์อุทิศ	30,000.00	-	-	1 ก.พ. 67	30 ก.ย. 67	✓			-	30,000.00	✓	
83	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการทำกระเป๋าคัดไทย กระเป๋าตราดิ แอนด์แมด/ชุมชนโพหวาย	30,000.00	-	-	1 ก.พ. 67	30 ก.ย. 67	✓			-	30,000.00	✓	
84	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการตัดเย็บเสื้อผ้า/ชุมชนบ้านบางใหญ่	30,000.00	-	-	1 ก.พ. 67	30 ก.ย. 67		ส่งฎีกาเบิกจ่ายเงิน		30,000.00	-	✓	
85	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการตัดเย็บเสื้อผ้า ชุดลำลอง/ชุมชนพวงเพชรพัฒนา	30,000.00	-	-	1 ก.พ. 67	30 ก.ย. 67	✓			-	30,000.00	✓	
86	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการตัดเย็บหมวกและกระเป๋า/ชุมชนอ้อมค่ายวิภาวดีรังสิต	30,000.00	-	-	1 ก.พ. 67	30 ก.ย. 67	✓			-	30,000.00	✓	
87	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการตัดเย็บกระเป๋าผ้าและผ้านุ่งปาเต๊ะ/ชุมชนตลาดเกษตร2	30,000.00	-	-	1 ก.พ. 67	30 ก.ย. 67	✓			-	30,000.00	✓	
88	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการซ่อมแซมเครื่องมือประมงชายฝั่ง(ต่อเนื่องปี 66)/ชุมชนหาดตายวง	30,000.00	-	-	1 ก.พ. 67	30 ก.ย. 67	✓			-	30,000.00	✓	
89	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพ Inter Food (อาหารนานาชาติ)/ชุมชนศรีธานี - ยางงาม	30,000.00	-	-	1 ก.พ. 67	30 ก.ย. 67		ส่งฎีกาเบิกจ่ายเงิน		30,000.00	-	✓	
90	โครงการอบรมและพัฒนาศักยภาพแกนนำสุขภาพชุมชน	1,301,600.00	-	-	1 ม.ค. 67	31 พ.ค. 67		ประสานงานกับหน่วยงานองค์กร และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง		-	1,301,600.00	✓	
91	โครงการอบรมด้านสุขาภิบาลสำหรับสถานบริการแต่งผม - เสริมสวยในเขตเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี	80,000.00	-	-	1 พ.ย. 66	31 ม.ค. 67			✓	66,280.00	13,720.00	✓	
92	โครงการอบรมการใช้เทคโนโลยีและเครื่องมือการสื่อสารในยุคปัจจุบัน	50,000.00	-	-	1 ม.ค. 67	31 ม.ค. 67		อยู่ระหว่างกำหนดหลักสูตรและสถานที่ฝึกอบรม		-	50,000.00	✓	
93	โครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยแม่และเด็กของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี	200,000.00	-	-	1 เม.ย. 67	30 มิ.ย. 67	✓			-	200,000.00	✓	

รายงานผลการดำเนินงานโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
ณ เดือนมีนาคม 2567 (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567)

แบบรายงาน 2.1

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	ระยะเวลาที่กำหนดไว้ ตามแผนดำเนินงาน		สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การดำเนินการตาม แผนการดำเนินงาน	
							ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			เป็นไป ตามที่กำหนด	ไม่เป็นไป ตามที่กำหนด
					วันที่เริ่มต้น	วันที่สิ้นสุด							
94	โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการและยกระดับสถานประกอบการจำหน่ายอาหารในเขตเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี	700,000.00	-	-	1 มี.ค. 67	30 เม.ย. 67		ทำหนังสือเชิญผู้ประกอบการเข้าร่วม		-	700,000.00	✓	
95	โครงการส่งเสริมและพัฒนาสวัสดิภาพเด็กและเยาวชน	150,000.00	-	-	1 เม.ย. 67	31 ส.ค. 67	✓			-	150,000.00	✓	
96	โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพเครือข่ายผู้ผลิตผลิตภัณฑ์ชุมชน	42,000.00	-	-	1 ต.ค. 66	30 ก.ย. 67		จัดฝึกอบรมหลักสูตรการยกระดับผลิตภัณฑ์ของผู้ประกอบการให้ความรู้เกี่ยวกับบรรจุภัณฑ์และตราสินค้า		2,075.00	39,925.00	✓	
97	โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพผู้ได้รับเบี้ยยังชีพทุกประเภท	50,000.00	-	-	1 ต.ค. 66	30 เม.ย. 67		จัดซื้อวัสดุสำหรับการจัดอบรม		38,873.00	11,127.00	✓	
98	โครงการส่งเสริมและพัฒนาการยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชนและการเข้าถึงช่องทางจำหน่ายอย่างรู้เท่าทัน	90,000.00	-	-	1 มี.ค. 67	31 ก.ค. 67	✓			-	90,000.00	✓	
99	โครงการส่งเสริมศักยภาพและพัฒนาระบบสวัสดิการสังคม	80,000.00	-	-	1 ธ.ค. 66	30 ก.ย. 67		จัดทำเอกสารส่งใช้เงินยืม		10,550.00	69,450.00	✓	
100	โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตบนพื้นฐานคุณค่าภูมิปัญญาสู่สังคมอายุยืน	200,000.00	-	-	1 มี.ค. 67	30 เม.ย. 67	✓			-	200,000.00	✓	
101	โครงการส่งเสริมการใช้จักรยานเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนในชุมชน	20,000.00	-	-	1 เม.ย. 67	31 ก.ค. 67	✓			-	20,000.00	✓	
102	โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมการดำเนินงานของแกนนำสุขภาพชุมชน	79,200.00	-	-	1 ต.ค. 66	30 ก.ย. 67		ประชุมแกนนำสุขภาพชุมชนประจำเดือน		31,200.00	48,000.00	✓	
103	โครงการสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี	80,000.00	-	-	1 พ.ย. 66	30 ก.ย. 66		อยู่ระหว่างสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์		-	80,000.00	✓	
104	โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการกลุ่มผู้นำสตรีเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี	100,000.00	-	-	1 ต.ค. 66	30 ก.ย. 67		ดำเนินโครงการในวันที่ 31 พ.ค. 2567		7,400.00	92,600.00	✓	

รายงานผลการดำเนินงานโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
ณ เดือนมีนาคม 2567 (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567)

แบบรายงาน 2.1

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	ระยะเวลาที่กำหนดไว้ ตามแผนดำเนินงาน		สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การดำเนินการตาม แผนการดำเนินงาน	
							ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			เป็นไป ตามที่กำหนด	ไม่เป็นไป ตามที่กำหนด
					วันที่เริ่มต้น	วันที่สิ้นสุด							
105	โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี	399,800.00	-	-	1 ต.ค. 66	30 ก.ย. 67		ดำเนินการออกหน่วยฉีดวัคซีนสุนัข/แมวจัดในวัดต่าง ๆ ในเขตเทศบาลและบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าฟรีทุกวัน เวลาราชการ ณ ศูนย์สุขภาพสัตว์ชุมชนเทศบาล		102,936.00	296,864.00	✓	
106	โครงการสตรีต้นแบบในชุมชนผู้ทำหน้าที่มารดาที่สมบูรณ์แบบ	200,000.00	-	-	1 มี.ย. 67	30 ก.ย. 67	✓			-	200,000.00	✓	
107	โครงการศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ (ศพอส.) เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี	250,000.00	-	-	1 ต.ค. 66	30 ก.ย. 67		จัดฝึกอบรมหลักสูตรการส่งเสริมงานประดิษฐ์		87,110.00	162,890.00	✓	
108	โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด To Be Number One (ศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่นในชุมชน/หมู่บ้าน) ของทุกระดม่อมหาญอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี	200,000.00	-	-	1 ก.ค. 67	30 ก.ย. 67	✓			-	200,000.00	✓	
109	โครงการรณรงค์ป้องกันยาเสพติดในชุมชน	80,000.00	-	-	1 มี.ย. 67	30 มี.ย. 67	✓			-	80,000.00	✓	
110	โครงการรณรงค์การควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน ของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ เจ้าฟ้ามหาดจักรีสรินธราฯ สยามบรมราชกุมารี	200,000.00	-	-	1 เม.ย. 67	30 มี.ย. 67	✓			-	200,000.00	✓	
111	โครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายผู้สูงอายุเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี	800,000.00	-	-	1 พ.ย. 66	31 ม.ค. 67			✓	742,585.00	57,415.00		✓
112	โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสวัสดิการสังคม	50,000.00	-	-	1 มี.ค. 67	30 มี.ย. 67	✓			-	50,000.00	✓	
113	โครงการพัฒนาศักยภาพสตรี	900,000.00	-	-	1 ธ.ค. 66	31 ส.ค. 67		จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการและศึกษาเรียนรู้นอกสถานที่ วันที่ 15, 19-22 มี.ค. 2567		834,495.00	65,505.00	✓	

รายงานผลการดำเนินงานโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
ณ เดือนมีนาคม 2567 (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567)

แบบรายงาน 2.1

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	ระยะเวลาที่กำหนดไว้ ตามแผนดำเนินงาน		สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การดำเนินการตาม แผนการดำเนินงาน	
							ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			เป็นไป ตามที่กำหนด	ไม่เป็นไป ตามที่กำหนด
					วันที่เริ่มต้น	วันที่สิ้นสุด							
114	โครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการเครือข่ายชุมชน คณะกรรมการเขตพัฒนาชุมชน คณะกรรมการชุมชนและ องค์กรชุมชนอื่น ๆ	1,350,000.00	-	-	1 ต.ค. 66	30 ก.ย. 67		ประชุมเชิงปฏิบัติการ คณะกรรมการชุมชน		-	1,350,000.00	✓	
115	โครงการพัฒนาระบบสุขภาพในโรงเรียนและชุมชนของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ เจ้าฟ้า มหาดจักรีสิรินธรฯ สยามบรมราชกุมารี	400,000.00	-	-	1 ม.ค. 67	31 ส.ค. 67		จัดกิจกรรมตรวจสอบ ปนเปื้อนในตลาด		86,250.00	313,750.00	✓	
116	โครงการพัฒนาระบบการเรียนรู้เพื่อสร้างชุมชนเข้มแข็งใน การพัฒนาชุมชน	500,000.00	-	-	1 ม.ค. 67	30 ก.ย. 67		สรุปโครงการที่เกิ นศักยภาพชุมชนเพื่อ ดำเนินการในขั้นตอนต่อไป		239,164.00	260,836.00	✓	
117	โครงการฝึกอบรมและศึกษาเรียนรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้นำ เด็กและเยาวชน	500,000.00	-	-	1 ม.ค. 67	31 มี.ค. 67		จัดกิจกรรมฝึกอบรม หลักสูตรการพัฒนา ศักยภาพผู้นำเด็กและ เยาวชนภายใต้แนวคิด การพัฒนาที่ยั่งยืน		344,800.00	155,200.00	✓	
118	โครงการฝึกอบรมและฝึกทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่าย พลเรือน (อปพร.) ประจำปี (หลักสูตรจัดตั้งและหลักสูตร ทบทวน)	400,000.00	-	-	1 ม.ค. 67	31 ก.ค. 67		ขออนุมัติดำเนิน โครงการ		-	400,000.00	✓	
119	โครงการฝึกอบรมซ่อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย	100,000.00	-	-	1 ก.พ. 67	31 ก.ค. 67	✓			-	100,000.00	✓	
120	โครงการปรับปรุงภาวะโภชนาการและสุขภาพเด็กของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ เจ้าฟ้า มหาดจักรีสิรินธรฯ สยามบรมราชกุมารี	200,000.00	-	-	1 ก.ค. 67	30 ก.ย. 67	✓			-	200,000.00	✓	
121	โครงการบันทึกพิกัดแผนที่ทางภูมิศาสตร์ (GPS) ผู้รับเบี้ย ผู้สูงอายุและผู้พิการเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี	25,000.00	-	-	1 เม.ย. 67	31 พ.ค. 67	✓			-	25,000.00	✓	
122	โครงการบริการลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุถึงที่บ้าน (At Home Service : Allowance Registration)	10,000.00	-	-	1 พ.ค. 67	31 ส.ค. 67	✓			-	10,000.00	✓	
123	โครงการบริการทำบัตรประจำตัวคนพิการที่บ้านและส่งเสริม พัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (At Home Service: ID Card Registration for Person with Disabilities)	50,000.00	-	-	1 ต.ค. 66	30 ก.ย. 67		ลงพื้นที่ทำบัตรให้กับคน พิการ		-	50,000.00	✓	

รายงานผลการดำเนินงานโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
ณ เดือนมีนาคม 2567 (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567)

แบบรายงาน 2.1

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	ระยะเวลาที่กำหนดไว้ ตามแผนดำเนินงาน		สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การดำเนินการตาม แผนการดำเนินงาน	
							ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			เป็นไป ตามที่กำหนด	ไม่เป็นไป ตามที่กำหนด
					วันที่เริ่มต้น	วันที่สิ้นสุด							
124	โครงการทำหมันสุนัข/แมวจรจัด ที่อาศัยในวัด 15 วัด และ ชุมชน 70 ชุมชน	200,000.00	-	-	1 พ.ย. 66	31 ส.ค. 67		จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ การแพทย์ และ ดำเนินการออกหน่วย ทำหมันสุนัข/แมวจรจัด 15 วัด โรงเรียน สวนสาธารณะ และ ตามคำร้องเรียน ในชุมชน ต่าง ๆ ในเขตเทศบาล		94,966.00	105,034.00	✓	
125	โครงการตลาดนัด ตลาดน้ำ บ้านดอน	200,000.00	-	-	1 ต.ค. 66	30 ก.ย. 67		ดำเนินโครงการตลอดทั้งปี และการเบิกจ่ายค่าเช่า เครื่องเสียง		61,600.00	138,400.00	✓	
126	โครงการช่วยเหลือประชาชนด้านสาธารณสุข	800,000.00	-	-	1 ต.ค. 66	30 ก.ย. 67		ดำเนินการเมื่อมีเหตุ สาธารณสุข		-	800,000.00	✓	
127	โครงการช่วยลดการติดเอดส์จากแม่สู่ลูกสภากาชาดไทย พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธ นารีนาถ	200,000.00	-	-	1 พ.ค. 67	1 ก.ค. 67	✓			-	200,000.00	✓	
128	โครงการจัดตั้งศูนย์เฉพาะกิจช่วยเหลือผู้ประสบภัยในช่วง เทศกาล	50,000.00	-	-	1 ธ.ค. 66	30 เม.ย. 67		จัดตั้งศูนย์ร่วมเฉพาะกิจ และช่วยเหลือผู้ประสบภัย ในช่วงสงกรานต์ 2567 อีก 1 ครั้ง		3,830.00	46,170.00	✓	
129	โครงการขับเคลื่อนกิจกรรมสภาเด็กและเยาวชนเทศบาลนคร สุราษฎร์ธานี	40,000.00	-	-	1 ต.ค. 66	30 ก.ย. 67		เตรียมเอกสารเพื่อประชุม กรรมการสภาเด็กและ เยาวชนตามไตรมาส		4,200.00	35,800.00	✓	
130	โครงการก่อสร้างสถานีดับเพลิงหน่วยย่อย (สวนหลวง ร.9)	4,500,000.00	-	-	1 ธ.ค. 66	30 ก.ย. 67	✓			-	4,500,000.00		✓
131	โครงการก่อสร้างศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี (ปทุมพร)	27,500,000.00	-	-	1 ต.ค. 66	30 ก.ย. 67		คณะกรรมการกำหนด ราคากลางและจัดทำ รูปแบบรายการ		-	27,500,000.00	✓	
รวม		45,694,600.00	-	-						4,087,987.52	41,606,612.48		

รายงานผลการดำเนินงานโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
ณ เดือนมีนาคม 2567 (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567)

แบบรายงาน 2.1

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	ระยะเวลาที่กำหนดไว้ ตามแผนดำเนินงาน		สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การดำเนินการตาม แผนการดำเนินงาน	
							ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			เป็นไป ตามที่กำหนด	ไม่เป็นไป ตามที่กำหนด
					วันที่เริ่มต้น	วันที่สิ้นสุด							
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา การกีฬา ศาสนา ประเพณีและวัฒนธรรม													
132	โครงการเข้าร่วมงานชุมนุมของลูกเสือท้องถิ่นไทย	80,000.00	-	-	1 ต.ค. 66	30 ก.ย. 67	✓			-	80,000.00		✓
133	โครงการอุดหนุนค่าอาหารกลางวันสำหรับโรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี	7,700,000.00	-	-	1 ต.ค. 66	30 ก.ย. 67		ขออนุมัติเบิกจ่าย		3,830,200.00	3,869,800.00	✓	
134	โครงการอุดหนุนค่าอาหารกลางวันสำหรับโรงเรียนวัดโพธิ์นิมิต	1,408,000.00	-	-	1 ต.ค. 66	30 ก.ย. 67		ขออนุมัติเบิกจ่าย		644,600.00	763,400.00	✓	
135	โครงการอุดหนุนค่าอาหารกลางวันสำหรับโรงเรียนวัดท่าทอง	1,144,000.00	-	-	1 ต.ค. 66	30 ก.ย. 67		ขออนุมัติเบิกจ่าย		567,600.00	576,400.00	✓	
136	โครงการอุดหนุนค่าอาหารกลางวันสำหรับโรงเรียนวัดกลางใหม่	1,012,000.00	-	-	1 ต.ค. 66	30 ก.ย. 67		ขออนุมัติเบิกจ่าย		418,000.00	594,000.00	✓	
137	โครงการอุดหนุนค่าอาหารกลางวันสำหรับโรงเรียนบ้านโพหวาย	1,540,000.00	-	-	1 ต.ค. 66	30 ก.ย. 67		ขออนุมัติเบิกจ่าย		644,600.00	895,400.00	✓	
138	โครงการอุดหนุนค่าอาหารกลางวันสำหรับโรงเรียนบ้านสุขน	528,000.00	-	-	1 ต.ค. 66	30 ก.ย. 67		ขออนุมัติเบิกจ่าย		268,800.00	259,200.00	✓	
139	โครงการอุดหนุนค่าอาหารกลางวันสำหรับโรงเรียนบ้านสันติสุข	616,000.00	-	-	1 ต.ค. 66	30 ก.ย. 67		ขออนุมัติเบิกจ่าย		279,400.00	336,600.00	✓	
140	โครงการอุดหนุนค่าอาหารกลางวันสำหรับโรงเรียนบ้านบางใหญ่	968,000.00	-	-	1 ต.ค. 66	30 ก.ย. 67		ขออนุมัติเบิกจ่าย		517,000.00	451,000.00	✓	
141	โครงการอบรมผู้นำนักเรียน	50,000.00	-	-	1 พ.ย. 66	29 ก.พ. 67			✓	49,365.00	635.00	✓	
142	โครงการอบรมการผลิตและใช้สื่อการเรียนการสอน	80,000.00	30,000.00	-	1 ต.ค. 66	31 ธ.ค. 66			✓	104,502.00	5,498.00		✓
143	โครงการห้องสมุดเคลื่อนที่	100,000.00	-	-	1 ต.ค. 66	30 ก.ย. 67		จัดกิจกรรมออกหน่วยตามโรงเรียน		-	100,000.00	✓	
144	โครงการส่งเสริมและส่งเสริมเข้าร่วมการแข่งขันเรือพาย	50,000.00	-	-	1 ต.ค. 66	30 ก.ย. 67		ส่งทีมเข้าร่วมแข่งขันตามหนังสือเชิญ		-	50,000.00	✓	
145	โครงการส่งเสริมและพัฒนาหอสมุดเฉลิมพระเกียรติฯ	250,000.00	-	-	1 ต.ค. 66	30 ก.ย. 67		สรุปรายการหนังสือเพื่อจัดซื้อ		-	250,000.00	✓	
146	โครงการส่งเสริมธุรการชั้นเรียนหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน	300,000.00	-	-	1 ธ.ค. 66	31 พ.ค. 67		เบิกจ่ายค่าจัดทำเอกสารธุรการชั้นเรียนสำหรับโรงเรียนในสังกัด		215,650.00	84,350.00	✓	
147	โครงการส่งเสริมกิจกรรมทางศาสนาและภูมิปัญญาท้องถิ่น	5,000.00	-	5,000.00	1 ม.ค. 67	30 ก.ย. 67		ยกเลิกโครงการเนื่องจากโครงการดังกล่าวตั้งไว้เพื่อสนับสนุนจังหวัด จังหวัดไม่ได้ดำเนินการ		-	-		

รายงานผลการดำเนินงานโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
ณ เดือนมีนาคม 2567 (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567)

แบบรายงาน 2.1

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	ระยะเวลาที่กำหนดไว้ ตามแผนดำเนินงาน		สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การดำเนินการตาม แผนการดำเนินงาน	
							ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			เป็นไป ตามที่กำหนด	ไม่เป็นไป ตามที่กำหนด
					วันที่เริ่มต้น	วันที่สิ้นสุด							
148	โครงการส่งเสริมโรงเรียนกีฬาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีเข้าร่วมแข่งขันรายการต่าง ๆ	300,000.00	-	-	1 ต.ค. 66	30 ก.ย. 67		ส่งเสริมเข้าร่วมแข่งขันตามหนังสือเชิญ			300,000.00	✓	
149	โครงการส่งเสริมเข้าร่วมแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย ระดับภาค และระดับประเทศ	5,000,000.00	-	-	1 ม.ค. 67	30 ก.ย. 67	✓			-	5,000,000.00		✓
150	โครงการส่งเสริมกีฬา และกิจกรรมนันทนาการ ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีเข้าร่วมแข่งขันกับหน่วยงานอื่นๆ	200,000.00	-	-	1 ต.ค. 66	30 ก.ย. 67		ส่งเสริมเข้าร่วมแข่งขันตามหนังสือเชิญ		55,630.00	144,370.00	✓	
151	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษา และการให้ความช่วยเหลือนักเรียน	700,000.00	-	-	1 ธ.ค. 66	30 ก.ย. 67		ดำเนินการเสนอประกาศ		-	700,000.00	✓	
152	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (งานระดับมัธยม)	48,555,700.00	-	700,000.00	1 ต.ค. 66	30 ก.ย. 67		งานโรงเรียนอยู่ระหว่างขั้นตอนอนุมัติเบิกจ่าย, งานนิเทศก์ โอนไปตั้งจ่ายที่สถานศึกษา ไตรมาส 3, งานกิจการนักเรียน รร.กีฬาพน.สฎ. บันทึกขออนุมัติเบิกจ่าย		17,006,373.50	30,849,326.50	✓	
153	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (งานระดับก่อนวัยเรียน-ประถม)	30,807,100.00	-	-	1 ต.ค. 66	30 ก.ย. 67		งานโรงเรียนอยู่ระหว่างขั้นตอนขออนุมัติเบิกจ่าย, งานนิเทศก์ โอนไปตั้งจ่ายที่สถานศึกษา ไตรมาส 3, งานนอกระบบอยู่ระหว่างเบิกจ่ายเป็นงวด		15,302,690.00	15,504,410.00	✓	
154	โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชน	100,000.00	-	-	1 พ.ค. 67	31 ส.ค. 67	✓			-	100,000.00	✓	
155	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารประชาชนถุมิต 2	1,429,600.00	-	-	1 ม.ค. 67	31 พ.ค. 67		จัดทำรูปแบบรายการก่อสร้าง		-	1,429,600.00	✓	

รายงานผลการดำเนินงานโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
ณ เดือนมีนาคม 2567 (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567)

แบบรายงาน 2.1

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	ระยะเวลาที่กำหนดไว้ ตามแผนดำเนินงาน		สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การดำเนินการตาม แผนการดำเนินงาน	
							ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			เป็นไป ตามที่กำหนด	ไม่เป็นไป ตามที่กำหนด
					วันที่เริ่มต้น	วันที่สิ้นสุด							
156	โครงการประเมินผลนักเรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน	900,000.00	-	-	1 ต.ค. 66	30 ก.ย. 67		รอเบิกวัสดุทำข้อสอบ ระหว่างภาค 1/67		578,722.00	321,278.00	✓	
157	โครงการประเมินคุณภาพการจัดการศึกษา	200,000.00	-	-	1 ต.ค. 66	30 ก.ย. 67		เก็บข้อมูลระดับ โรงเรียน		-	200,000.00	✓	
158	โครงการประชุมคณะกรรมการประสานงานวิชาการการจัด การศึกษาท้องถิ่นระดับเทศบาล	80,000.00	-	-	1 ม.ค. 67	31 ส.ค. 67	✓			-	80,000.00		✓
159	โครงการประชาสัมพันธ์การจัดการศึกษาของเทศบาล นครสุราษฎร์ธานี	1,000,000.00	-	-	1 ต.ค. 66	30 ก.ย. 67		เตรียมคัดเลือกตัวแทน นักเรียนเข้าร่วมแข่งขัน วิชาการระดับภาคใต้		76,215.00	923,785.00	✓	
160	โครงการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา	80,000.00	-	72,100.00	1 ม.ค. 67	30 ก.ย. 67	✓			-	7,900.00		✓
161	โครงการจัดแข่งขันกีฬานักเรียนอนุบาล	200,000.00	-	-	1 ม.ค. 67	30 ก.ย. 67	✓			-	200,000.00		✓
162	โครงการจัดอบรมเด็กและเยาวชนภาคฤดูร้อน	500,000.00	-	-	1 ม.ค. 67	30 มิ.ย. 67		อบรมเด็กและเยาวชน ระหว่างวันที่ 1 เม.ย. - 8 พ.ค. 2567		-	500,000.00		✓
163	โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์	650,000.00	-	-	1 เม.ย. 67	30 เม.ย. 67	✓			-	650,000.00	✓	
164	โครงการจัดงานประเพณีวันขึ้นปีใหม่	250,000.00	-	6,000.00	1 ธ.ค. 66	31 ม.ค. 67			✓	241,760.00	2,240.00	✓	
165	โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง	1,700,000.00	-	-	1 พ.ย. 66	30 พ.ย. 66			✓	1,686,101.50	13,898.50	✓	
166	โครงการจัดงานประเพณีชักพระ-ทอดผ้าป่าและแข่งเรือยาว	7,000,000.00	-	42,000.00	1 ต.ค. 66	30 พ.ย. 66			✓	5,685,848.00	1,272,152.00	✓	
167	โครงการจัดงาน/กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ/เทิดพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรม ราชินีและพระบรมวงศานุวงศ์	300,000.00	-	-	1 ต.ค. 66	30 ก.ย. 67		จัดกิจกรรมวันสำคัญ ต่าง ๆ ภายใน ปีงบประมาณ		220,380.00	79,620.00	✓	
168	โครงการจัดกิจกรรมฉลองวันเด็กแห่งชาติ	350,000.00	-	-	1 ต.ค. 66	29 ก.พ. 67			✓	350,000.00	-	✓	
169	โครงการจัดการแข่งขันกีฬานักเรียน เยาวชนและประชาชน	800,000.00	-	-	1 ม.ค. 67	30 ก.ย. 67	✓			-	800,000.00		✓
170	โครงการจัดการแข่งขันกรีฑาโรงเรียนในสังกัดเทศบาล นครสุราษฎร์ธานี	300,000.00	-	-	1 ม.ค. 67	30 ก.ย. 67	✓			-	300,000.00		✓
171	โครงการก่อสร้างอาคารเรียน ค.ส.ล. 4 ชั้น 12 ห้อง	15,000,000.00	-	-	1 ม.ค. 67	30 ก.ย. 67		จัดทำรูปแบบรายการ ก่อสร้าง		-	15,000,000.00	✓	
172	โครงการก่อสร้างหลังคาคลุมลานอเนกประสงค์ (หลังที่ 3) โรงเรียน เทศบาล 4 (วัดโพธาราม)	4,130,000.00	-	-	1 ม.ค. 67	31 ก.ค. 67		จัดทำรูปแบบรายการ ก่อสร้าง		-	4,130,000.00	✓	
173	โครงการก่อสร้างลานจอดรถ	1,640,500.00	-	-	1 ม.ค. 67	31 พ.ค. 67		จัดทำรูปแบบรายการ ก่อสร้าง		-	1,640,500.00	✓	

รายงานผลการดำเนินงานโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
ณ เดือนมีนาคม 2567 (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567)

แบบรายงาน 2.1

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	ระยะเวลาที่กำหนดไว้ ตามแผนดำเนินงาน		สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การดำเนินการตาม แผนการดำเนินงาน	
							ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			เป็นไป ตามที่กำหนด	ไม่เป็นไป ตามที่กำหนด
					วันที่เริ่มต้น	วันที่สิ้นสุด							
174	โครงการอุดหนุนมูลนิธิมิตาจิตธรรมสถาน	100,000.00	-	-	1 ต.ค. 66	31 ต.ค. 66			✓	100,000.00	-	✓	
175	โครงการอุดหนุนมูลนิธิกุศลศรัทธา	100,000.00	-	-	1 ต.ค. 66	31 ต.ค. 66			✓	100,000.00	-	✓	
176	โครงการอุดหนุนมัสยิดอีคอมะตุลอิสลาม (บ้านปากน้ำ)	400,000.00	-	-	1 เม.ย. 67	30 ก.ย. 67	✓			-	400,000.00	✓	
177	โครงการจ้างออกแบบเสาประติมากรรมคุณธรรม	60,000.00	-	-	1 ต.ค. 66	29 ก.พ. 67	✓			-	60,000.00		✓
รวม		138,663,900.00	30,000.00	825,100.00						48,943,437.00	88,925,363.00		
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี													
178	โครงการให้ความรู้ด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องในชีวิตประจำวัน	80,000.00	-	-	1 เม.ย. 67	30 มิ.ย. 67	✓			-	80,000.00	✓	
179	โครงการเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีพบชุมชน	400,000.00	-	-	1 ม.ค. 67	30 ก.ย. 67		ขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง		90,000.00	310,000.00	✓	
180	โครงการเชื่อมต่อโปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินกับ สำนักงานทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี	100,000.00	-	-	1 ต.ค. 66	30 ก.ย. 67	✓			-	100,000.00		✓
181	โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในองค์กร ด้านการจัดการ ขยะมูลฝอยแบบบูรณาการ	530,000.00	-	-	1 มิ.ย. 67	31 ก.ค. 67	✓			-	530,000.00	✓	
182	โครงการปรับปรุงและสำรวจข้อมูลการจัดทำแผนที่ภาษีและ ทะเบียนทรัพย์สิน	300,000.00	-	-	1 ต.ค. 66	30 ก.ย. 67	✓			-	300,000.00		✓
183	โครงการประชาสัมพันธ์การชำระภาษีท้องถิ่น	200,000.00	-	-	1 ต.ค. 66	30 ก.ย. 67		จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ และสื่อประชาสัมพันธ์ ทุกช่องทาง		12,000.00	188,000.00	✓	
184	โครงการประกวดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหาร จัดการที่ดี	40,000.00	-	-	1 ม.ค. 67	30 ก.ย. 67		รวบรวมเอกสาร ส่งเข้าประกวด		-	40,000.00	✓	
185	โครงการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนคร สุราษฎร์ธานี	30,000.00	-	-	1 ต.ค. 66	30 ก.ย. 67		ติดตามผลการเบิกจ่าย งบประมาณและ ผลการดำเนินโครงการ ประจำเดือน มี.ค. 2567		20,300.00	9,700.00	✓	
186	โครงการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น และเพิ่มเติม/ เปลี่ยนแปลง	350,000.00	-	15,000.00	1 ต.ค. 66	30 ก.ย. 67		จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.256-2570) เพิ่มเติม/ เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2567		83,283.00	251,717.00	✓	

รายงานผลการดำเนินงานโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
ณ เดือนมีนาคม 2567 (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567)

แบบรายงาน 2.1

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	ระยะเวลาที่กำหนดไว้ ตามแผนดำเนินงาน		สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การดำเนินการตาม แผนการดำเนินงาน	
							ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			เป็นไป ตามที่กำหนด	ไม่เป็นไป ตามที่กำหนด
					วันที่เริ่มต้น	วันที่สิ้นสุด							
187	โครงการจัดทำแผนการดำเนินงานประจำปีและเพิ่มเติม/ เปลี่ยนแปลง/แก้ไข	70,000.00	-	-	1 ต.ค. 66	30 ก.ย. 67		จัดทำแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2567)		30,015.00	39,985.00	✓	
188	โครงการจัดกิจกรรมการให้บริการสาธารณะเชิงบูรณาการเนื่องใน วันเทศบาล	80,000.00	-	-	1 เม.ย. 67	30 เม.ย. 67	✓			-	80,000.00	✓	
189	โครงการจัดกิจกรรมการให้บริการสาธารณะเชิงบูรณาการ เนื่องในวันท้องถิ่นไทย "18 มีนา วันท้องถิ่นไทย	10,000.00	-	-	1 มี.ค. 67	31 มี.ค. 67	✓			-	10,000.00	✓	
190	โครงการก่อสร้างป้ายประชาสัมพันธ์ ชนิดโครงสร้างเหล็ก บริเวณสี่แยกเทศบาล	500,000.00	-	-	1 ต.ค. 66	31 มี.ค. 67		อยู่ระหว่างการ ออกแบบ		-	500,000.00	✓	
191	โครงการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนคร สุราษฎร์ธานี (จ้างที่ปรึกษา)	250,000.00	-	-	1 ต.ค. 66	30 ก.ย. 67		ขออนุมัติจัดจ้างที่ปรึกษา เพื่อประเมินผลการ ดำเนินงานตาม แผนพัฒนาของเทศบาลฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567		-	250,000.00	✓	
รวม		2,940,000.00	-	15,000.00						235,598.00	2,689,402.00		
รวมทุกยุทธศาสตร์		207,684,770.00	1,030,000.00	1,928,100.00						55,784,391.49	151,002,278.51		

รายงานผลการดำเนินงานโครงการที่จ่ายจากเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

ณ เดือนมีนาคม 2567 (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567)

แบบรายงาน 2.2

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาที่กำหนดไว้ตามแผน ดำเนินงาน		สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การดำเนินการตาม แผนการดำเนินงาน	
			วันที่เริ่มต้น	วันที่สิ้นสุด	ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			เป็นไป ตามที่กำหนด	ไม่เป็นไป ตามที่กำหนด
1.ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน											
1	โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติก คอนกรีตถนนสันติสุข	1,163,000.00	1 ธ.ค. 66	29 ก.พ. 67		จัดทำราคากลาง		-	1,163,000.00	✓	
2	โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติก คอนกรีตถนนสันติสุข แยกขวา 1	3,255,000.00	1 ธ.ค. 66	29 ก.พ. 67		จัดทำราคากลาง		-	3,255,000.00	✓	
3	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจร ถนนสันติสุข	8,905,000.00	1 ก.พ. 67	31 มี.ค. 67	✓			-	8,905,000.00	✓	
4	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจร ซอยข้าง หจก. ดีเอิร์ธทรานสปอร์ต	2,000,000.00	1 ก.พ. 67	31 มี.ค. 67	✓			-	2,000,000.00	✓	
5	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจร ถนนเสม็ดเรียง 22	2,328,000.00	1 ก.พ. 67	31 มี.ค. 67	✓			-	2,328,000.00	✓	
6	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจร ถนนตลาดล่าง 18	947,000.00	1 ก.พ. 67	31 มี.ค. 67	✓			-	947,000.00	✓	
7	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจร ถนนสุขน 1 ซอย 3	495,000.00	1 ก.พ. 67	31 มี.ค. 67	✓			-	495,000.00	✓	
8	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจร ถนนสุขน 1 ซอยสุทธิรักษ์	8,070,000.00	1 ก.พ. 67	31 มี.ค. 67	✓			-	8,070,000.00	✓	
9	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจร ถนนเสม็ดเรียง 4	3,490,000.00	1 ก.พ. 67	31 มี.ค. 67	✓			-	3,490,000.00	✓	
10	โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติก คอนกรีตถนนยางงาม 2/1 เชื่อมถนนกาญจนาภิเษก 7	1,980,000.00	1 ม.ค. 67	31 มี.ค. 67	✓			-	1,980,000.00		✓
11	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจร ถนนวัดโพธิ์ 2 (ซอยสบ้า ตอน 2)	1,200,000.00	1 ส.ค. 67	31 ธ.ค. 67	✓			-	1,200,000.00	✓	

รายงานผลการดำเนินงานโครงการที่จ่ายจากเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

ณ เดือนมีนาคม 2567 (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567)

แบบรายงาน 2.2

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาที่กำหนดไว้ตามแผน ดำเนินงาน		สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การดำเนินการตาม แผนการดำเนินงาน	
			วันที่เริ่มต้น	วันที่สิ้นสุด	ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			เป็นไป ตามที่กำหนด	ไม่เป็นไป ตามที่กำหนด
12	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจร ถนนตลาดใหม่ 21	1,250,000.00	1 ส.ค. 67	31 ธ.ค. 67	✓			-	1,250,000.00	✓	
13	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจร ถนนลูกเสือ 3	749,000.00	1 ส.ค. 67	31 ธ.ค. 67	✓			-	749,000.00	✓	
14	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจร ถนนบางกุ้ง 1 ตอน 2	2,555,000.00	1 ส.ค. 67	31 ธ.ค. 67	✓			-	2,555,000.00	✓	
15	โครงการปรับปรุงระบบระบายน้ำและทางเท้า ถนนตลาดล่าง 1,3,5,5/1,7	2,896,000.00	1 มิ.ย. 67	31 ต.ค. 67	✓			-	2,896,000.00	✓	
16	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจร ถนนวัดโพธิ์ 28/1 ตอน 2	645,000.00	1 มิ.ย. 67	31 ต.ค. 67	✓			-	645,000.00	✓	
17	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจร ถนนโกลกรัฐ 28 แยกซ้าย 2	557,000.00	1 มิ.ย. 67	31 ต.ค. 67	✓			-	557,000.00	✓	
18	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจร ถนนศรีสวัสดิ์ 2/1	2,820,000.00	1 มิ.ย. 67	30 พ.ย. 67	✓			-	2,820,000.00	✓	
19	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจร ถนนปากน้ำ 3/1 (อุสมจิตรแทรกเตอร์)	386,000.00	1 ก.ค. 67	30 พ.ย. 67	✓			-	386,000.00	✓	
20	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจร ถนนพ่อบุญทะเล 13 แยกขวา 1,2,3,4	3,510,000.00	1 ก.ค. 67	30 พ.ย. 67	✓			-	3,510,000.00	✓	
21	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจร ถนนศรีเกษม ขยายข้างอุรุยุทธเซอร์วิส	2,500,000.00	1 ก.ค. 67	30 พ.ย. 67	✓			-	2,500,000.00	✓	
22	โครงการปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้าเป็นเคเบิล ใต้ดินบริเวณถนนบ้านดอน	19,800,778.00	1 มี.ค. 67	30 ก.ย. 68	✓			-	19,800,778.00	✓	
23	โครงการปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้าเป็นเคเบิล ใต้ดินบริเวณถนนการุณราษฎร์	70,998,138.00	1 มี.ค. 67	30 ก.ย. 68	✓			-	70,998,138.00	✓	

รายงานผลการดำเนินงานโครงการที่จ่ายจากเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

ณ เดือนมีนาคม 2567 (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567)

แบบรายงาน 2.2

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาที่กำหนดไว้ตามแผน ดำเนินงาน		สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การดำเนินการตาม แผนการดำเนินงาน	
			วันที่เริ่มต้น	วันที่สิ้นสุด	ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			เป็นไป ตามที่กำหนด	ไม่เป็นไป ตามที่กำหนด
24	โครงการปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้าเป็นเคเบิลใต้ดินบริเวณถนนศรีวิชัย	184,347,732.00	1 มี.ค. 67	30 ก.ย. 68	✓			-	184,347,732.00	✓	
25	โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีตถนนชนเกษม 38	925,000.00	1 มี.ค. 67	31 พ.ค. 67	✓			-	925,000.00	✓	
26	โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีตถนนชนเกษม 38 ซอย 1,2	864,000.00	1 มี.ค. 67	31 พ.ค. 67	✓			-	864,000.00	✓	
27	โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีตถนนกาญจนาวิถี 16 ซอย 3	376,000.00	1 มี.ค. 67	31 พ.ค. 67	✓			-	376,000.00	✓	
28	โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีตถนนกาญจนาวิถี 16 ซอย 5	669,000.00	1 มี.ค. 67	31 พ.ค. 67	✓			-	669,000.00	✓	
29	โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีตถนนกาญจนาวิถี 16 ซอย 7	646,000.00	1 มี.ค. 67	31 พ.ค. 67	✓			-	646,000.00	✓	
30	โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีตถนนกาญจนาวิถี 16 ซอย 9	1,518,000.00	1 มี.ค. 67	31 พ.ค. 67	✓			-	1,518,000.00	✓	
31	โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีตถนนกาญจนาวิถี 16 ซอยพันธุธนา	369,000.00	1 มี.ค. 67	31 พ.ค. 67	✓			-	369,000.00	✓	
32	โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีตถนนกาญจนาวิถี 16 ซอยพันธุธน์	211,000.00	1 มี.ค. 67	31 พ.ค. 67	✓			-	211,000.00	✓	
รวม		332,425,648.00						-	332,425,648.00		
รวมทุกยุทธศาสตร์		332,425,648.00						-	332,425,648.00		

บัญชีรายละเอียด
ผลการดำเนินโครงการที่จ่ายจากเงินสะสม



สรุปผลการดำเนินโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566
ที่ขออนุมัติกันเงินไว้ (ที่ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ)
ณ เดือนมีนาคม 2567 (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567)

จำนวนโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566 ที่ขออนุมัติกันเงินไว้ และยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ มีทั้งหมด 77 โครงการ
งบประมาณ 149,312,519 บาท (หนึ่งร้อยสี่สิบเก้าล้านสามแสนหนึ่งหมื่นสองพันห้าร้อยสิบเก้าบาทถ้วน) มีรายละเอียดผลการดำเนินงาน ดังนี้

1. โครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ที่ขออนุมัติกันเงินไว้ มีโครงการที่ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ จำนวน 1 โครงการ งบประมาณที่กันเงินไว้ 23,900,000 บาท													
ยุทธศาสตร์	รวมทั้งสิ้น			ดำเนินการเสร็จสิ้น			ระหว่างดำเนินการ			ยังไม่ดำเนินการ		โครงการที่ยกเลิก	
	โครงการ	งบประมาณที่กันเงินไว้	งบประมาณที่เบิกจ่าย	โครงการ	งบประมาณที่กันเงินไว้	งบประมาณที่เบิกจ่าย	โครงการ	งบประมาณที่กันเงินไว้	งบประมาณที่เบิกจ่าย	โครงการ	งบประมาณที่กันเงินไว้	โครงการ	งบประมาณที่กันเงินไว้
6. ด้านการบริหารจัดการที่ดี	1	23,900,000.00	11,950,000.00	-	-	-	1	23,900,000.00	11,950,000.00	-	-	-	-
รวม	1	23,900,000.00	11,950,000.00	-	-	-	1	23,900,000.00	11,950,000.00	-	-	-	-
คิดเป็นร้อยละ		100.00		0.00			100.00			0.00		0.00	
2. โครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ที่ขออนุมัติกันเงินไว้ มีโครงการที่ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ จำนวน 28 โครงการ งบประมาณที่กันเงินไว้ 39,787,000 บาท													
ยุทธศาสตร์	รวมทั้งสิ้น			ดำเนินการเสร็จสิ้น			ระหว่างดำเนินการ			ยังไม่ดำเนินการ		โครงการที่ยกเลิก	
	โครงการ	งบประมาณที่กันเงินไว้	งบประมาณที่เบิกจ่าย	โครงการ	งบประมาณที่กันเงินไว้	งบประมาณที่เบิกจ่าย	โครงการ	งบประมาณที่กันเงินไว้	งบประมาณที่เบิกจ่าย	โครงการ	งบประมาณที่กันเงินไว้	โครงการ	งบประมาณที่กันเงินไว้
1. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน	26	34,252,000.00	6,209,269.00	14	10,007,000.00	6,209,269.00	12	24,245,000.00	-	-	-	-	-
5. ด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น	2	5,535,000.00	4,295,609.00	2	5,535,000.00	4,295,609.00	-	-	-	-	-	-	-
รวม	28	39,787,000.00	10,504,878.00	16	15,542,000.00	10,504,878.00	12	24,245,000.00	-	-	-	-	-
คิดเป็นร้อยละ		100.00		57.14			42.86			0.00		0.00	

สรุปผลการดำเนินโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

ที่ขออนุมัติกันเงินไว้ (ที่ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ)

ณ เดือนมีนาคม 2567 (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567)

3. โครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ที่ขออนุมัติกันเงินไว้ มีโครงการที่ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ จำนวน 48 โครงการ งบประมาณที่กันเงินไว้ 85,625,519 บาท

ยุทธศาสตร์	รวมทั้งสิ้น			ดำเนินการเสร็จสิ้น			ระหว่างดำเนินการ			ยังไม่ดำเนินการ		โครงการที่ยกเลิก	
	โครงการ	งบประมาณที่กันเงินไว้	งบประมาณที่เบิกจ่าย	โครงการ	งบประมาณที่กันเงินไว้	งบประมาณที่เบิกจ่าย	โครงการ	งบประมาณที่กันเงินไว้	งบประมาณที่เบิกจ่าย	โครงการ	งบประมาณที่กันเงินไว้	โครงการ	งบประมาณที่กันเงินไว้
1. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน	36	70,518,519.00	992,700.00	4	2,783,000.00	2,570,944.11	30	61,262,519.00	500,000.00	-	-	2	6,473,000.00
3. ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	1	500,000.00	-	-	-	-	1	500,000.00	-	-	-	-	-
4. ด้านสวัสดิการสังคมและคุณภาพชีวิต	2	5,158,000.00	-	-	-	-	2	5,158,000.00	-	-	-	-	-
5. ด้านการศึกษา การกีฬา ศาสนา ประเพณีและวัฒนธรรม	6	7,849,000.00	398,000.00	2	627,000.00	398,000.00	4	7,222,000.00	-	-	-	-	-
6. ด้านการบริหารจัดการที่ดี	3	1,600,000.00	250,000.00	1	250,000.00	250,000.00	2	1,350,000.00	-	-	-	-	-
รวม	48	85,625,519.00	1,640,700.00	7	3,660,000.00	3,218,944.11	39	75,492,519.00	500,000.00	-	-	2	6,473,000.00
คิดเป็นร้อยละ		100.00			14.58			81.25		0.00			4.17
รวม	77	149,312,519.00	24,095,578.00	23	19,202,000.00	13,723,822.11	52	123,637,519.00	12,450,000.00	-	-	2	6,473,000.00
คิดเป็นร้อยละ		100.00			29.87			67.53		0.00			2.60

รายงานผลการดำเนินงานโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ที่ขออนุมัติกันเงินไว้ (ที่ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ) ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ณ เดือนมีนาคม 2567 (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567)												
ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณ ตามเทศ (บาท)	งบประมาณ ที่กันเงิน (บาท)	ระยะเวลาที่กำหนดไว้ตาม แผนดำเนินงาน		สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การดำเนินการตาม แผนการดำเนินงาน	
				วันที่เริ่มต้น	วันที่สิ้นสุด	ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			เป็นไป ตามที่กำหนด	ไม่เป็นไป ตามที่กำหนด
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี												
1	โครงการก่อสร้างศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลนคร สุราษฎร์ธานี (สวนหลวง ร. 9)	25,000,000.00	23,900,000.00	1 ต.ค. 64	30 ก.ย. 65		อยู่ระหว่างก่อสร้าง เบิกจ่าย งวดที่ 3 และงวดที่ 4		11,950,000.00	11,950,000.00		✓
รวม		25,000,000.00	23,900,000.00						11,950,000.00	11,950,000.00		
รวมทุกยุทธศาสตร์		25,000,000.00	23,900,000.00						11,950,000.00	11,950,000.00		

รายงานผลการดำเนินงานโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ที่ขออนุมัติกันเงินไว้ (ที่ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ) ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

ณ เดือนมีนาคม 2567 (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567)

ลำดับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณ ตามเทศบัญญัติ (บาท)	งบประมาณ ที่กันเงิน (บาท)	ระยะเวลาที่กำหนดไว้ตาม แผนดำเนินงาน		สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การดำเนินการตาม แผนการดำเนินงาน	
					วันที่เริ่มต้น	วันที่สิ้นสุด	ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			เป็นไป ตามที่กำหนด	ไม่เป็นไป ตามที่กำหนด
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน													
1	สำนักช่าง	โครงการก่อสร้างทางเชื่อมถนนชนเกษม 43,45,47	1,500,000.00	1,152,000.00	1 ต.ค. 66	31 ธ.ค. 66		ก่อสร้างแล้วเสร็จ ผู้รับ จ้างส่งงาน วันที่ 29 มี.ค. 2567 กรรมการตรวจรับ ยังไม่ตรวจรับงาน		-	1,152,000.00		✓
2	สำนักช่าง	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำถนนกาญจนาภิเษก (แยกถนนอำเภอถึงถนนเทพมิตร (ชุมชนศรีธานี-ยางงาม)	3,763,000.00	3,763,000.00	1 ต.ค. 65	31 ธ.ค. 65		ก่อสร้างแล้วเสร็จ รอการเบิกจ่าย		-	3,763,000.00		✓
3	สำนักช่าง	โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนน ศรีเกษม ซอย 20	746,000.00	746,000.00	1 ม.ค. 66	31 พ.ค. 66			✓	500,000.00	246,000.00		✓
4	สำนักช่าง	โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนน ชนเกษม ซอย 50/1	439,000.00	439,000.00	1 ม.ค. 66	31 พ.ค. 66			✓	400,000.00	39,000.00		✓
5	สำนักช่าง	โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนน ชนเกษม ซอย 31	433,000.00	433,000.00	1 ม.ค. 66	31 พ.ค. 66			✓	400,000.00	33,000.00		✓
6	สำนักช่าง	โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนน ราษฎร์อุทิศ ซอย 9	697,000.00	697,000.00	1 ม.ค. 66	31 พ.ค. 66			✓	510,000.00	187,000.00		✓
7	สำนักช่าง	โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนน ดอนนก ซอย 16	112,000.00	112,000.00	1 ม.ค. 66	31 พ.ค. 66			✓	100,000.00	12,000.00		✓
8	สำนักช่าง	โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนน ดอนนก ซอย 18	218,000.00	218,000.00	1 ม.ค. 66	31 พ.ค. 66			✓	200,000.00	18,000.00		✓
9	สำนักช่าง	โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนน ดอนนก ซอย 20	504,000.00	504,000.00	1 ม.ค. 66	31 พ.ค. 66			✓	400,000.00	104,000.00		✓
10	สำนักช่าง	โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนน ดอนนก ซอย 22	241,000.00	241,000.00	1 ม.ค. 66	31 พ.ค. 66			✓	200,000.00	41,000.00		✓
11	สำนักช่าง	โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนน ชนเกษม ซอย 41	694,000.00	694,000.00	1 ม.ค. 66	31 พ.ค. 66			✓	500,000.00	194,000.00		✓

รายงานผลการดำเนินงานโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ที่ขออนุมัติกันเงินไว้ (ที่ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ) ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

ณ เดือนมีนาคม 2567 (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567)

ลำดับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณ ตามเทศบัญญัติ (บาท)	งบประมาณ ที่กันเงิน (บาท)	ระยะเวลาที่กำหนดไว้ตาม แผนดำเนินงาน		สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การดำเนินการตาม แผนการดำเนินงาน	
					วันที่เริ่มต้น	วันที่สิ้นสุด	ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			เป็นไป ตามที่กำหนด	ไม่เป็นไป ตามที่กำหนด
12	สำนักช่าง	โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบแอสฟัลติกคอนกรีต ถนน รัฐรังสรรค์ ซอย 1	631,000.00	631,000.00	1 ม.ค. 66	31 พ.ค. 66			✓	500,000.00	131,000.00		✓
13	สำนักช่าง	โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบแอสฟัลติกคอนกรีต ถนน รัฐรังสรรค์ ซอย 2	571,000.00	571,000.00	1 ม.ค. 66	31 พ.ค. 66			✓	410,000.00	161,000.00		✓
14	สำนักช่าง	โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบแอสฟัลติกคอนกรีต ถนน สวนหลวง	592,000.00	592,000.00	1 ม.ค. 66	31 พ.ค. 66			✓	435,269.00	156,731.00		✓
15	สำนักช่าง	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำถนนเลี่ยงเมือง 8/1	800,000.00	800,000.00	1 ต.ค. 66	31 ธ.ค. 66		อยู่ระหว่าง คณะกรรมการจัดทำ แบบบูรยายการ งานก่อสร้างและ คณะกรรมการกำหนด ราคากลาง		-	800,000.00		✓
16	สำนักช่าง	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจร ถนนมายเทอเรส	770,000.00	770,000.00	1 ต.ค. 66	31 ธ.ค. 66		ประกาศผู้ชนะผลการ ประกวดราคา ผู้รับจ้าง ยื่นอุทธรณ์		-	770,000.00		✓
17	สำนักช่าง	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจร ถนนพ้อขุนทะเล 6	1,710,000.00	1,710,000.00	1 ต.ค. 66	31 ธ.ค. 66		ประกาศผลผู้ชนะแล้ว ไม่มีผู้คัดสมบัติ		-	1,710,000.00		✓
18	สำนักช่าง	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจร ถนนราษฎร์อุทิศ 4	1,300,000.00	1,300,000.00	1 ต.ค. 66	31 ม.ค. 67		อยู่ระหว่าง คณะกรรมการจัดทำ แบบบูรยายการ งานก่อสร้างและ คณะกรรมการกำหนด ราคากลาง		-	1,300,000.00		✓
19	สำนักช่าง	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำถนนศรีวิชัย 21/27	1,050,000.00	1,050,000.00	1 ต.ค. 66	31 ม.ค. 67		ประกาศผลผู้ชนะแล้ว		-	1,050,000.00		✓
20	สำนักช่าง	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจร ถนนเสม็ดเรียง 1	3,200,000.00	3,200,000.00	1 ต.ค. 66	31 ม.ค. 67		ประกาศผลผู้ชนะแล้ว		-	3,200,000.00		✓

รายงานผลการดำเนินงานโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ที่ขออนุมัติกันเงินไว้ (ที่ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ) ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

ณ เดือนมีนาคม 2567 (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567)

ลำดับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณ ตามเทศบัญญัติ (บาท)	งบประมาณ ที่กันเงิน (บาท)	ระยะเวลาที่กำหนดไว้ตาม แผนดำเนินงาน		สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การดำเนินการตาม แผนการดำเนินงาน	
					วันที่เริ่มต้น	วันที่สิ้นสุด	ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			เป็นไป ตามที่กำหนด	ไม่เป็นไป ตามที่กำหนด
21	สำนักช่าง	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำถนนบุญช่วย 7	2,600,000.00	2,600,000.00	1 ต.ค. 66	31 ม.ค. 67		อยู่ระหว่าง คณะกรรมการจัดทำ แบบบูรณาการ งานก่อสร้างและ คณะกรรมการกำหนด ราคากลาง		-	2,600,000.00		✓
22	สำนักช่าง	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจร ถนนศรีเกษม 2 แยกซ้าย 2,3	1,600,000.00	1,600,000.00	1 ต.ค. 66	31 ธ.ค. 66		ประกาศผลผู้ชนะแล้ว		-	1,600,000.00		✓
23	สำนักช่าง	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจร ถนนศรีเกษม 20 แยกซ้าย 2,3,4	4,600,000.00	4,600,000.00	1 ต.ค. 66	31 ม.ค. 67		อยู่ระหว่าง คณะกรรมการจัดทำ แบบบูรณาการ งานก่อสร้างและ คณะกรรมการกำหนด ราคากลาง		-	4,600,000.00		✓
24	สำนักช่าง	โครงการขยายเขตประปา	3,805,000.00	3,805,000.00	1 ก.พ. 66	31 ส.ค. 66			✓	1,330,000.00	2,475,000.00		✓
25	สำนักช่าง	โครงการก่อสร้างถนนคลองฉนาก - หัวแหลมพัฒนา(ทางเข้า ศาลพ่อดาทินกลิ้ง)	600,000.00	324,000.00	1 ต.ค. 66	30 พ.ย. 66			✓	324,000.00	-	✓	
26	สำนักช่าง	โครงการก่อสร้างปรับปรุงทางเท้า ถนนอำเภอ ตั้งแต่ ร้านกำป็น ถึงแยก รพช. (ชุมชนหนองบัว)	1,700,000.00	1,700,000.00	1 ต.ค. 66	31 ม.ค. 67		บริหารสัญญา เนื้อหา 90%		-	1,700,000.00		✓
รวม			34,876,000.00	34,252,000.00						6,209,269.00	28,042,731.00		
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น													
27	สำนักการศึกษา	โครงการปรับปรุงหลังคาและฝ้าเพดาน - อาคารตรีพฤกษา - อาคารปฐมโพธิ์ - อาคารธรรมมาภิบาล โรงเรียนเทศบาล 4 (วัดโพธิ์वास)	2,700,000.00	2,700,000.00	1 ต.ค. 65	31 พ.ค. 66			✓	1,836,678.00	863,322.00		✓

รายงานผลการดำเนินงานโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ที่ขออนุมัติกันเงินไว้ (ที่ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ) ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ณ เดือนมีนาคม 2567 (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567)													
ลำดับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณ ตามเทศบัญญัติ (บาท)	งบประมาณ ที่กันเงิน (บาท)	ระยะเวลาที่กำหนดไว้ตาม แผนดำเนินงาน		สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การดำเนินการตาม แผนการดำเนินงาน	
					วันที่เริ่มต้น	วันที่สิ้นสุด	ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			เป็นไป ตามที่กำหนด	ไม่เป็นไป ตามที่กำหนด
28	สำนักงานการศึกษา	โครงการปรับปรุงห้องน้ำ-ห้องส้วม - อาคารตรีพฤกษา - อาคารปฐมโพธิ์ - อาคารธรรมมาภิบาล โรงเรียนเทศบาล 4 (วัดโพธาราม)	2,835,000.00	2,835,000.00	1 ต.ค. 65	31 พ.ค. 66			✓	2,458,931.00	376,069.00		✓
รวม			5,535,000.00	5,535,000.00						4,295,609.00	1,239,391.00		
รวมทุกยุทธศาสตร์			40,411,000.00	39,787,000.00						10,504,878.00	29,282,122.00		

รายงานผลการดำเนินงานโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
ที่ขออนุมัติกันเงินไว้ (ที่ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ) ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
ณ เดือนมีนาคม 2567 (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567)

ลำดับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	งบประมาณ ที่กันเงิน (บาท)	ระยะเวลาที่กำหนดไว้ตาม แผนดำเนินงาน		สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การดำเนินการตาม แผนการดำเนินงาน	
					วันที่เริ่มต้น	วันที่สิ้นสุด	ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			เป็นไป ตามที่กำหนด	ไม่เป็นไป ตามที่กำหนด
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน													
1	สำนักช่าง	โครงการก่อสร้างสะพานท่าเทียบเรือพร้อมท่อนขึ้นลง ชุมชนตลาดล่าง	660,000.00	660,000.00	1 ต.ค. 66	31 มี.ค. 67		จัดทำราคากลางในระบบ e-GP		-	660,000.00	✓	
2	สำนักช่าง	โครงการก่อสร้างสะพานท่าเทียบเรือพร้อมท่อนขึ้นลง ชุมชนบางกุ้ง	720,000.00	720,000.00	1 พ.ย. 66	30 เม.ย. 67		อยู่ระหว่างการพิจารณาออกใบอนุญาตก่อสร้างล่วงล้ำน้ำจากกรมเจ้าท่า		-	720,000.00	✓	
3	สำนักช่าง	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณถนนตอนนอก จากสี่แยกคอนามัยถึงสี่แยกแสงเพชร	9,100,000.00	9,100,000.00	1 ต.ค. 66	30 ก.ย. 67		ประมาณราคา		-	9,100,000.00	✓	
4	สำนักช่าง	โครงการจ้างที่ปรึกษาเพื่อออกแบบปรับปรุงภูมิทัศน์บึงขุนทะเล	2,500,000.00	2,500,000.00	1 มี.ค. 66	30 ก.ย. 66		เบิกจ่ายงานงวดที่ 1		500,000.00	2,000,000.00		✓
5	สำนักช่าง	โครงการขยายเขตประปา	1,680,519.00	1,680,519.00	1 ม.ค. 66	30 ก.ย. 66		รอพิจารณาผล		-	1,680,519.00		✓
6	สำนักช่าง	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำถนนตลาดใหม่ 3/1	187,000.00	187,000.00	1 ธ.ค. 66	29 ก.พ. 67		พัสดุแต่งตั้งคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง		-	187,000.00	✓	
7	สำนักช่าง	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและฝิวจรางถนนตลาดใหม่ 13	937,000.00	937,000.00	1 ธ.ค. 66	29 ก.พ. 67		ประกาศผู้ชนะผลการประกวดราคา		-	937,000.00	✓	
8	สำนักช่าง	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและฝิวจรางถนนปทุมพร 6/2	555,000.00	555,000.00	1 มิ.ย. 66	30 ก.ย. 66			✓	523,300.00	31,700.00		✓
9	สำนักช่าง	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำถนนการเคหะต่อเนื่องถนนพ้อขุนทะเล 3	4,026,000.00	4,026,000.00	1 มิ.ย. 66	30 ก.ย. 66		จัดทำแบบรูปและราคากลาง		-	4,026,000.00		✓
10	สำนักช่าง	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและฝิวจรางถนนพ้อขุนทะเล 15/5	1,854,000.00	1,854,000.00	1 มิ.ย. 66	30 ก.ย. 66		พิจารณาผล		-	1,854,000.00		✓
11	สำนักช่าง	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและฝิวจรางถนนตอนนอก 11 ซอยตรงข้ามสนามหญ้าเทียม	779,000.00	779,000.00	1 พ.ค. 66	30 ก.ย. 66			✓	710,000.00	69,000.00		✓
12	สำนักช่าง	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำถนนตอนนอก 37,39	2,341,000.00	2,341,000.00	1 พ.ย. 66	31 มี.ค. 67		อยู่ระหว่างการจัดทำแบบรูป		-	2,341,000.00	✓	

รายงานผลการดำเนินงานโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
ที่ขออนุมัติกันเงินไว้ (ที่ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ) ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
ณ เดือนมีนาคม 2567 (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567)

ลำดับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	งบประมาณ ที่กันเงิน (บาท)	ระยะเวลาที่กำหนดไว้ตาม แผนดำเนินงาน		สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การดำเนินการตาม แผนการดำเนินงาน	
					วันที่เริ่มต้น	วันที่สิ้นสุด	ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			เป็นไป ตามที่กำหนด	ไม่เป็นไป ตามที่กำหนด
13	สำนักช่าง	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ และผิวจราจรถนนข้างโรงเรียนเมือง สุราษฎร์ธานี แยกซ้าย 1	355,000.00	355,000.00	1 ธ.ค. 66	29 ก.พ. 67		พัสดุแต่งตั้งคณะกรรมการ จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธี เฉพาะเจาะจง		-	355,000.00	✓	
14	สำนักช่าง	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ ถนนชนเกษมบริเวณสี่แยกเสม็ดเรียง	1,857,000.00	1,857,000.00	1 ธ.ค. 66	31 มี.ค. 67		อยู่ระหว่างเตรียมเอกสาร เพื่อขออนุมัติจ้างก่อสร้าง		-	1,857,000.00	✓	
15	สำนักช่าง	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ และผิวจราจรถนนโกลกรัฐ 1	1,877,000.00	1,877,000.00	1 ธ.ค. 66	31 มี.ค. 67		อยู่ระหว่างการเขียนแบบ		-	1,877,000.00	✓	
16	สำนักช่าง	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ และผิวจราจรถนนโกลกรัฐ 3	1,978,000.00	1,978,000.00	1 ธ.ค. 66	31 มี.ค. 67		อยู่ระหว่างการปรับแบบ แปลนให้ตรงกับ ความต้องการของชุมชน		-	1,978,000.00	✓	
17	สำนักช่าง	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ และผิวจราจรถนนยางงาม (หน้าหมู่บ้านบ้านสวดยางงาม)	3,513,000.00	3,513,000.00	1 ธ.ค. 66	31 พ.ค. 67		ยกเลิกโครงการ เนื่องจากระดับความลึก ของบ่อพักที่ไปเชื่อมต่อ เพื่อระบายน้ำมีความลึก น้อยทำให้มีความจำเป็นต้อง ยกระดับถนนบริเวณหน้า หมู่บ้านอย่างน้อย 0.80 เมตร แต่คณะกรรมการ หมู่บ้าน มีมติไม่เห็นชอบกับการ ดำเนินการดังกล่าว		-	3,513,000.00		
18	สำนักช่าง	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ ถนนตลาดล่าง 24	2,960,000.00	2,960,000.00	1 ธ.ค. 66	30 เม.ย. 67		ยกเลิกโครงการ เนื่องจากได้ตรวจสอบ แนวเขตทางแล้ว มีบางส่วน ยังไม่เป็นสาธารณะ		-	2,960,000.00		
19	สำนักช่าง	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ ถนนตลาดล่าง 24 (หลังหมู่บ้านสุขเจริญ)	4,000,000.00	4,000,000.00	1 ธ.ค. 66	30 เม.ย. 67		ขออนุมัติจ้างก่อสร้าง		-	4,000,000.00	✓	
20	สำนักช่าง	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ และผิวจราจรถนนปากน้ำ 8/1	549,000.00	549,000.00	1 ก.พ. 66	30 ก.ย. 66			✓	469,400.00	79,600.00		✓

รายงานผลการดำเนินงานโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
ที่ขออนุมัติกันเงินไว้ (ที่ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ) ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
ณ เดือนมีนาคม 2567 (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567)

ลำดับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	งบประมาณ ที่กันเงิน (บาท)	ระยะเวลาที่กำหนดไว้ตาม แผนดำเนินงาน		สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การดำเนินการตาม แผนการดำเนินงาน	
					วันที่เริ่มต้น	วันที่สิ้นสุด	ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			เป็นไป ตามที่กำหนด	ไม่เป็นไป ตามที่กำหนด
21	สำนักช่าง	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ และฝิวจรางรถถนนกาญจนาวิถี 1 แยก 3	970,000.00	970,000.00	1 พ.ย. 66	31 ม.ค. 67		อยู่ระหว่างการเขียนแบบ แปลน		-	970,000.00		✓
22	สำนักช่าง	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ และฝิวจรางรถถนนกาญจนาวิถี 1 แยก 4	729,000.00	729,000.00	1 พ.ย. 66	31 ม.ค. 67		อยู่ระหว่างการเขียนแบบ แปลน		-	729,000.00		✓
23	สำนักช่าง	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ และฝิวจรางรถถนนกาญจนาวิถี 16 แยก 1	619,000.00	619,000.00	1 พ.ย. 66	29 ก.พ. 67		รอจ้างรังวัด สอบแนวเขตที่ดิน		-	619,000.00	✓	
24	สำนักช่าง	โครงการก่อสร้างอาคารสถานีสูบน้ำ บ้านมะขาม	1,130,000.00	1,130,000.00	1 พ.ย. 66	29 ก.พ. 67		อยู่ระหว่างการเตรียม เอกสารขออนุมัติ จัดซื้อจัดจ้าง		-	1,130,000.00	✓	
25	สำนักช่าง	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ และฝิวจรางรถถนนชนเกษม 26	2,927,000.00	2,927,000.00	1 พ.ย. 66	29 ก.พ. 67		รอจ้างรังวัด สอบแนวเขตที่ดิน		-	2,927,000.00	✓	
26	สำนักช่าง	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ ถนนโหลกรัฐบริเวณแยกโรงเรียน เทศบาล 1	929,000.00	929,000.00	1 พ.ย. 66	31 ม.ค. 67		ขออนุญาตเชื่อมต่อ ทางหลวง		-	929,000.00		✓
27	สำนักช่าง	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและ ฝิวจรางรถถนนศรีเกษมหลังซอยบุญช่วย 3 พร้อมก่อสร้างอาคารสถานีสูบน้ำ และระบบเปิด-ปิดประตูกันน้ำ	1,800,000.00	1,800,000.00	1 พ.ย. 66	29 ก.พ. 67		รอจ้างรังวัด สอบแนวเขตที่ดิน		-	1,800,000.00	✓	
28	สำนักช่าง	โครงการปรับปรุงฝิวจรางรแบบ ค.ส.ล. พร้อมคูระบายน้ำ ทั้ง 2 ข้าง ถนนปรีดาราชูร์ แยกซ้าย 1 (ซอย ส.ดาวเทียม)	2,000,000.00	2,000,000.00	1 ต.ค. 66	29 ก.พ. 67		จัดทำราคากลางในระบบ e-GP		-	2,000,000.00	✓	
29	สำนักช่าง	โครงการขยายฝิวจรางรถถนนดอนนก ช่วงคอสะพานข้ามแม่น้ำตาปี	5,000,000.00	900,000.00	1 ต.ค. 66	31 ธ.ค. 66			✓	868,244.11	31,755.89		✓
30	สำนักช่าง	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ และฝิวจรางรถถนนชนเกษม 30	1,950,000.00	1,950,000.00	1 พ.ย. 66	29 ก.พ. 67		รอจ้างรังวัด สอบแนวเขตที่ดิน		-	1,950,000.00	✓	
31	สำนักช่าง	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ และฝิวจรางรถถนนตลาดล่าง 41	436,000.00	436,000.00	1 พ.ย. 66	31 ม.ค. 67		ดำเนินการก่อสร้าง		-	436,000.00		✓

รายงานผลการดำเนินงานโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
ที่ขออนุมัติกันเงินไว้ (ที่ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ) ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
ณ เดือนมีนาคม 2567 (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567)


ลำดับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	งบประมาณ ที่กันเงิน (บาท)	ระยะเวลาที่กำหนดไว้ตาม แผนดำเนินงาน		สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การดำเนินการตาม แผนการดำเนินงาน	
					วันที่เริ่มต้น	วันที่สิ้นสุด	ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			เป็นไป ตามที่กำหนด	ไม่เป็นไป ตามที่กำหนด
32	สำนักช่าง	โครงการจ้างเหมาผู้ต้องขัง ชุดลอกท่อระบายน้ำ โดยวิธีจ้างเหมา	2,500,000.00	2,500,000.00	1 พ.ค. 66	30 ก.ย. 66		แล้วเสร็จ รวดเร็วจับ		-	2,500,000.00		✓
33	สำนักช่าง	โครงการขยายผิวจราจรแบบคอนกรีต เสริมเหล็กถนนปากน้ำ บริเวณหน้า หมู่บ้านเสาวลักษณ์ 1 (ชุมชนบางกุ้ง)	350,000.00	350,000.00	1 ต.ค. 66	31 ม.ค. 67		จัดทำประกาศผู้ได้รับ คัดเลือกการจัดซื้อจัดจ้าง วิธีเฉพาะเจาะจง		-	350,000.00		✓
34	สำนักช่าง	โครงการติดตั้งเสาไฟ High Mast	2,250,000.00	2,250,000.00	1 ต.ค. 66	31 มี.ค. 67		อยู่ระหว่างสืบราคา จากผู้ประกอบการ เพื่อจัดทำราคากลาง		-	2,250,000.00	✓	
35	สำนักช่าง	โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ คอนกรีต (Over-lay) ถนนพ้อขุนทะเล ช่วงที่ 2 (ชุมชนบึงขุนทะเล)	5,800,000.00	5,800,000.00	1 ต.ค. 66	29 ก.พ. 67		รอผู้รับจ้างลงนามสัญญา จ้าง		-	5,800,000.00	✓	
36	สำนักช่าง	โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ คอนกรีต ถนนเมืองใหม่ (ชุมชนบางกุ้ง)	2,800,000.00	2,800,000.00	1 ต.ค. 66	29 ก.พ. 67		ประกาศประกวดราคา		-	2,800,000.00	✓	
รวม			74,618,519.00	70,518,519.00						3,070,944.11	67,447,574.89		
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม													
37	สำนักช่าง	โครงการซ่อมแซมปรับปรุงพื้น ลานอเนกประสงค์บริเวณสะพานริศ	500,000.00	500,000.00	1 ต.ค. 66	31 ม.ค. 67		คณะกรรมการซื้อหรือจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เชิญ ผู้มีคุณสมบัติยื่นเสนอราคา		-	500,000.00		✓
รวม			500,000.00	500,000.00						-	500,000.00		
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสวัสดิการสังคมและคุณภาพชีวิต													
38	สำนักสาธารณสุข	โครงการปรับปรุงและซ่อมแซม โรงฆ่าสัตว์ เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี	1,795,430.00	1,795,000.00	1 ต.ค. 66	30 เม.ย. 67		รอร่างวิจารณ์		-	1,795,000.00	✓	
39	กองสวัสดิการสังคม	โครงการปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพ ชีวิตและส่งเสริมผู้สูงอายุเทศบาลนครสุ ราษฎร์ธานี (ศพอส.)	3,363,000.00	3,363,000.00	1 ต.ค. 66	30 ก.ย. 67		กำหนดราคากลาง และ TOR		-	3,363,000.00	✓	
รวม			5,158,430.00	5,158,000.00						-	5,158,000.00		

รายงานผลการดำเนินงานโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
ที่ขออนุมัติกันเงินไว้ (ที่ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ) ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
ณ เดือนมีนาคม 2567 (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567)

ลำดับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	งบประมาณ ที่กั้นเงิน (บาท)	ระยะเวลาที่กำหนดไว้ตาม แผนดำเนินงาน		สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การดำเนินการตาม แผนการดำเนินงาน	
					วันที่เริ่มต้น	วันที่สิ้นสุด	ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			เป็นไป ตามที่กำหนด	ไม่เป็นไป ตามที่กำหนด
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา การกีฬา ศาสนา ประเพณีและวัฒนธรรม													
40	สำนักงานการศึกษา	โครงการก่อสร้างอ่างล้างภาตอาหารนักเรียน	365,000.00	365,000.00	1 ต.ค. 66	29 ก.พ. 67		พัสดดำเนินการจัดจ้าง		-	365,000.00	✓	
41	สำนักงานการศึกษา	โครงการต่อเติมหลังคาคลุมระหว่าง อาคารประชาชนถุมิต ๒,๓ อาคารหลังคาคลุมลานอเนกประสงค์	1,157,000.00	1,157,000.00	1 ต.ค. 66	31 มี.ค. 67		จัดทำรูปแบบรายการ		-	1,157,000.00	✓	
42	สำนักงานการศึกษา	โครงการก่อสร้างสนามเด็กเล่นโรงเรียน เทศบาล 1 (แดงอ่อนเดิมวิทยา)	1,700,000.00	1,700,000.00	1 ต.ค. 66	29 ก.พ. 67		อยู่ระหว่างดำเนินการ ก่อสร้าง		-	1,700,000.00	✓	
43	สำนักงานการศึกษา	โครงการทาสีภายนอกอาคารเรียน 1,2,3	527,000.00	527,000.00	1 ธ.ค. 65	30 ก.ย. 66			✓	298,000.00	229,000.00		✓
44	สำนักงานการศึกษา	โครงการจัดหาระบบสารสนเทศเด็กปฐมวัย สำนักงานการศึกษา เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี	100,000.00	100,000.00	1 มี.ย. 66	30 ก.ย. 66			✓	100,000.00	-		✓
45	สำนักงานการศึกษา	โครงการปรับปรุงอาคารสนามแบดมินตัน	4,000,000.00	4,000,000.00	1 ต.ค. 66	30 ก.ย. 67		จัดทำรูปแบบรายการงาน ก่อสร้าง		-	4,000,000.00	✓	
รวม			7,849,000.00	7,849,000.00						398,000.00	7,451,000.00		
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี													
46	กองยุทธศาสตร์ฯ	โครงการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี (จ้างที่ปรึกษา)	250,000.00	250,000.00	1 ต.ค. 66	31 ธ.ค. 66			✓	250,000.00	-	✓	
47	สำนักปลัดฯ	โครงการปรับปรุงเคาน์เตอร์บริการ ประชาชนสำนักงานเทศบาลนคร สุราษฎร์ธานี	500,000.00	500,000.00	1 ต.ค. 66	31 ส.ค. 67		อยู่ระหว่างดำเนินการ จัดซื้อจัดจ้าง		-	500,000.00	✓	
48	กองยุทธศาสตร์ฯ	โครงการก่อสร้างป้ายสำหรับติดตั้งจอ LED บริเวณสี่แยกวัดโพธิ์	850,000.00	850,000.00	1 ต.ค. 66	31 มี.ค. 67		สำนักช่าง จัดทำแบบแปลน แก้ไขแบบบูรปรายการ		-	850,000.00	✓	
รวม			1,600,000.00	1,600,000.00						250,000.00	1,350,000.00		
รวมทุกยุทธศาสตร์			89,725,949.00	85,625,519.00						3,718,944.11	81,906,574.89		

บัญชีรายละเอียด

ผลการดำเนินโครงการที่ขออนุมัติกันเงินไว้ (ที่ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564-2566

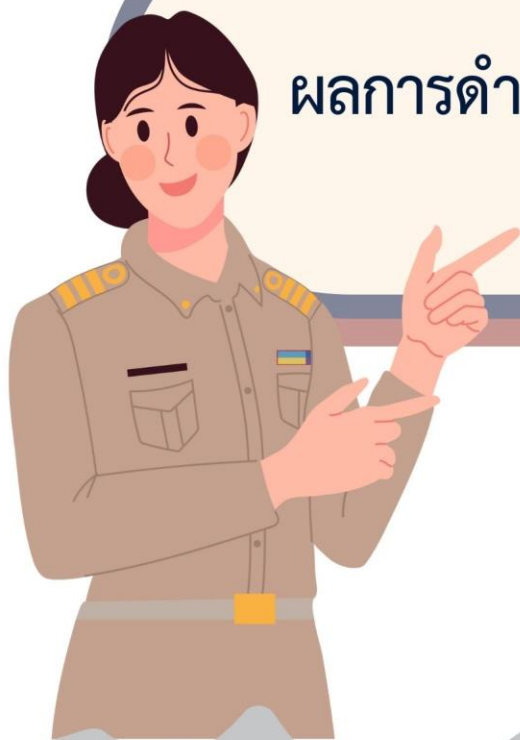

สรุปผลการดำเนินโครงการที่จ่ายจากเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565-2566 ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
ณ เดือนมีนาคม 2567 (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567)

จำนวนโครงการที่จ่ายจากเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565-2566 ที่ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ มีทั้งหมด 21 โครงการ
งบประมาณรวมทั้งสิ้น 250,648,000 บาท (สองร้อยห้าสิบล้านหกแสนสี่หมื่นแปดพันบาทถ้วน) มีรายละเอียดผลการดำเนินงาน ดังนี้

โครงการที่จ่ายจากเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำนวน 9 โครงการ งบประมาณ 200,368,000 บาท

ยุทธศาสตร์	รวมทั้งสิ้น			ดำเนินการเสร็จสิ้น			ระหว่างดำเนินการ			ยังไม่ดำเนินการ		โครงการที่ยกเลิก	
	โครง	งบประมาณ	งบประมาณ	โครง	งบประมาณ	งบประมาณ	โครง	งบประมาณ	งบประมาณ	โครง	งบประมาณ	โครง	งบประมาณ
	การ	ที่ตั้งไว้	ที่เบิกจ่าย	การ	ที่ตั้งไว้	ที่เบิกจ่าย	การ	ที่ตั้งไว้	ที่เบิกจ่าย	การ	ที่ตั้งไว้	การ	ที่ตั้งไว้
1.ด้านโครงสร้างพื้นฐาน	9	200,368,000.00	56,103,998.94	7	17,910,000.00	14,549,432.00	2	182,458,000.00	41,554,566.94	-	-	-	-
รวม	9	200,368,000.00	56,103,998.94	7	17,910,000.00	14,549,432.00	2	182,458,000.00	41,554,566.94	-	-	-	-
คิดเป็นร้อยละ		100.00			77.78			22.22		0.00		0.00	

โครงการที่จ่ายจากเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จำนวน 12 โครงการ งบประมาณ 50,280,000 บาท

ยุทธศาสตร์	รวมทั้งสิ้น			ดำเนินการเสร็จสิ้น			ระหว่างดำเนินการ			ยังไม่ดำเนินการ		โครงการที่ยกเลิก	
	โครง	งบประมาณ	งบประมาณ	โครง	งบประมาณ	งบประมาณ	โครง	งบประมาณ	งบประมาณ	โครง	งบประมาณ	โครง	งบประมาณ
	การ	ที่ตั้งไว้	ที่เบิกจ่าย	การ	ที่ตั้งไว้	ที่เบิกจ่าย	การ	ที่ตั้งไว้	ที่เบิกจ่าย	การ	ที่ตั้งไว้	การ	ที่ตั้งไว้
1.ด้านโครงสร้างพื้นฐาน	12	50,280,000.00	22,604,000	9	35,546,000.00	22,604,000.00	3	14,734,000.00	-	-	-	-	-
รวม	12	50,280,000.00	22,604,000	9	35,546,000.00	22,604,000.00	3	14,734,000.00	-	-	-	-	-
คิดเป็นร้อยละ		100.00			75.00			25.00		0.00			0.00

รวม	21	250,648,000.00	78,707,998.94	16	53,456,000.00	37,153,432.00	5	197,192,000.00	41,554,567	-	-	-	-
คิดเป็นร้อยละ		100.00			76.19			23.81		0.00			0.00

รายงานผลการดำเนินงานโครงการที่จ่ายจากเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ที่ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ) ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
ณ เดือนมีนาคม 2567 (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567)

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาที่กำหนดไว้ตาม แผนดำเนินงาน		สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การดำเนินการตาม แผนการดำเนินงาน	
					ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			เป็นไป ตามที่กำหนด	ไม่เป็นไป ตามที่กำหนด
			วันที่เริ่มต้น	วันที่สิ้นสุด							
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน											
1	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจร ถนนโกลกัรัฐ 18/2	1,960,000.00	1 มิ.ย. 65	30 ก.ย. 65			✓	1,700,000.00	260,000.00		✓
2	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจร ถนนกาญจนวิถี 30 ตอน 3	6,200,000.00	1 ก.ค. 65	31 ธ.ค. 65			✓	5,910,000.00	290,000.00		✓
3	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจร ถนนชนเกษม 29 ตอน 2	3,500,000.00	1 มิ.ย. 65	30 ก.ย. 65			✓	1,236,000.00	2,264,000.00		✓
4	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจร ถนนอำเภอ 15/1	2,600,000.00	1 ก.ค. 65	31 ต.ค. 65			✓	2,472,000.00	128,000.00		✓
5	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจร ถนนศรีเกษม 20 แยกขวา 3	1,800,000.00	1 ก.ค. 65	31 ธ.ค. 65			✓	1,490,000.00	310,000.00		✓
6	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจร ถนนศรีวิชัย 21/20	950,000.00	1 มิ.ย. 65	31 ส.ค. 65			✓	947,500.00	2,500.00		✓
7	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจร ถนนพ้อขุนทะเล 10/7 แยกซ้าย 2	900,000.00	1 มิ.ย. 65	31 ส.ค. 65			✓	793,932.00	106,068.00		✓
8	โครงการปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้าเป็น เคเบิลใต้ดินบริเวณถนนชนเกษม	67,468,000.00	1 มิ.ย. 65	30 ก.ย. 65		อยู่ระหว่างก่อสร้าง เบิกจ่ายงวดที่ 5 เมื่อวันที่ 14 มี.ค. 2567		21,608,374.81	45,859,625.19		✓
9	โครงการปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้าเป็น เคเบิลใต้ดินบริเวณถนนตลาดใหม่	114,990,000.00	1 มิ.ย. 65	30 ก.ย. 65		อยู่ระหว่างก่อสร้าง เบิกจ่ายงวดที่ 5 เมื่อวันที่ 14 มี.ค. 2567		19,946,192.13	95,043,807.87		✓
รวม		200,368,000.00						56,103,998.94	144,264,001.06		
รวมทุกยุทธศาสตร์		200,368,000.00						56,103,998.94	144,264,001.06		

รายงานผลการดำเนินงานโครงการที่จ่ายจากเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ที่ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ) ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
ณ เดือนมีนาคม 2567 (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567)

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาที่กำหนดไว้ตามแผน ดำเนินงาน		สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การดำเนินการตาม แผนการดำเนินงาน	
			วันที่เริ่มต้น	วันที่สิ้นสุด	ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			เป็นไป ตามที่กำหนด	ไม่เป็นไป ตามที่กำหนด
1.ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน											
1	โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนตลาดล่าง STA 0+670-2+315	8,568,000.00	1 ม.ค. 66	31 มี.ค. 66			✓	6,139,000.00	2,429,000.00		✓
2	โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนศรีวิชัย ซอย 59	1,994,000.00	1 ม.ค. 66	31 มี.ค. 66			✓	1,332,296.00	661,704.00		✓
3	โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนเปรมฤดี	1,011,000.00	1 ม.ค. 66	31 มี.ค. 66			✓	675,502.00	335,498.00		✓
4	โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนชนเกษม 49 STA 0+460-1+000	1,865,000.00	1 ม.ค. 66	31 มี.ค. 66			✓	1,246,104.00	618,896.00		✓
5	โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนบางใหญ่ 16	410,000.00	1 ม.ค. 66	31 มี.ค. 66			✓	273,942.00	136,058.00		✓
6	โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนบางใหญ่ 21	308,000.00	1 ม.ค. 66	31 มี.ค. 66			✓	205,790.00	102,210.00		✓
7	โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนบางใหญ่ 23	218,000.00	1 ม.ค. 66	31 มี.ค. 66			✓	145,656.00	72,344.00		✓
8	โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนเปรมจิตประชา	1,372,000.00	1 ก.พ. 66	30 เม.ย. 66			✓	916,710.00	455,290.00		✓
9	โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนท่าโรงช้าง STA 0+000-1+398	7,662,000.00	1 ส.ค. 66	31 ธ.ค. 66		รอผู้รับจ้างลงนาม สัญญาจ้าง		-	7,662,000.00		✓
10	โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบแอสฟัลท์คอนกรีต (Over-lay) ถนนโกลกัรัฐ (ชุมชนหนองบัว,ชุมชนศรีธานี-ยาง งาม,ชุมชนค่าย อส.)	19,800,000.00	1 มิ.ย. 66	30 ก.ย. 66			✓	11,669,000.00	8,131,000.00		✓

รายงานผลการดำเนินงานโครงการที่จ่ายจากเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ที่ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ) ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
ณ เดือนมีนาคม 2567 (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567)

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาที่กำหนดไว้ตามแผน ดำเนินงาน		สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การดำเนินการตาม แผนการดำเนินงาน	
			วันที่เริ่มต้น	วันที่สิ้นสุด	ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			เป็นไป ตามที่กำหนด	ไม่เป็นไป ตามที่กำหนด
11	โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบแอสฟัลท์คอนกรีต (Over-lay) ถนนพ้อขุนทะเล จากแยกตาปานช่วงที่ 1 (Sta 0+000 ถึง Sta 1+100) (ชุมชนบึงขุนทะเล)	6,200,000.00	1 มิ.ย. 66	30 ก.ย. 66		ก่อสร้างแล้วเสร็จ แต่ผู้รับจ้างยังไม่ส่งงาน เนื่องจากรอผลทดสอบ วัสดุ		-	6,200,000.00		✓
12	โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบแอสฟัลท์คอนกรีต ถนนตีเหล็กและซอยแยก (ตลาดศาลเจ้า) (ชุมชนวัดไทร)	872,000.00	1 มิ.ย. 66	30 ก.ย. 66		จัดทำราคากลาง ครั้งที่ 2 ในระบบ e-GP		-	872,000.00		✓
รวม		50,280,000.00						22,604,000.00	27,676,000.00		
รวมทุกยุทธศาสตร์		50,280,000.00						22,604,000.00	27,676,000.00		
