



รายงานติดตาม

ผลการเบิกจ่ายและผลการดำเนินโครงการ
ตามแผนพัฒนาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

ประจำปีงบประมาณที่ 1/2567

ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566



คำนำ

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ครั้งที่ 4/2566 เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2566 ได้กำหนดแนวทางวิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 กำหนดให้มีการติดตามผลการเบิกจ่ายและผลการดำเนินโครงการตามแผนพัฒนาฯ ประจำเดือนและประจำไตรมาส โดยมอบหมายให้งานวิจัยและประเมินผลจัดทำรายงานสรุปผลในภาพรวมนำเสนอผู้บริหารทราบทุกสิ้นเดือน และเสนอต่อคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีทราบและให้ข้อเสนอแนะ ทุกสิ้นไตรมาส

ทั้งนี้เพื่อติดตามความก้าวหน้าและผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี เป็นไปอย่างต่อเนื่องและเกิดประโยชน์ต่อการดำเนินงานของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี



สารบัญ



หน้า 1

แผนภูมิแสดงผลการเบิกจ่ายงบประมาณตามเทศบัญญัติฯ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566)

หน้า 2

สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณตามเทศบัญญัติถึงงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566)

หน้า 6

รายงานผลการดำเนินโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
(ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566)

หน้า 9

แผนภูมิแสดงสถานะการดำเนินโครงการ ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ.2567 (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566)

หน้า 10

สรุปผลการดำเนินโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
(ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566)

หน้า 11

บัญชีรายละเอียดผลการดำเนินโครงการตามเทศบัญญัติถึงงบประมาณ
รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566)

หน้า
29


บัญชีรายละเอียดผลการดำเนินโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565-2566
ที่ย้ายจากเงินสะสม ที่ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566)

หน้า
34

บัญชีรายละเอียดผลการดำเนินโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564-2566
ที่ขออนุมัติกันเงินไว้ ที่ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566)

แผนภูมิแสดงผลการเบิกจ่ายงบประมาณตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

ประจำไตรมาสที่ 1/2567 (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566)

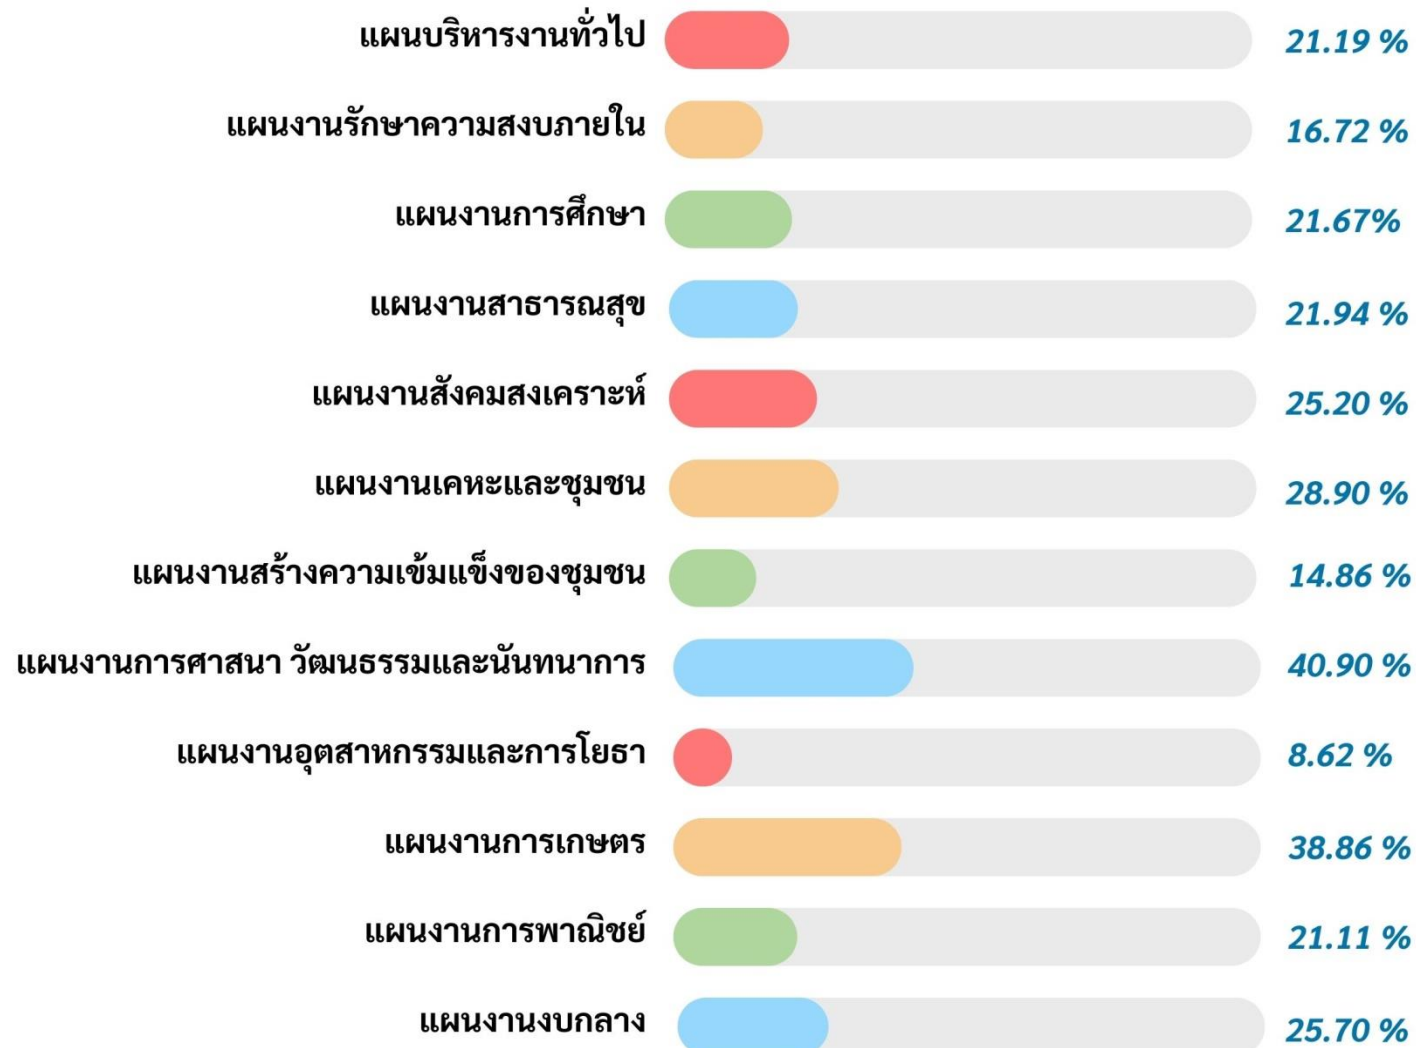

สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567



เป้าหมายการเบิกจ่าย ไตรมาสที่ 1/2567

- > รายจ่ายประจำ ร้อยละ 30 (ของรายจ่ายประจำทั้งหมด)
- > จบลงทุน ร้อยละ 15 (ของงบลงทุนทั้งหมด)
- > การเบิกจ่ายในภาพรวม ร้อยละ 20 (ของงบประมาณทั้งหมด)

ลำดับ	แผนงาน / งาน	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	การโอนงบประมาณ		การเบิกจ่าย		งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การเบิกจ่าย (ร้อยละ)	หน่วยงาน ผู้เบิก
			โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	ผูกพัน (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)			
1	แผนงานบริหารงานทั่วไป	141,265,840.00	620,550.00	419,750.00	6,718,808.79	23,253,917.68	111,493,913.53	21.19	
	รายจ่ายประจำ	140,227,790.00	539,750.00	419,750.00	6,718,808.79	23,073,817.68	110,555,163.53	21.23	
	- งานบริหารทั่วไป	94,472,800.00	381,750.00	381,750.00	6,033,747.05	13,599,273.46	74,839,779.49		สป./กองยุทธฯ/กจ.
	- งานวางแผนสถิติและวิชาการ	4,591,600.00	18,000.00	18,000.00	58,068.00	878,930.00	3,654,602.00		กองยุทธฯ
	- งานบริหารงานคลัง	40,272,000.00	120,000.00	-	574,963.74	8,453,975.55	31,363,060.71		คลัง/สารสนเทศภาษีฯ
	- งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน	891,390.00	20,000.00	20,000.00	52,030.00	141,638.67	697,721.33		หน่วยตรวจสอบภายใน
	รายจ่ายเพื่อการลงทุน	1,038,050.00	80,800.00	-	-	180,100.00	938,750.00	16.10	
	- งานบริหารทั่วไป (ครุภัณฑ์)	1,038,050.00	80,800.00	-	-	180,100.00	938,750.00		
2	แผนงานรักษาความสงบภายใน	33,067,900.00	69,000.00	69,000.00	342,792.22	5,185,234.01	27,539,873.77	16.72	
	รายจ่ายประจำ	33,026,400.00	69,000.00	69,000.00	342,792.22	5,185,234.01	27,498,373.77	16.74	
	- งานเทศกิจ	10,877,200.00	-	-	142,511.60	1,976,661.10	8,758,027.30		สำนักปลัดเทศบาล
	- งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	17,526,600.00	69,000.00	69,000.00	111,438.52	2,570,876.71	14,844,284.77		
	- งานจราจร	4,622,600.00	-	-	88,842.10	637,696.20	3,896,061.70		สำนักช่าง
	รายจ่ายเพื่อการลงทุน	41,500.00	-	-	-	-	41,500.00	-	
	-งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย(ครุภัณฑ์)	41,500.00	-	-	-	-	41,500.00		

ลำดับ	แผนงาน / งาน	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	การโอนงบประมาณ		การเบิกจ่าย		งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การเบิกจ่าย (ร้อยละ)	หน่วยงาน ผู้เบิก
			โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	ผูกพัน (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)			
3	แผนงานการศึกษา	315,744,300.00	13,845.00	13,845.00	3,186,985.83	65,243,955.75	247,313,358.42	21.67	
	รายจ่ายประจำ	315,179,300.00	13,845.00	13,845.00	3,186,985.83	65,243,955.75	246,748,358.42	21.71	
	- งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	8,123,100.00	13,845.00	13,845.00	131,573.99	1,379,846.51	6,611,679.50		สำนักการศึกษา
	- งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	172,264,500.00	-	-	1,681,453.00	39,894,017.60	130,689,029.40		
	- งานระดับมัธยมศึกษา	128,350,800.00	-	-	1,328,134.15	23,057,092.30	103,965,573.55		
	- งานศึกษาไม่กำหนดระดับ	6,440,900.00	-	-	45,824.69	912,999.34	5,482,075.97		
	รายจ่ายเพื่อการลงทุน	565,000.00	-	-	-	-	565,000.00	-	
	- งานระดับก่อนวัยเรียนฯ (ครุภัณฑ์)	565,000.00	-	-	-	-	565,000.00		
4	แผนงานสาธารณสุข	66,042,600.00	79,100.00	-	1,132,660.07	13,374,872.79	51,614,167.14	21.94	
	รายจ่ายประจำ	65,622,200.00	79,100.00	-	1,132,660.07	13,374,872.79	51,193,767.14	22.08	
	- งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	9,074,500.00	-	-	290,136.96	1,937,454.07	6,846,908.97		สำนักสาธารณสุขฯ
	- งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	18,364,700.00	75,500.00	-	716,066.57	2,895,830.15	14,828,303.28		
	- งานศูนย์บริการสาธารณสุข	38,183,000.00	3,600.00	-	126,456.54	8,541,588.57	29,518,554.89		
	รายจ่ายเพื่อการลงทุน	420,400.00	-	-	-	-	420,400.00	-	
	- งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข (ครุภัณฑ์)	71,400.00	-	-	-	-	71,400.00		สำนักสาธารณสุขฯ
	- งานศูนย์บริการสาธารณสุข (ครุภัณฑ์)	349,000.00	-	-	-	-	349,000.00		
5	แผนงานสังคมสงเคราะห์	11,783,390.00	20,000.00	20,000.00	781,222.62	2,187,784.66	8,814,382.72	25.20	
	รายจ่ายประจำ	11,756,690.00	20,000.00	20,000.00	781,222.62	2,187,784.66	8,787,682.72	25.25	
	- งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์	4,960,700.00	20,000.00	20,000.00	2,437.94	1,040,193.16	3,918,068.90		กองสวัสดิการสังคม
	- งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	6,795,990.00	-	-	778,784.68	1,147,591.50	4,869,613.82		
	รายจ่ายเพื่อการลงทุน	26,700.00	-	-	-	-	26,700.00	-	
	- งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์(ครุภัณฑ์)	26,700.00	-	-	-	-	26,700.00		สำนักช่าง

ลำดับ	แผนงาน / งาน	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	การโอนงบประมาณ		การเบิกจ่าย		งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การเบิกจ่าย (ร้อยละ)	หน่วยงาน ผู้เบิก
			โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	ผูกพัน (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)			
6	แผนงานเคหะและชุมชน	185,454,570.00	658,500.00	237,600.00	24,092,701.20	29,618,826.07	132,163,942.73	28.90	
	รายจ่ายประจำ	160,454,570.00	658,500.00	237,600.00	24,092,701.20	29,618,826.07	107,163,942.73	33.39	
	- งานไฟฟ้าและประปา	321,270.00	-	-	-	321,233.26	36.74		สำนักช่าง
	- งานสวนสาธารณะ	10,119,800.00	500,000.00	-	174,915.81	2,776,140.12	7,668,744.07		
	- งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	131,277,300.00	158,500.00	237,600.00	23,099,608.63	23,052,477.57	85,046,113.80		สข. / สธ.
	- งานบำบัดน้ำเสีย	18,736,200.00	-	-	818,176.76	3,468,975.12	14,449,048.12		สำนักช่าง
	รายจ่ายเพื่อการลงทุน	25,000,000.00	-	-	-	-	25,000,000.00	-	
	- งานสวนสาธารณะ (ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)	5,000,000.00	-	-	-	-	5,000,000.00		สข. / สธ.
	- งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล (ค่าครุภัณฑ์)	20,000,000.00	-	-	-	-	20,000,000.00		สข. / สธ.
7	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	18,726,600.00	-	-	518,795.00	2,264,613.00	15,943,192.00	14.86	
	รายจ่ายประจำ	18,726,600.00	-	-	518,795.00	2,264,613.00	15,943,192.00	14.86	
	- งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	18,726,600.00	-	-	518,795.00	2,264,613.00	15,943,192.00		กองสวัสดิการสังคม
	รายจ่ายเพื่อการลงทุน	-	-	-	-	-	-		
8	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและ นันทนาการ	25,594,500.00	10,000.00	30,000.00	2,901,656.29	7,558,428.21	15,114,415.50	40.90	
	รายจ่ายประจำ	25,525,000.00	10,000.00	30,000.00	2,901,656.29	7,558,428.21	15,044,915.50	41.01	
	- งานกีฬาและนันทนาการ	8,767,400.00	-	-	311,100.29	360,248.51	8,096,051.20		สำนักการศึกษา
	- งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	12,487,900.00	-	-	1,513,304.00	6,772,950.50	4,201,645.50		
	- งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว	4,269,700.00	10,000.00	30,000.00	1,077,252.00	425,229.20	2,747,218.80		สำนักปลัดเทศบาล
	รายจ่ายเพื่อการลงทุน	69,500.00	-	-	-	-	69,500.00	-	
	-งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมฯ (ค่าครุภัณฑ์)	69,500.00	-	-	-	-	69,500.00		

ลำดับ	แผนงาน / งาน	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	การโอนงบประมาณ		การเบิกจ่าย		งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การเบิกจ่าย (ร้อยละ)	หน่วยงาน ผู้เบิก
			โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	ผูกพัน (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)			
9	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	150,346,390.00	111,000.00	711,000.00	2,580,022.42	10,325,576.63	136,840,790.95	8.62	
	รายจ่ายประจำ	57,412,740.00	111,000.00	711,000.00	2,580,022.42	10,274,376.63	43,958,340.95	22.63	
	- งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมฯ	7,341,300.00	111,000.00	55,000.00	90,340.06	1,392,464.40	5,914,495.54		สำนักช่าง
	- งานก่อสร้าง	50,071,440.00	-	656,000.00	2,489,682.36	8,881,912.23	38,043,845.41		
	รายจ่ายเพื่อการลงทุน	92,933,650.00	-	-	-	51,200.00	92,882,450.00	0.06	
	- งานก่อสร้าง (ค่าครุภัณฑ์)	26,578,450.00	-	-	-	51,200.00	26,527,250.00		สำนักช่าง
	- งานก่อสร้าง (ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)	66,355,200.00	-	-	-	-	66,355,200.00		สำนักช่าง
10	แผนงานการเกษตร	6,699,900.00	-	-	766,318.89	1,837,277.90	4,096,303.21	38.86	
	รายจ่ายประจำ	6,699,900.00	-	-	766,318.89	1,837,277.90	4,096,303.21	38.86	
	- งานส่งเสริมการเกษตร	6,699,900.00	-	-	766,318.89	1,837,277.90	4,096,303.21		สำนักช่าง
	รายจ่ายเพื่อการลงทุน	-	-	-	-	-	-		
11	แผนงานการพาณิชย์	3,296,200.00	-	-	230,435.86	465,462.60	2,600,301.54	21.11	
	รายจ่ายประจำ	3,296,200.00	-	-	230,435.86	465,462.60	2,600,301.54	21.11	
	- งานตลาดสด	651,100.00	-	-	-	107,451.82	543,648.18		สำนักปลัดเทศบาล
	- งานโรงฆ่าสัตว์	2,645,100.00	-	-	230,435.86	358,010.78	2,056,653.36		สำนักสาธารณสุข
	รายจ่ายเพื่อการลงทุน	-	-	-	-	-	-	-	
12	แผนงานงบกลาง	241,977,810.00	200,000.00	280,800.00	185,747.25	61,983,158.33	179,728,104.42	25.70	
	รายจ่ายประจำ	241,977,810.00	200,000.00	280,800.00	185,747.25	61,983,158.33	179,728,104.42	25.70	
	รายจ่ายเพื่อการลงทุน	-	-	-	-	-	-		
การเบิกจ่ายในภาพรวม		1,200,000,000.00	1,781,995.00	1,781,995.00	43,438,146.44	223,299,107.63	933,262,745.93	22.23	
รวมรายจ่ายประจำ		1,079,905,200.00	1,701,195.00	1,781,995.00	43,438,146.44	223,067,807.63	813,318,445.93	24.68	
รวมงบลงทุน		120,094,800.00	80,800.00	-	-	231,300.00	119,944,300.00	0.19	

รายงาน

ผลการดำเนินโครงการ

- ✓ โครงการที่ตั้งจ่ายจากงบประมาณตามเทศบัญญัติ ฯ
- ✓ โครงการที่ตั้งจ่ายจากเงินสะสม
- ✓ โครงการที่อนุมัติกันเงินไว้ (ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ)

สรุปผลการดำเนินโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567


ณ ไตรมาสที่ 1/2567 (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566)

ที่	ยุทธศาสตร์การพัฒนา	ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น				ที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ				ที่ได้ดำเนินการ			
		โครงการ		งบประมาณ		โครงการ		งบประมาณ		โครงการ		งบประมาณ	
		จำนวน	ร้อยละ	จำนวน (บาท)	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน (บาท)	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน (บาท)	ร้อยละ
1	ด้านโครงสร้างพื้นฐาน	130	36.52	380,505,000.00	19.92	18	5.06	34,019,270.00	1.78	9	2.53	4,739,270.00	0.25
2	ด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว	11	3.09	50,895,000.00	2.66	8	2.25	13,300,000.00	0.70	4	1.12	2,400,000.00	0.13
3	ด้านการจัดการ ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม	9	2.53	944,770,000.00	49.45	4	1.12	5,700,000.00	0.30	3	0.84	700,000.00	0.04
4	ด้านสวัสดิการสังคมและคุณภาพ ชีวิต	123	34.55	97,719,680.00	5.12	111	31.18	45,694,600.00	2.39	19	5.34	6,667,600.00	0.35
5	ด้านการศึกษา การกีฬา ศาสนา ประเพณีและวัฒนธรรม	66	18.54	430,743,800.00	22.55	46	12.92	138,663,900.00	7.26	25	7.02	106,978,800.00	5.60
6	ด้านการบริหารจัดการที่ดี	17	4.78	5,810,000.00	0.30	14	3.93	2,940,000.00	0.15	8	2.25	1,840,000.00	0.10
รวมทั้งสิ้น		356	100.00	1,910,443,480.00	100.00	201	56.46	240,317,770.00	12.58	68	19.10	123,325,670.00	6.46

หมายเหตุ ที่ได้ดำเนินการ หมายถึง โครงการที่ดำเนินการเสร็จสิ้นรวมกับโครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ

แผนภูมิแสดง

ผลการดำเนินโครงการในภาพรวมแยกรายยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
ประจำไตรมาสที่ 1/2567 (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566)

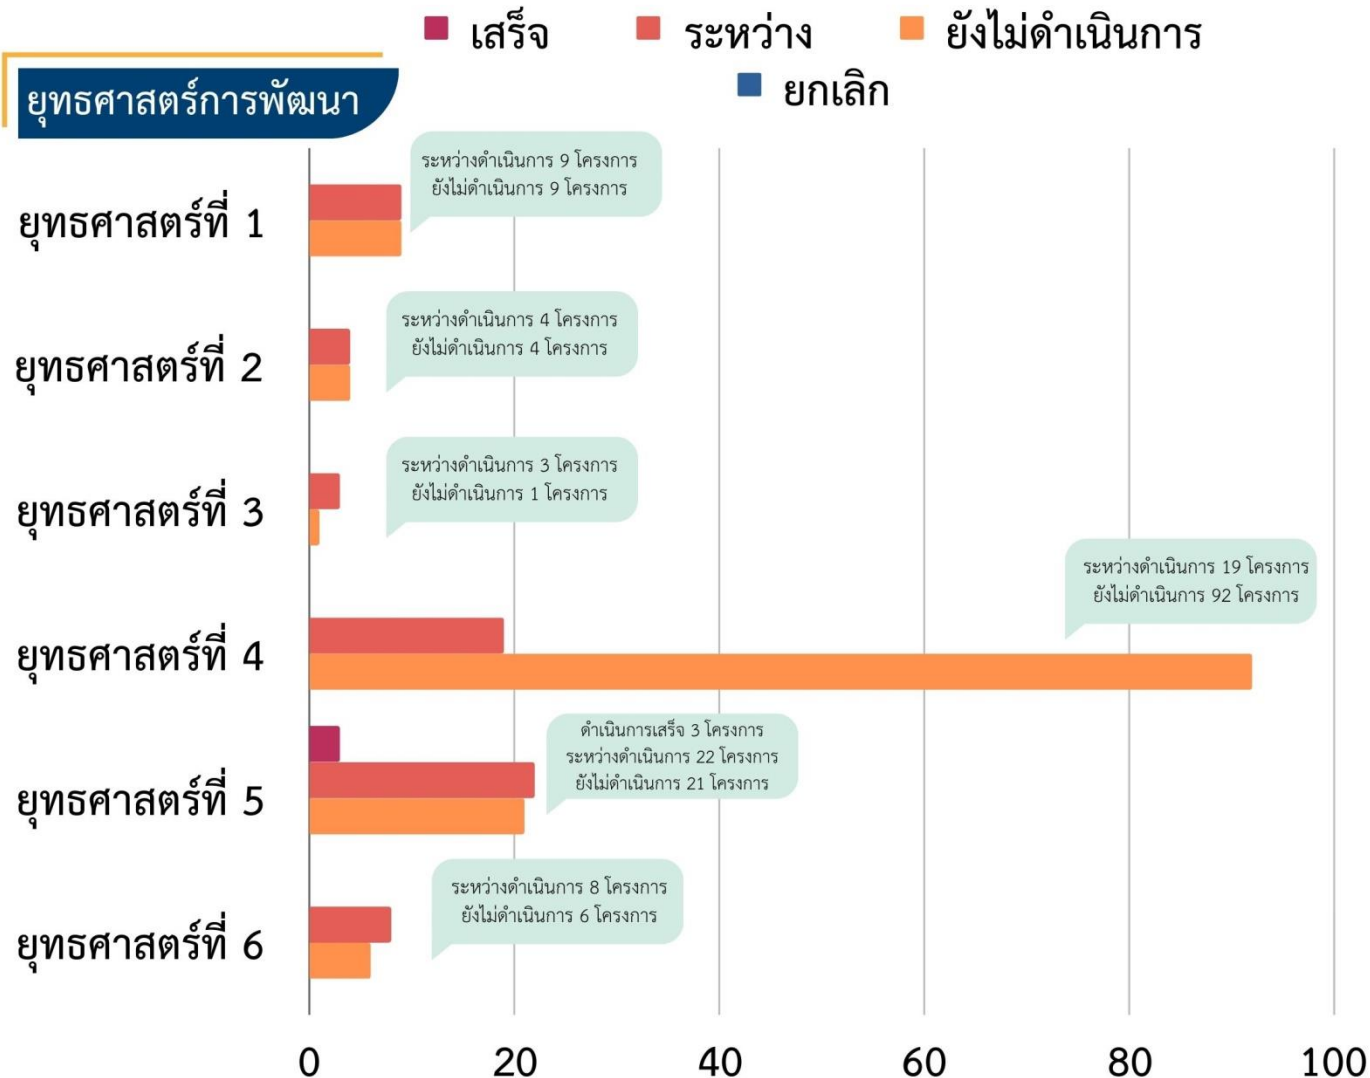


ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านสวัสดิการสังคมและคุณภาพชีวิต
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการศึกษา การกีฬา ศาสนา ประเพณีและวัฒนธรรม
ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการบริหารจัดการที่ดี

แผนภูมิแสดง


สถานะการดำเนินโครงการในภาพรวม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

ประจำไตรมาสที่ 1/2567 (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566)

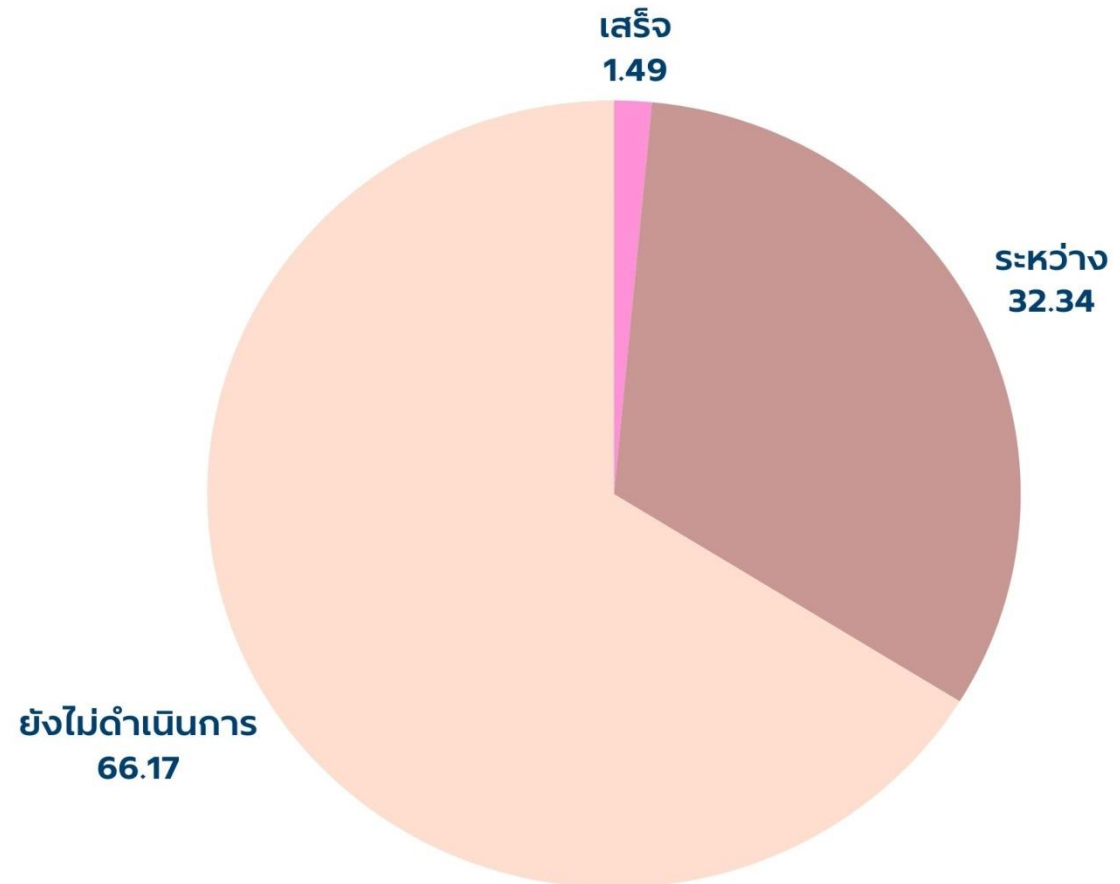

สรุปผลการดำเนินโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567													
ณ ไตรมาสที่ 1/2567 (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566)													
จำนวนโครงการที่ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 มีทั้งหมด 201 โครงการ งบประมาณรวมทั้งสิ้น 240,317,770 บาท (สองร้อยสี่สิบล้านสามแสนหนึ่งหมื่นเจ็ดพันเจ็ดร้อยเจ็ดสิบบาทถ้วน)													
มีรายละเอียดผลการดำเนินงาน ดังนี้													
1. โครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 จำนวน 191 โครงการ งบประมาณ 207,684,770 บาท													
ยุทธศาสตร์	รวมทั้งสิ้น			ดำเนินการเสร็จสิ้น			ระหว่างดำเนินการ			ยังไม่ดำเนินการ		โครงการที่ยกเลิก	
	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบประมาณที่เบิกจ่าย	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบประมาณที่เบิกจ่าย	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบประมาณที่เบิกจ่าย	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้
1. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน	8	1,386,270.00	292,292.97	-	-	-	7	321,270.00	292,292.97	1	1,065,000.00	-	-
2. ด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว	8	13,300,000.00	169,900.00	-	-	-	4	2,400,000.00	169,900.00	4	10,900,000.00	-	-
3. ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	4	5,700,000.00	-	-	-	-	3	700,000.00	-	1	5,000,000.00	-	-
4. ด้านสวัสดิการสังคมและคุณภาพชีวิต	111	45,694,600.00	1,208,198.52	-	-	-	19	6,667,600.00	1,208,198.52	92	39,027,000.00	-	-
5. ด้านการศึกษา การกีฬา ศาสนา ประเพณีและวัฒนธรรม	46	138,663,900.00	29,131,670.61	3	7,200,000.00	6,009,348.00	22	99,778,800.00	23,122,322.61	21	31,685,100.00	-	-
6. ด้านการบริหารจัดการที่ดี	14	2,940,000.00	49,500.00	-	-	-	8	1,840,000.00	49,500.00	6	1,100,000.00	-	-
รวม	191	207,684,770.00	30,851,562.10	3	7,200,000.00	6,009,348.00	63	111,707,670.00	24,842,214.10	125	88,777,100.00	-	-
คิดเป็นร้อยละ	100.00			1.57			32.98			65.45		0.00	
2. โครงการที่จ่ายจากเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 จำนวน 10 โครงการ งบประมาณ 32,633,000 บาท													
ยุทธศาสตร์	รวมทั้งสิ้น			ดำเนินการเสร็จสิ้น			ระหว่างดำเนินการ			ยังไม่ดำเนินการ		โครงการที่ยกเลิก	
	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบประมาณที่เบิกจ่าย	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบประมาณที่เบิกจ่าย	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบประมาณที่เบิกจ่าย	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้
1. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน	10	32,633,000.00	-	-	-	-	2	4,418,000.00	-	8	28,215,000.00	-	-
รวม	10	32,633,000.00	-	-	-	-	2	4,418,000.00	-	8	28,215,000.00	-	-
คิดเป็นร้อยละ	100.00			0.00			20.00			80.00		0.00	
รวมทั้งสิ้น	201	240,317,770.00	30,851,562.10	3	7,200,000.00	6,009,348.00	65	116,125,670.00	24,842,214.10	133	116,992,100.00	0	0.00
คิดเป็นร้อยละ	100.00			1.49			32.34			66.17		0.00	

บัญชีรายละเอียด
ผลการดำเนินโครงการที่ถ่ายจาก
งบประมาณตามเทศบัญญัติฯ



รายงานผลการดำเนินงานโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
ณ ไตรมาสที่ 1/2567 (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566)

แบบรายงาน 2.1

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	ระยะเวลาที่กำหนดไว้ ตามแผนดำเนินงาน		สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การดำเนินการตาม แผนการดำเนินงาน	
							ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			เป็นไป ตามที่กำหนด	ไม่เป็นไป ตามที่กำหนด
					วันที่เริ่มต้น	วันที่สิ้นสุด							
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน													
1	โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะถนนโศภนรัฐ 19	74,940.00	-	-	1 พ.ย. 66	31 ส.ค. 67		การดำเนินการของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสุราษฎร์ธานี		45,999.30	28,940.70	✓	
2	โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะถนนศรีวิชัย 31/1	40,700.00	-	-	1 พ.ย. 66	31 ส.ค. 67		การดำเนินการของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสุราษฎร์ธานี		40,698.52	1.48	✓	
3	โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะถนนพ่อนทะเล 13/1/1	44,000.00	-	-	1 พ.ย. 66	31 ส.ค. 67		การดำเนินการของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสุราษฎร์ธานี		43,991.98	8.02	✓	
4	โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะถนนชนเกษม 39/1	37,040.00	-	-	1 พ.ย. 66	31 ส.ค. 67		การดำเนินการของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสุราษฎร์ธานี		37,031.63	8.37	✓	
5	โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะถนนกาญจนาวิถี ซอยตรงข้ามวัดโพธิ์นิมิต	33,640.00	-	-	1 พ.ย. 66	31 ส.ค. 67		การดำเนินการของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสุราษฎร์ธานี		33,631.17	8.83	✓	
6	โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะถนนกาญจนาวิถี 3	46,000.00	-	-	1 พ.ย. 66	31 ส.ค. 67		การดำเนินการของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสุราษฎร์ธานี		45,999.30	0.70	✓	
7	โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะถนนกาญจนาวิถี 16 ซอย 18	44,950.00	-	-	1 พ.ย. 66	31 ส.ค. 67		การดำเนินการของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสุราษฎร์ธานี		44,941.07	8.93	✓	
8	โครงการขยายผิวจราจรและปรับปรุงทางเท้าถนนหน้าเมืองทั้ง 2 ข้าง ตั้งแต่แยกถนนหลวงอนุวัตรไปจนถึงถนนกาญจนาวิถี (ชุมชนหน้าด่าน,ชุมชนโพหวาย,ชุมชนตลาดล่าง)	1,065,000.00	-	-	1 มี.ค. 67	30 ก.ย. 67	✓			-	1,065,000.00	✓	
รวม		1,386,270.00	-	-						292,292.97	1,093,977.03		
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว													
9	โครงการเย็นทั่วหล้า มหาสงกรานต์	500,000.00	-	-	1 เม.ย. 67	30 เม.ย. 67	✓			-	500,000.00	✓	
10	โครงการเคาท์ดาวน์/สวัสดีปีใหม่	500,000.00	-	-	1 ธ.ค. 66	31 ม.ค. 67		ตรวจรับพัสดุ		-	500,000.00	✓	

รายงานผลการดำเนินงานโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
ณ ไตรมาสที่ 1/2567 (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566)

แบบรายงาน 2.1

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	ระยะเวลาที่กำหนดไว้ ตามแผนดำเนินงาน		สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การดำเนินการตาม แผนการดำเนินงาน	
							ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			เป็นไป ตามที่กำหนด	ไม่เป็นไป ตามที่กำหนด
					วันที่เริ่มต้น	วันที่สิ้นสุด							
11	โครงการส่งเสริมกิจกรรมและประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี	1,000,000.00	-	-	1 ต.ค. 66	30 ก.ย. 67		จัดกิจกรรม สวนเรืองแสงครั้งที่ 2 ภายใต้ชื่องาน “Winter Illuminations”		-	1,000,000.00	✓	
12	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ริมเขื่อนแม่น้ำตาปีถนนบ้านดอน (ช่วงที่ 3)	5,500,000.00	-	-	1 ม.ค. 67	31 ส.ค. 67	✓			-	5,500,000.00	✓	
13	โครงการถนนคนเดิน	400,000.00	-	-	1 ต.ค. 66	30 ก.ย. 67		จำหน่ายสินค้าวันเสาร์-อาทิตย์		37,000.00	363,000.00	✓	
14	โครงการตลาดสะพานโค้ง 100 ปี	500,000.00	-	-	1 ต.ค. 66	30 ก.ย. 67		จำหน่ายสินค้าวันเสาร์-อาทิตย์		132,900.00	367,100.00	✓	
15	โครงการก่อสร้างหลังคาคลุมทางเดินตลาดนัดตลาดน้ำบ้านดอน	2,900,000.00	-	-	1 ธ.ค. 66	30 มิ.ย. 67	✓			-	2,900,000.00		✓
16	โครงการก่อสร้างสะพานทางเดินชุมชนบางหลา	2,000,000.00	-	-	1 ก.พ. 67	30 มิ.ย. 67	✓			-	2,000,000.00	✓	
รวม		13,300,000.00	-	-						169,900.00	13,130,100.00		
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม													
17	โครงการเฝ้าระวังสิ่งแวดล้อมเมือง	200,000.00	-	-	1 ต.ค. 66	30 ก.ย. 67		เฝ้าระวังตรวจสอบคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำสาธารณะในเขตเทศบาลฯ จำนวน 21 จุด		-	200,000.00	✓	
18	โครงการลดโลกร้อนกับนครสุราษฎร์ธานี	200,000.00	-	-	1 ต.ค. 66	30 ก.ย. 67		กำหนดจัดกิจกรรมสำรวจเพื่อขึ้นทะเบียนไม้ใหญ่ในเมือง ระหว่างวันที่ 4-5 ม.ค. 2567 และอบรมให้ความรู้แก่นักเรียนในสถานศึกษา ด้านการลดภาวะโลกร้อนในเขตเทศบาล ในวันที่ 25 ม.ค. 2567		-	200,000.00	✓	

รายงานผลการดำเนินงานโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
ณ ไตรมาสที่ 1/2567 (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566)

แบบรายงาน 2.1

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	ระยะเวลาที่กำหนดไว้ ตามแผนดำเนินงาน		สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การดำเนินการตาม แผนการดำเนินงาน	
							ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			เป็นไป ตามที่กำหนด	ไม่เป็นไป ตามที่กำหนด
					วันที่เริ่มต้น	วันที่สิ้นสุด							
19	โครงการลดขยะต้นทางกับนครสุราษฎร์ธานี	300,000.00	-	-	1 ต.ค. 66	30 ก.ย. 67		ดำเนินกิจกรรมส่งเสริม ลดปริมาณ/คัดแยก ขยะทั่วไป, กิจกรรม ส่งเสริมลดปริมาณ/ คัดแยกขยะรีไซเคิล, กิจกรรมส่งเสริม ลดปริมาณ/คัดแยก ขยะอันตราย, กิจกรรม ส่งเสริมลดปริมาณ/ คัดแยกขยะอินทรีย์		-	300,000.00	✓	
20	โครงการปรับปรุงสนามเด็กเล่นสวนหลวง ร.9	5,000,000.00	-	-	1 ก.พ. 67	30 ก.ย. 67	✓			-	5,000,000.00	✓	
รวม		5,700,000.00	-	-						-	5,700,000.00		
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสวัสดิการสังคมและคุณภาพชีวิต													
21	โครงการแม่ลูกพันธุ์ดี	57,000.00	-	-	1 ต.ค. 66	30 ก.ย. 67		ตรวจพันธุ์หึ่งตั้งครรภ์ ที่มาฝากท้อง ที่ ศูนย์บริการสาธารณสุข ทั้ง 4 ศูนย์ฯ, ตรวจสุขภาพ ช่องปากเด็กอายุ 4 เดือน - 4 ปี		-	57,000.00	✓	
22	โครงการแข่งขันกีฬาพื้นบ้านชุมชนสัมพันธ์	300,000.00	-	-	1 ธ.ค. 66	31 ม.ค. 67		จัดการแข่งขันกีฬา พื้นบ้านชุมชนสัมพันธ์ เมื่อวันที่ 21 ธ.ค. 66		180,300.00	119,700.00	✓	
23	โครงการเสริมสร้างและพิทักษ์สิทธิสวัสดิการผู้รับเบี้ยยังชีพ	30,000.00	-	-	1 ต.ค. 66	31 มี.ค. 67		แจกเอกสารแผ่นพับ ประชาสัมพันธ์และติดตั้ง ป้าย		29,998.52	1.48	✓	
24	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพเพาะเห็ด และแปรรูปเห็ด (น้ำพริกเห็ด, เห็ดกรอบสมุนไพร/ชุมชนเสริมพล	30,000.00	-	-	1 ก.พ. 67	30 ก.ย. 67	✓			-	30,000.00	✓	
25	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพสวนครัวพอเพียงชุมชนเมือง/ชุมชน หนองบัว	30,000.00	-	-	1 ก.พ. 67	30 ก.ย. 67	✓			-	30,000.00	✓	
26	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพสร้างสร้งงานพื้นผ้าพัฒนา ศักยภาพชุมชน/ชุมชนเสม็ดเรียง	30,000.00	-	-	1 ก.พ. 67	30 ก.ย. 67	✓			-	30,000.00	✓	
27	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพพัฒนาอาชีพพื้นผ้าปาเต๊ะ/ ชุมชนเพชรวิลล่า	30,000.00	-	-	1 ก.พ. 67	30 ก.ย. 67	✓			-	30,000.00	✓	

รายงานผลการดำเนินงานโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
ณ ไตรมาสที่ 1/2567 (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566)

แบบรายงาน 2.1

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	ระยะเวลาที่กำหนดไว้ ตามแผนดำเนินงาน		สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การดำเนินการตาม แผนการดำเนินงาน	
							ยังไม่	ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการ			เป็นไป ตามที่กำหนด	ไม่เป็นไป ตามที่กำหนด
					วันที่เริ่มต้น	วันที่สิ้นสุด	ดำเนินการ	(อยู่ในขั้นตอน)	เสร็จสิ้น				
28	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพปลูกผักสวนครัวและสมุนไพร ในตะกร้าพลาสติก/ชุมชนหัวแหลมพัฒนา	30,000.00	-	-	1 ก.พ. 67	30 ก.ย. 67	✓			-	30,000.00	✓	
29	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพทำผ้า Eco Print ผ้าพิมพ์ลาย จากธรรมชาติ/ชุมชนค่ายวิภาวดีรังสิต	30,000.00	-	-	1 ก.พ. 67	30 ก.ย. 67	✓			-	30,000.00	✓	
30	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการแปรรูปและถนอมอาหาร/ ชุมชนศรีวิชัย	30,000.00	-	-	1 ก.พ. 67	30 ก.ย. 67	✓			-	30,000.00	✓	
31	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการเลี้ยงไก่ไข่/ชุมชนบ้านบางทอง	30,000.00	-	-	1 ก.พ. 67	30 ก.ย. 67	✓			-	30,000.00	✓	
32	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการเลี้ยงไก่ไข่/ชุมชน ร.25 พัน3	30,000.00	-	-	1 ก.พ. 67	30 ก.ย. 67	✓			-	30,000.00	✓	
33	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการแพ้นท์ผ้าปาเต๊ะและการปัก เลื่อม/ชุมชนตาปี	30,000.00	-	-	1 ก.พ. 67	30 ก.ย. 67	✓			-	30,000.00	✓	
34	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการแพ้นท์ผ้าปาเต๊ะ/ชุมชนวัด ท่าทอง	30,000.00	-	-	1 ก.พ. 67	30 ก.ย. 67	✓			-	30,000.00	✓	
35	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการแพ้นท์ผ้าปาเต๊ะ/ชุมชนกาญจนาวิธี ร่วมใจ	30,000.00	-	-	1 ก.พ. 67	30 ก.ย. 67	✓			-	30,000.00	✓	
36	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการแพ้นท์ผ้าถุงลายไทย/ชุมชน ลูกเสือการุณราชบุรี	30,000.00	-	-	1 ก.พ. 67	30 ก.ย. 67	✓			-	30,000.00	✓	
37	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการเพิ่มมูลค่าหมวกและ กระเป๋าจักสานเตุควาจ/ชุมชนเมตตาธรรม	30,000.00	-	-	1 ก.พ. 67	30 ก.ย. 67	✓			-	30,000.00	✓	
38	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ด้วย ศิลปะเตุควาจ/ชุมชนวังเพชร	30,000.00	-	-	1 ก.พ. 67	30 ก.ย. 67	✓			-	30,000.00	✓	
39	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการสานกระเป๋จากเส้น พลาสติก/ชุมชนเคหะชุมชน	30,000.00	-	-	1 ก.พ. 67	30 ก.ย. 67	✓			-	30,000.00	✓	
40	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการสานกระเป๋จากเส้น พลาสติก/ชุมชนวัดหน้าเมือง	30,000.00	-	-	1 ก.พ. 67	30 ก.ย. 67	✓			-	30,000.00	✓	
41	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการสานกระเป๋จากเส้น พลาสติก/ชุมชนนาเนียน	30,000.00	-	-	1 ก.พ. 67	30 ก.ย. 67	✓			-	30,000.00	✓	
42	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการสานกระเป๋จากเส้น พลาสติก/ชุมชนดงตาล	30,000.00	-	-	1 ก.พ. 67	30 ก.ย. 67	✓			-	30,000.00	✓	
43	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการผูกผ้าและทำของชำร่วย/ ชุมชนเสรีไทย	30,000.00	-	-	1 ก.พ. 67	30 ก.ย. 67	✓			-	30,000.00	✓	

รายงานผลการดำเนินงานโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
ณ ไตรมาสที่ 1/2567 (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566)

แบบรายงาน 2.1

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	ระยะเวลาที่กำหนดไว้ ตามแผนดำเนินงาน		สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การดำเนินการตาม แผนการดำเนินงาน	
							ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			เป็นไป ตามที่กำหนด	ไม่เป็นไป ตามที่กำหนด
					วันที่เริ่มต้น	วันที่สิ้นสุด							
44	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการผูกผ้าตามงานพิธีต่างๆ/ชุมชน ท่าแขก	30,000.00	-	-	1 ก.พ. 67	30 ก.ย. 67	✓			-	30,000.00	✓	
45	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการผลิตเครื่องมือประมง พื้นบ้าน(ลอบดักกุ้ง ปลา)/ชุมชนบางกุ้ง	30,000.00	-	-	1 ก.พ. 67	30 ก.ย. 67	✓			-	30,000.00	✓	
46	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการผลิตอาหารและการแปรรูป อาหาร/ชุมชนทุ่งน้อย	30,000.00	-	-	1 ก.พ. 67	30 ก.ย. 67	✓			-	30,000.00	✓	
47	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการปักผ้าด้วยมุก, เลื่อมลูกปัด, ข้ออ้อยคริสตัล ลงบนผ้าปาเต๊ะ/ชุมชนสหกรณ์ครู	30,000.00	-	-	1 ก.พ. 67	30 ก.ย. 67	✓			-	30,000.00	✓	
48	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการปลูกผักไฮโดรโปนิกส์/ชุมชน เปี่ยมสุข	30,000.00	-	-	1 ก.พ. 67	30 ก.ย. 67	✓			-	30,000.00	✓	
49	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการปลูกผักไฮโดรโปนิกส์/ ชุมชนปากน้ำ	30,000.00	-	-	1 ก.พ. 67	30 ก.ย. 67	✓			-	30,000.00	✓	
50	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการทำโถเครื่องหอม ยาหม่อง น้ำมันเหลือง จากสมุนไพร/ชุมชนบางกุ้ง3	30,000.00	-	-	1 ก.พ. 67	30 ก.ย. 67	✓			-	30,000.00	✓	
51	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการทำขนม ไส้กรอก ปลาต้ม/ ชุมชนบางกุ้ง2	30,000.00	-	-	1 ก.พ. 67	30 ก.ย. 67	✓			-	30,000.00	✓	
52	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการทำเหรียญโปรยทาน และ ดอกไม้จันทน์/ชุมชนวัดโพธารวาส	30,000.00	-	-	1 ก.พ. 67	30 ก.ย. 67	✓			-	30,000.00	✓	
53	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการทำเสื้อและกระโปรงมัลดีเยียม/ ชุมชนหน้าค่าย อส.	30,000.00	-	-	1 ก.พ. 67	30 ก.ย. 67	✓			-	30,000.00	✓	
54	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการทำเครื่องมือประมง ชายฝั่ง/ชุมชนคลองฉนาก	30,000.00	-	-	1 ก.พ. 67	30 ก.ย. 67	✓			-	30,000.00	✓	
55	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการทำอาหารพื้นบ้านและ น้ำพริก/ชุมชนบึงขุนทะเล	30,000.00	-	-	1 ก.พ. 67	30 ก.ย. 67	✓			-	30,000.00	✓	
56	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการทำหมกรอบ หมูแดง เบ็ดย่าง น้ำผึ้ง/ชุมชนตลาดล่าง	30,000.00	-	-	1 ก.พ. 67	30 ก.ย. 67	✓			-	30,000.00	✓	
57	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการทำสมุนไพรอบไอน้ำเพื่อ สุขภาพ/ชุมชนหน้าศาลากลาง	30,000.00	-	-	1 ก.พ. 67	30 ก.ย. 67	✓			-	30,000.00	✓	
58	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการทำผ้ามัลดีเยียม/ชุมชนแหลมทราย	30,000.00	-	-	1 ก.พ. 67	30 ก.ย. 67	✓			-	30,000.00	✓	

รายงานผลการดำเนินงานโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
ณ ไตรมาสที่ 1/2567 (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566)

แบบรายงาน 2.1

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	ระยะเวลาที่กำหนดไว้ ตามแผนดำเนินงาน		สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การดำเนินการตาม แผนการดำเนินงาน	
							ยังไม่	ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการ			เป็นไป ตามที่กำหนด	ไม่เป็นไป ตามที่กำหนด
					วันที่เริ่มต้น	วันที่สิ้นสุด	ดำเนินการ	(อยู่ในขั้นตอน)	เสร็จสิ้น				
59	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการทำผ้าผืนด้าย้อม/ชุมชนเทศบาล	30,000.00	-	-	1 ก.พ. 67	30 ก.ย. 67	✓			-	30,000.00	✓	
60	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการทำผ้าผืนด้าย้อม/ชุมชนหลังคลัง	30,000.00	-	-	1 ก.พ. 67	30 ก.ย. 67	✓			-	30,000.00	✓	
61	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการทำผ้าผืนด้าย้อม/ชุมชนหน้าสนามกีฬา	30,000.00	-	-	1 ก.พ. 67	30 ก.ย. 67	✓			-	30,000.00	✓	
62	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการทำผ้าผืนด้าย้อม/ชุมชนหน้าด่าน	30,000.00	-	-	1 ก.พ. 67	30 ก.ย. 67	✓			-	30,000.00	✓	
63	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการทำผ้าผืนด้าย้อม/ชุมชนสิริสุข	30,000.00	-	-	1 ก.พ. 67	30 ก.ย. 67	✓			-	30,000.00	✓	
64	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการทำผ้าผืนด้าย้อม/ชุมชนรวมเพชรสามัคคี	30,000.00	-	-	1 ก.พ. 67	30 ก.ย. 67	✓			-	30,000.00	✓	
65	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการทำผ้าผืนด้าย้อม/ชุมชนย่านยาว	30,000.00	-	-	1 ก.พ. 67	30 ก.ย. 67	✓			-	30,000.00	✓	
66	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการทำผ้าผืนด้าย้อม/ชุมชนตลาดใหม่ดอนนก	30,000.00	-	-	1 ก.พ. 67	30 ก.ย. 67	✓			-	30,000.00	✓	
67	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการทำผ้าผืนด้าย้อม/ชุมชนตลาดดอนนก	30,000.00	-	-	1 ก.พ. 67	30 ก.ย. 67	✓			-	30,000.00	✓	
68	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการทำผ้าผืนด้าย้อม(ต่อเนื่อง 66)/ชุมชนสันติสุข	30,000.00	-	-	1 ก.พ. 67	30 ก.ย. 67	✓			-	30,000.00	✓	
69	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการทำผ้าผืนด้าย้อม /ชุมชนวัดกลางใหม่	30,000.00	-	-	1 ก.พ. 67	30 ก.ย. 67	✓			-	30,000.00	✓	
70	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการทำผ้าผืนด้าย้อม /ชุมชนมะขามเตี้ย	30,000.00	-	-	1 ก.พ. 67	30 ก.ย. 67	✓			-	30,000.00	✓	
71	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการทำผ้าผืนด้าย้อม (เลื้อ, ผ้าพัน, หมวก)/ชุมชนศรีธานี	30,000.00	-	-	1 ก.พ. 67	30 ก.ย. 67	✓			-	30,000.00	✓	
72	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการทำผ้าผืนด้าย้อม (ต่อเนื่อง 66) /ชุมชนบางกุ้ง1	30,000.00	-	-	1 ก.พ. 67	30 ก.ย. 67	✓			-	30,000.00	✓	
73	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการทำผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทย (ยาหม่องสมุนไพร , ลูกประคบ, สบู่สมุนไพร, ยาสระผมสมุนไพร) /ชุมชนฝั่งบางใบไม้	30,000.00	-	-	1 ก.พ. 67	30 ก.ย. 67	✓			-	30,000.00	✓	
74	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการทำน้ำพริกและเครื่องแกงโขลกใช้/ชุมชนในลีก	30,000.00	-	-	1 ก.พ. 67	30 ก.ย. 67	✓			-	30,000.00	✓	

รายงานผลการดำเนินงานโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
ณ ไตรมาสที่ 1/2567 (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566)

แบบรายงาน 2.1

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	ระยะเวลาที่กำหนดไว้ ตามแผนดำเนินงาน		สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การดำเนินการตาม แผนการดำเนินงาน	
							ยังไม่	ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการ			เป็นไป ตามที่กำหนด	ไม่เป็นไป ตามที่กำหนด
					วันที่เริ่มต้น	วันที่สิ้นสุด	ดำเนินการ	(อยู่ในขั้นตอน)	เสร็จสิ้น				
75	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการทำน้ำพริกจากหมู ไบปลาแห้ง/ ชุมชนตลาดน้ำศูนย์สร้างทาง	30,000.00	-	-	1 ก.พ. 67	30 ก.ย. 67	✓			-	30,000.00	✓	
76	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการทำน้ำพริก (น้ำพริกตาแดง น้ำพริกมันปู ปลาหวาน และกุ้งหวาน) /ชุมชนบ้านบางลา	30,000.00	-	-	1 ก.พ. 67	30 ก.ย. 67	✓			-	30,000.00	✓	
77	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการทำขนมไทย/ชุมชนราษฎร์บำรุง- ดอนนก	30,000.00	-	-	1 ก.พ. 67	30 ก.ย. 67	✓			-	30,000.00	✓	
78	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการทำขนมไทย/ชุมชนท่ากูบ	30,000.00	-	-	1 ก.พ. 67	30 ก.ย. 67	✓			-	30,000.00	✓	
79	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการทำขนมไทย/ชุมชนกรม ทหารราบที่ 25	30,000.00	-	-	1 ก.พ. 67	30 ก.ย. 67	✓			-	30,000.00	✓	
80	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการทำขนมไทย (ขนมเม็ดขนุน, ขนมทองหยิบ, ขนมเผือกกวน, ขนมถั่วกวน)/ชุมชนหลังอาชีวะ	30,000.00	-	-	1 ก.พ. 67	30 ก.ย. 67	✓			-	30,000.00	✓	
81	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการทำขนมไทย (ขนมกล้วย, ขนมสาकुไล่หนู, ข้าวต้มมัด, ขนมทองหยิบ, ขนมทองหยอด, ขนมวันกะทิ)/ชุมชนวัดไทร	30,000.00	-	-	1 ก.พ. 67	30 ก.ย. 67	✓			-	30,000.00	✓	
82	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการทำขนมเปียะใส่ไข่เค็มลาวา/ ชุมชนราษฎร์อุทิศ	30,000.00	-	-	1 ก.พ. 67	30 ก.ย. 67	✓			-	30,000.00	✓	
83	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการทำกระเป๋าคัดไทย กระเป๋าราดรี แอนด์เมด/ชุมชนโพหวาย	30,000.00	-	-	1 ก.พ. 67	30 ก.ย. 67	✓			-	30,000.00	✓	
84	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการตัดเย็บเสื้อผ้า/ชุมชนบ้าน บางใหญ่	30,000.00	-	-	1 ก.พ. 67	30 ก.ย. 67	✓			-	30,000.00	✓	
85	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการตัดเย็บเสื้อผ้า ชุดลำลอง/ ชุมชนพวงเพชรพัฒนา	30,000.00	-	-	1 ก.พ. 67	30 ก.ย. 67	✓			-	30,000.00	✓	
86	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการตัดเย็บหมวกและกระเป๋า/ ชุมชนอ้อมค่ายวิภาวดีรังสิต	30,000.00	-	-	1 ก.พ. 67	30 ก.ย. 67	✓			-	30,000.00	✓	
87	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการตัดเย็บกระเป๋าผ้าและ ผ้าถุงปาเต๊ะ/ชุมชนตลาดเกษตร2	30,000.00	-	-	1 ก.พ. 67	30 ก.ย. 67	✓			-	30,000.00	✓	
88	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการซ่อมแซมเครื่องมือประมง ชายฝั่ง(ต่อเนื่องปี 66)/ชุมชนหาดยายวง	30,000.00	-	-	1 ก.พ. 67	30 ก.ย. 67	✓			-	30,000.00	✓	
89	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพ Inter Food (อาหาร นานาชาติ)/ชุมชนศรีธานี - ยางงาม	30,000.00	-	-	1 ก.พ. 67	30 ก.ย. 67	✓			-	30,000.00	✓	

รายงานผลการดำเนินงานโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
ณ ไตรมาสที่ 1/2567 (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566)

แบบรายงาน 2.1

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	ระยะเวลาที่กำหนดไว้ ตามแผนดำเนินงาน		สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การดำเนินการตาม แผนการดำเนินงาน	
							ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			เป็นไป ตามที่กำหนด	ไม่เป็นไป ตามที่กำหนด
					วันที่เริ่มต้น	วันที่สิ้นสุด							
90	โครงการอบรมและพัฒนาศักยภาพแกนนำสุขภาพชุมชน	1,301,600.00	-	-	1 ม.ค. 67	31 พ.ค. 67		กำหนดจัดอบรมด้าน สาธารณสุข เดือน ม.ค. 2567 และการศึกษา ดูงานแลกเปลี่ยน เรียนรู้ชุมชนตัวอย่าง ด้านสุขภาพต่างพื้นที่ เดือน ก.พ. 2567		-	1,301,600.00	✓	
91	โครงการอบรมด้านสุขภาพสำหรับสถานบริการแต่งผม - เสริมสวยในเขตเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี	80,000.00	-	-	1 พ.ย. 66	31 ม.ค. 67		จัดอบรมแล้วเสร็จ อยู่ ระหว่างเบิกจ่าย งบประมาณ และส่งใช้เงิน ยืม		-	80,000.00	✓	
92	โครงการอบรมการใช้เทคโนโลยีและเครื่องมือการสื่อสารใน ยุคปัจจุบัน	50,000.00	-	-	1 ม.ค. 67	31 ม.ค. 67	✓			-	50,000.00	✓	
93	โครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยแม่และเด็ก ของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาฯ เจ้าฟ้ามหาดจรัสสิรินธราฯ สยามบรมราชกุมารี	200,000.00	-	-	1 เม.ย. 67	30 มิ.ย. 67	✓			-	200,000.00	✓	
94	โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการและยกระดับสถาน ประกอบการจำหน่ายอาหารในเขตเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี	700,000.00	-	-	1 มี.ค. 67	30 เม.ย. 67	✓			-	700,000.00	✓	
95	โครงการส่งเสริมและพัฒนาสวัสดิภาพเด็กและเยาวชน	150,000.00	-	-	1 เม.ย. 67	31 ส.ค. 67	✓			-	150,000.00	✓	
96	โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพเครือข่ายผู้ผลิต ผลิตภัณฑ์ชุมชน	42,000.00	-	-	1 ต.ค. 66	30 ก.ย. 67	✓			-	42,000.00		✓
97	โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพผู้ได้รับเบี้ยยังชีพทุก ประเภท	50,000.00	-	-	1 ต.ค. 66	30 เม.ย. 67	✓			-	50,000.00		✓
98	โครงการส่งเสริมและพัฒนาการยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชนและ การเข้าถึงช่องทางการจำหน่ายอย่างรู้เท่าทัน	90,000.00	-	-	1 มี.ค. 67	31 ก.ค. 67	✓			-	90,000.00	✓	
99	โครงการส่งเสริมศักยภาพและพัฒนาระบบสวัสดิการสังคม	80,000.00	-	-	1 ธ.ค. 66	30 ก.ย. 67	✓			-	80,000.00		✓
100	โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตบนพื้นฐานคุณค่าภูมิปัญญาสู่ สังคมอายุยืน	200,000.00	-	-	1 มี.ค. 67	30 เม.ย. 67	✓			-	200,000.00	✓	

รายงานผลการดำเนินงานโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
ณ ไตรมาสที่ 1/2567 (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566)

แบบรายงาน 2.1

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	ระยะเวลาที่กำหนดไว้ ตามแผนดำเนินงาน		สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การดำเนินการตาม แผนการดำเนินงาน	
							ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			เป็นไป ตามที่กำหนด	ไม่เป็นไป ตามที่กำหนด
					วันที่เริ่มต้น	วันที่สิ้นสุด							
101	โครงการส่งเสริมการใช้จักรยานเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ประชาชนในชุมชน	20,000.00	-	-	1 เม.ย. 67	31 ก.ค. 67	✓			-	20,000.00	✓	
102	โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมการดำเนินงานของแกนนำ สุขภาพชุมชน	79,200.00	-	-	1 ต.ค. 66	30 ก.ย. 67		ประชุมแกนนำสุขภาพ ชุมชนประจำเดือน		12,000.00	67,200.00	✓	
103	โครงการสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และชิ้นทะเบียนสัตว์ตาม โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตาม พระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวาง ควัฒน วรขัตติยราชนารี	80,000.00	-	-	1 พ.ย. 66	30 ก.ย. 66		อยู่ระหว่างการจัดซื้อยา และเวชภัณฑ์เพื่อออก หน่วยฉีดวัคซีนป้องกัน โรคพิษสุนัขบ้า		-	80,000.00	✓	
104	โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการกลุ่มผู้นำสตรีเทศบาลนคร สุราษฎร์ธานี	100,000.00	-	-	1 ต.ค. 66	30 ก.ย. 67		ประชุมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร "การพัฒนา บุคลิกภาพสตรีอย่างเป็น เลิศ"		3,700.00	96,300.00	✓	
105	โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตาม พระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้า ฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี	399,800.00	-	-	1 ต.ค. 66	30 ก.ย. 67		จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ การแพทย์ ครั้งที่ 1 อยู่ ระหว่างเบิกจ่าย		-	399,800.00	✓	
106	โครงการสตรีต้นแบบในชุมชนผู้ทำหน้าที่มารดาที่สมบูรณ์แบบ	200,000.00	-	-	1 มิ.ย. 67	30 ก.ย. 67	✓			-	200,000.00	✓	
107	โครงการศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ (ศพอส.) เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี	250,000.00	-	-	1 ต.ค. 66	30 ก.ย. 67		จัดกิจกรรมสานสัมพันธ์ วันคริสต์มาส		37,250.00	212,750.00	✓	
108	โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหาเสพติด To Be Number One (ศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่นในชุมชน/หมู่บ้าน) ของ ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี	200,000.00	-	-	1 ก.ค. 67	30 ก.ย. 67	✓			-	200,000.00	✓	
109	โครงการรณรงค์ป้องกันยาเสพติดในชุมชน	80,000.00	-	-	1 มิ.ย. 67	30 มิ.ย. 67	✓			-	80,000.00	✓	
110	โครงการรณรงค์การควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน ของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ เจ้าฟ้า มหาดจักรีสิรินธรฯ สยามบรมราชกุมารี	200,000.00	-	-	1 เม.ย. 67	30 มิ.ย. 67	✓			-	200,000.00	✓	

รายงานผลการดำเนินงานโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
ณ ไตรมาสที่ 1/2567 (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566)

แบบรายงาน 2.1

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	ระยะเวลาที่กำหนดไว้ ตามแผนดำเนินงาน		สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การดำเนินการตาม แผนการดำเนินงาน	
							ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			เป็นไป ตามที่กำหนด	ไม่เป็นไป ตามที่กำหนด
					วันที่เริ่มต้น	วันที่สิ้นสุด							
111	โครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายผู้สูงอายุเทศบาลนคร สุราษฎร์ธานี	800,000.00	-	-	1 พ.ย. 66	31 ม.ค. 67		ฝึกอบรมและศึกษาเรียนรู้ นอกสถานที่ เมื่อวันที่ 6-8 ธ.ค. 2566		757,185.00	42,815.00	✓	
112	โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสวัสดิการสังคม	50,000.00	-	-	1 มี.ค. 67	30 มิ.ย. 67	✓			-	50,000.00	✓	
113	โครงการพัฒนาศักยภาพสตรี	900,000.00	-	-	1 ธ.ค. 66	31 ส.ค. 67	✓			-	900,000.00		✓
114	โครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการเครือข่ายชุมชน คณะกรรมการเขตพัฒนาชุมชน คณะกรรมการชุมชนและ องค์กรชุมชนอื่น ๆ	1,350,000.00	-	-	1 ต.ค. 66	30 ก.ย. 67		ประชุมเชิงปฏิบัติการ คณะกรรมการชุมชน		-	1,350,000.00	✓	
115	โครงการพัฒนาระบบสุขภาพในโรงเรียนและชุมชนของสมเด็จพระ กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ เจ้าฟ้า มहाจักรีสิรินธรฯ สยามบรมราชกุมารี	400,000.00	-	-	1 ม.ค. 67	31 ส.ค. 67	✓			-	400,000.00	✓	
116	โครงการพัฒนาระบบการเรียนรู้เพื่อสร้างชุมชนเข้มแข็งใน การพัฒนาชุมชน	500,000.00	-	-	1 ม.ค. 67	30 ก.ย. 67		ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร "บุคคลต้นแบบ ในชุมชน" เมื่อวันที่ 14 ธ.ค. 2566		158,365.00	341,635.00	✓	
117	โครงการฝึกอบรมและศึกษาเรียนรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้นำ เด็กและเยาวชน	500,000.00	-	-	1 ม.ค. 67	31 มี.ค. 67	✓			-	500,000.00	✓	
118	โครงการฝึกอบรมและฝึกทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่าย พลเรือน (อปพร.) ประจำปี (หลักสูตรจัดตั้งและหลักสูตร ทบทวน)	400,000.00	-	-	1 ม.ค. 67	31 มี.ค. 67	✓			-	400,000.00	✓	
119	โครงการฝึกอบรมซ่อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย	100,000.00	-	-	1 ก.พ. 67	31 พ.ค. 67	✓			-	100,000.00	✓	
120	โครงการปรับปรุงภาวะโภชนาการและสุขภาพเด็กของสมเด็จพระ กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ เจ้าฟ้า มहाจักรีสิรินธรฯ สยามบรมราชกุมารี	200,000.00	-	-	1 ก.ค. 67	30 ก.ย. 67	✓			-	200,000.00	✓	
121	โครงการบันทึกพิกัดแผนที่ทางภูมิศาสตร์ (GPS) ผู้รับเบี้ย ผู้สูงอายุและผู้พิการเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี	25,000.00	-	-	1 เม.ย. 67	31 พ.ค. 67	✓			-	25,000.00	✓	
122	โครงการบริการรับลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุถึงที่บ้าน (At Home Service : Allowonce Registration)	10,000.00	-	-	1 พ.ค. 67	31 ส.ค. 67	✓			-	10,000.00	✓	

รายงานผลการดำเนินงานโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
ณ ไตรมาสที่ 1/2567 (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566)

แบบรายงาน 2.1

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	ระยะเวลาที่กำหนดไว้ ตามแผนดำเนินงาน		สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การดำเนินการตาม แผนการดำเนินงาน	
							ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			เป็นไป ตามที่กำหนด	ไม่เป็นไป ตามที่กำหนด
					วันที่เริ่มต้น	วันที่สิ้นสุด							
123	โครงการบริการทำบัตรประจำตัวคนพิการที่บ้านและส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (At Home Service: ID Card Registration for Person with Disabilities)	50,000.00	-	-	1 ต.ค. 66	30 ก.ย. 67		ลงพื้นที่ทำบัตรให้กับคนพิการ		-	50,000.00	✓	
124	โครงการทำหมันสุนัข/แมวจรจัด ที่อาศัยในวัด 15 วัด และชุมชน 70 ชุมชน	200,000.00	-	-	1 พ.ย. 66	31 ส.ค. 67		อยู่ระหว่างการจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์		-	200,000.00	✓	
125	โครงการตลาดนัด ตลาดน้ำ บ้านดอน	200,000.00	-	-	1 ต.ค. 66	30 ก.ย. 67		ดำเนินโครงการตลอดทั้งปี		25,200.00	174,800.00	✓	
126	โครงการช่วยเหลือประชาชนด้านสาธารณสุข	800,000.00	-	-	1 ต.ค. 66	30 ก.ย. 67		ดำเนินการเมื่อมีเหตุสาธารณสุข		-	800,000.00	✓	
127	โครงการช่วยลดการติดเอดส์จากแม่สู่ลูกสภากาชาดไทย พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ	200,000.00	-	-	1 พ.ค. 67	1 ก.ค. 67	✓			-	200,000.00	✓	
128	โครงการจัดตั้งศูนย์เฉพาะกิจช่วยเหลือผู้ประสบภัยในช่วงเทศกาล	50,000.00	-	-	1 ธ.ค. 66	30 เม.ย. 67		จัดตั้งศูนย์ร่วมเฉพาะกิจและช่วยเหลือผู้ประสบภัยในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2567		-	50,000.00	✓	
129	โครงการขับเคลื่อนกิจกรรมสภาเด็กและเยาวชนเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี	40,000.00	-	-	1 ต.ค. 66	30 ก.ย. 67		ส่งใช้เงินยืม		4,200.00	35,800.00	✓	
130	โครงการก่อสร้างสถานีดับเพลิงหน่วยย่อย (สวนหลวง ร.9)	4,500,000.00	-	-	1 ธ.ค. 66	30 ก.ย. 67	✓			-	4,500,000.00		✓
131	โครงการก่อสร้างศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี (ปทุมพร)	27,500,000.00	-	-	1 ต.ค. 66	30 ก.ย. 67	✓			-	27,500,000.00		✓
รวม		45,694,600.00	-	-						1,208,198.52	44,486,401.48		
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา การกีฬา ศาสนา ประเพณีและวัฒนธรรม													
132	โครงการเข้าร่วมงานชุมนุมของลูกเสือท้องถิ่นไทย	80,000.00	-	-	1 ต.ค. 66	30 ก.ย. 67	✓			-	80,000.00		✓
133	โครงการอุดหนุนค่าอาหารกลางวันสำหรับโรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี	7,700,000.00	-	-	1 ต.ค. 66	30 ก.ย. 67		ขออนุมัติเบิกจ่าย		3,830,200.00	3,869,800.00	✓	
134	โครงการอุดหนุนค่าอาหารกลางวันสำหรับโรงเรียนวัดโพธิ์นิมิต	1,408,000.00	-	-	1 ต.ค. 66	30 ก.ย. 67		ขออนุมัติเบิกจ่าย		644,600.00	763,400.00	✓	

รายงานผลการดำเนินงานโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
ณ ไตรมาสที่ 1/2567 (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566)

แบบรายงาน 2.1

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	ระยะเวลาที่กำหนดไว้ ตามแผนดำเนินงาน		สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การดำเนินการตาม แผนการดำเนินงาน	
							ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			เป็นไป ตามที่กำหนด	ไม่เป็นไป ตามที่กำหนด
					วันที่เริ่มต้น	วันที่สิ้นสุด							
135	โครงการอุดหนุนค่าอาหารกลางวันสำหรับโรงเรียนวัดท่าทอง	1,144,000.00	-	-	1 ต.ค. 66	30 ก.ย. 67		ขออนุมัติเบิกจ่าย		567,600.00	576,400.00	✓	
136	โครงการอุดหนุนค่าอาหารกลางวันสำหรับโรงเรียนวัดกลางใหม่	1,012,000.00	-	-	1 ต.ค. 66	30 ก.ย. 67		ขออนุมัติเบิกจ่าย		418,000.00	594,000.00	✓	
137	โครงการอุดหนุนค่าอาหารกลางวันสำหรับโรงเรียนบ้านโพหวาย	1,540,000.00	-	-	1 ต.ค. 66	30 ก.ย. 67		ขออนุมัติเบิกจ่าย		644,600.00	895,400.00	✓	
138	โครงการอุดหนุนค่าอาหารกลางวันสำหรับโรงเรียนบ้านสุชน	528,000.00	-	-	1 ต.ค. 66	30 ก.ย. 67		ขออนุมัติเบิกจ่าย		268,800.00	259,200.00	✓	
139	โครงการอุดหนุนค่าอาหารกลางวันสำหรับโรงเรียนบ้านสันติสุข	616,000.00	-	-	1 ต.ค. 66	30 ก.ย. 67		ขออนุมัติเบิกจ่าย		279,400.00	336,600.00	✓	
140	โครงการอุดหนุนค่าอาหารกลางวันสำหรับโรงเรียนบ้านบางใหญ่	968,000.00	-	-	1 ต.ค. 66	30 ก.ย. 67		ขออนุมัติเบิกจ่าย		517,000.00	451,000.00	✓	
141	โครงการอบรมผู้นำนักเรียน	50,000.00	-	-	1 พ.ย. 66	29 ก.พ. 67		ขออนุมัติดำเนิน โครงการ		-	50,000.00	✓	
142	โครงการอบรมการผลิตและใช้สื่อการเรียนการสอน	80,000.00	-	-	1 ต.ค. 66	31 ธ.ค. 66	✓			-	80,000.00		✓
143	โครงการห้องสมุดเคลื่อนที่	100,000.00	-	-	1 ต.ค. 66	30 ก.ย. 67		จัดกิจกรรมออกหน่วย ตามโรงเรียน		-	100,000.00	✓	
144	โครงการส่งเสริมและส่งเสริมเข้าร่วมการแข่งขันเรือพาย	50,000.00	-	-	1 ต.ค. 66	30 ก.ย. 67		ส่งทีมเข้าร่วมแข่งขันตาม หนังสือเชิญ		-	50,000.00	✓	
145	โครงการส่งเสริมและพัฒนาหอสมุดเฉลิมพระเกียรติฯ	250,000.00	-	-	1 ต.ค. 66	30 ก.ย. 67		แจ้งความประสงค์ จัดหาหนังสือ		-	250,000.00	✓	
146	โครงการส่งเสริมธุรการชั้นเรียนหลักสูตรแกนกลางการศึกษา ขั้นพื้นฐาน	300,000.00	-	-	1 ธ.ค. 66	31 พ.ค. 67		ขออนุมัติดำเนิน โครงการ		-	300,000.00	✓	
147	โครงการส่งเสริมกิจกรรมทางศาสนาและภูมิปัญญาท้องถิ่น	5,000.00	-	-	1 ม.ค. 67	30 ก.ย. 67	✓			-	5,000.00	✓	
148	โครงการส่งทีมโรงเรียนกีฬาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีเข้าร่วม แข่งขันรายการต่าง ๆ	300,000.00	-	-	1 ต.ค. 66	30 ก.ย. 67		ส่งทีมเข้าร่วมแข่งขันตาม หนังสือเชิญ		-	300,000.00	✓	
149	โครงการส่งทีมเข้าร่วมแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย ระดับภาค และระดับประเทศ	5,000,000.00	-	-	1 ม.ค. 67	30 ก.ย. 67	✓			-	5,000,000.00	✓	

รายงานผลการดำเนินงานโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
ณ ไตรมาสที่ 1/2567 (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566)

แบบรายงาน 2.1

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	ระยะเวลาที่กำหนดไว้ ตามแผนดำเนินงาน		สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การดำเนินการตาม แผนการดำเนินงาน	
							ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			เป็นไป ตามที่กำหนด	ไม่เป็นไป ตามที่กำหนด
					วันที่เริ่มต้น	วันที่สิ้นสุด							
150	โครงการส่งทีมกีฬา และกิจกรรมนันทนาการ ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีเข้าร่วมแข่งขันกับหน่วยงานอื่นๆ	200,000.00	-	-	1 ต.ค. 66	30 ก.ย. 67		ส่งทีมเข้าร่วมแข่งขันตามหนังสือเชิญ		55,630.00	144,370.00	✓	
151	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษา และการให้ความช่วยเหลือนักเรียน	700,000.00	-	-	1 ธ.ค. 66	30 ก.ย. 67	✓			-	700,000.00		✓
152	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (งานระดับมัธยม)	48,555,700.00	-	700,000.00	1 ต.ค. 66	30 ก.ย. 67		งานโรงเรียน อยู่ระหว่างขออนุมัติเบิกจ่าย, งานนิเทศก์ โอนไปตั้งจ่ายที่สถานศึกษา ไตรมาส 2		5,385,404.61	42,470,295.39	✓	
153	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (งานระดับก่อนวัยเรียน - ประถม)	30,807,100.00	-	-	1 ต.ค. 66	30 ก.ย. 67		งานโรงเรียน อยู่ระหว่างขออนุมัติเบิกจ่าย, งานนิเทศก์ โอนไปตั้งจ่ายที่สถานศึกษา ไตรมาส 2, งานนอกระบบฯ อยู่ระหว่างเบิกจ่ายเป็นงวด		8,693,528.00	22,113,572.00	✓	
154	โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชน	100,000.00	-	-	1 พ.ค. 67	31 ส.ค. 67	✓			-	100,000.00	✓	
155	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารประชาชนภูมิ 2	1,429,600.00	-	-	1 ม.ค. 67	31 พ.ค. 67	✓			-	1,429,600.00	✓	
156	โครงการประเมินผลนักเรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน	900,000.00	-	-	1 ต.ค. 66	30 ก.ย. 67		เบิกค่าวัสดุทำข้อสอบระหว่างภาค 2/66		260,120.00	639,880.00	✓	
157	โครงการประเมินคุณภาพการจัดการศึกษา	200,000.00	-	-	1 ต.ค. 66	30 ก.ย. 67	✓			-	200,000.00		✓
158	โครงการประชุมคณะกรรมการประสานงานวิชาการการจัดการศึกษาท้องถิ่นระดับเทศบาล	80,000.00	-	-	1 ม.ค. 67	31 ส.ค. 67	✓			-	80,000.00	✓	
159	โครงการประชาสัมพันธ์การจัดการศึกษาของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี	1,000,000.00	-	-	1 ต.ค. 66	30 ก.ย. 67		เบิกค่าใช้จ่ายงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนฯ		25,600.00	974,400.00	✓	
160	โครงการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา	80,000.00	-	-	1 ม.ค. 67	30 ก.ย. 67	✓			-	80,000.00	✓	
161	โครงการจัดแข่งขันกีฬานักเรียนอนุบาล	200,000.00	-	-	1 ม.ค. 67	30 ก.ย. 67	✓			-	200,000.00	✓	
162	โครงการจัดอบรมเด็กและเยาวชนภาคฤดูร้อน	500,000.00	-	-	1 ม.ค. 67	30 มิ.ย. 67	✓			-	500,000.00	✓	
163	โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์	650,000.00	-	-	1 เม.ย. 67	30 เม.ย. 67	✓			-	650,000.00	✓	
164	โครงการจัดงานประเพณีวันขึ้นปีใหม่	250,000.00	-	-	1 ธ.ค. 66	31 ม.ค. 67	✓			-	250,000.00		✓

รายงานผลการดำเนินงานโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
ณ ไตรมาสที่ 1/2567 (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566)

แบบรายงาน 2.1

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	ระยะเวลาที่กำหนดไว้ ตามแผนดำเนินงาน		สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การดำเนินการตาม แผนการดำเนินงาน	
							ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			เป็นไป ตามที่กำหนด	ไม่เป็นไป ตามที่กำหนด
					วันที่เริ่มต้น	วันที่สิ้นสุด							
165	โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง	1,700,000.00	-	-	1 พ.ย. 66	30 พ.ย. 66		รอเบิกจ่ายงบประมาณ		1,330,200.00	369,800.00	✓	
166	โครงการจัดงานประเพณีชักพระ-ทอดผ้าป่าและแข่งเรือยาว	7,000,000.00	-	-	1 ต.ค. 66	30 พ.ย. 66			✓	5,809,348.00	1,190,652.00	✓	
167	โครงการจัดงาน/กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ/เทิดพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรม ราชินีและพระบรมวงศานุวงศ์	300,000.00	-	-	1 ต.ค. 66	30 ก.ย. 67		จัดกิจกรรมวันสำคัญ ต่าง ๆ ภายใน ปีงบประมาณ		201,640.00	98,360.00	✓	
168	โครงการจัดกิจกรรมฉลองวันเด็กแห่งชาติ	350,000.00	-	-	1 ต.ค. 66	29 ก.พ. 67		จัดเตรียมงานวันเด็ก		-	350,000.00	✓	
169	โครงการจัดการแข่งขันกีฬาเด็ก เยาวชนและประชาชน	800,000.00	-	-	1 ม.ค. 67	30 ก.ย. 67	✓			-	800,000.00	✓	
170	โครงการจัดการแข่งขันกรีฑาโรงเรียนในสังกัดเทศบาล นครสุราษฎร์ธานี	300,000.00	-	-	1 ม.ค. 67	30 ก.ย. 67	✓			-	300,000.00	✓	
171	โครงการก่อสร้างอาคารเรียน ค.ส.ล. 4 ชั้น 12 ห้อง	15,000,000.00	-	-	1 ม.ค. 67	30 ก.ย. 67	✓			-	15,000,000.00	✓	
172	โครงการก่อสร้างหลังคาคลุมลานอเนกประสงค์ (หลังที่ 3) โรงเรียน เทศบาล 4 (วัดโพธาราม)	4,130,000.00	-	-	1 ม.ค. 67	31 ก.ค. 67	✓			-	4,130,000.00	✓	
173	โครงการก่อสร้างลานจอดรถ	1,640,500.00	-	-	1 ม.ค. 67	31 พ.ค. 67	✓			-	1,640,500.00	✓	
174	โครงการอุดหนุนมูลนิธิมุทิตาจิตธรรมสถาน	100,000.00	-	-	1 ต.ค. 66	31 ต.ค. 66			✓	100,000.00	-	✓	
175	โครงการอุดหนุนมูลนิธิกุศลศรัทธา	100,000.00	-	-	1 ต.ค. 66	31 ต.ค. 66			✓	100,000.00	-	✓	
176	โครงการอุดหนุนมัสยิดอิกอมะตุลอิสลาม (บ้านปากน้ำ)	400,000.00	-	-	1 เม.ย. 67	30 ก.ย. 67	✓			-	400,000.00	✓	
177	โครงการจ้างออกแบบเสาประติมากรรมคุณธรรม	60,000.00	-	-	1 ต.ค. 66	29 ก.พ. 67	✓			-	60,000.00		✓
รวม		138,663,900.00	-	700,000.00						29,131,670.61	108,832,229.39		
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี													
178	โครงการให้ความรู้ด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องในชีวิตประจำวัน	80,000.00	-	-	1 เม.ย. 67	30 มิ.ย. 67	✓			-	80,000.00	✓	
179	โครงการเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีพบชุมชน	400,000.00	-	-	1 ม.ค. 67	30 ก.ย. 67		ขออนุมัติดำเนินโครงการ และกำหนดสถานที่จัดงาน		-	400,000.00	✓	
180	โครงการเชื่อมต่อโปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินกับ สำนักงานทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี	100,000.00	-	-	1 ต.ค. 66	30 ก.ย. 67	✓			-	100,000.00		✓
181	โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในองค์กร ด้านการจัดการ ขยะมูลฝอยแบบบูรณาการ	530,000.00	-	-	1 มิ.ย. 67	31 ก.ค. 67	✓			-	530,000.00	✓	

รายงานผลการดำเนินงานโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
ณ ไตรมาสที่ 1/2567 (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566)

แบบรายงาน 2.1

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	ระยะเวลาที่กำหนดไว้ ตามแผนดำเนินงาน		สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การดำเนินการตาม แผนการดำเนินงาน	
							ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			เป็นไป ตามที่กำหนด	ไม่เป็นไป ตามที่กำหนด
					วันที่เริ่มต้น	วันที่สิ้นสุด							
182	โครงการปรับปรุงและสำรวจข้อมูลการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	300,000.00	-	-	1 ต.ค. 66	30 ก.ย. 67	✓			-	300,000.00		✓
183	โครงการประชาสัมพันธ์การชำระภาษีท้องถิ่น	200,000.00	-	-	1 ต.ค. 66	30 ก.ย. 67		จัดทำป้าย ประชาสัมพันธ์และ สื่อประชาสัมพันธ์ทุก ช่องทาง		12,000.00	188,000.00	✓	
184	โครงการประกวดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหาร จัดการที่ดี	40,000.00	-	-	1 ม.ค. 67	30 ก.ย. 67		รวบรวมเอกสารส่ง เข้าประกวด		-	40,000.00	✓	
185	โครงการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนคร สุราษฎร์ธานี	30,000.00	-	-	1 ต.ค. 66	30 ก.ย. 67		ติดตามผลการเบิกจ่าย งบประมาณและผลการ ดำเนินโครงการ ประจำเดือน ธ.ค. 2566 และขออนุมัติจัดทำสำเนา เล่มรายงานติดตามและ ประเมินผลแผนพัฒนา เทศบาลฯ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2566 เพื่อแจกจ่ายให้สำนัก/กอง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง		3,335.00	26,665.00	✓	
186	โครงการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น และเพิ่มเติม/ เปลี่ยนแปลง	350,000.00	-	-	1 ต.ค. 66	30 ก.ย. 67		จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.256-2570) เพิ่มเติม/ เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 4/2566		4,150.00	345,850.00	✓	
187	โครงการจัดทำแผนการดำเนินงานประจำปีและเพิ่มเติม/ เปลี่ยนแปลง/แก้ไข	70,000.00	-	-	1 ต.ค. 66	30 ก.ย. 67		จัดทำแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (เพิ่มเติม ครั้งที่ 2)		30,015.00	39,985.00	✓	
188	โครงการจัดกิจกรรมการให้บริการสาธารณะเชิงบูรณาการเนื่องใน วันเทศบาล	80,000.00	-	-	1 เม.ย. 67	30 เม.ย. 67	✓			-	80,000.00	✓	

รายงานผลการดำเนินงานโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
ณ ไตรมาสที่ 1/2567 (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566)

แบบรายงาน 2.1

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	ระยะเวลาที่กำหนดไว้ ตามแผนดำเนินงาน		สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การดำเนินการตาม แผนการดำเนินงาน	
							ยังไม่	ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการ			เป็นไป ตามที่กำหนด	ไม่เป็นไป ตามที่กำหนด
					วันที่เริ่มต้น	วันที่สิ้นสุด	ดำเนินการ	(อยู่ในขั้นตอน)	เสร็จสิ้น				
189	โครงการจัดกิจกรรมการให้บริการสาธารณะเชิงบูรณาการ เนื่องในวันท้องถิ่นไทย "18 มีนา วันท้องถิ่นไทย	10,000.00	-	-	1 มี.ค. 67	31 มี.ค. 67	✓			-	10,000.00	✓	
190	โครงการก่อสร้างป้ายประชาสัมพันธ์ ชนิดโครงสร้างเหล็ก บริเวณสี่แยกเทศบาล	500,000.00	-	-	1 ต.ค. 66	31 มี.ค. 67		อยู่ระหว่างการ ออกแบบ		-	500,000.00	✓	
191	โครงการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนคร สุราษฎร์ธานี (จ้างที่ปรึกษา)	250,000.00	-	-	1 ต.ค. 66	30 ก.ย. 67		จัดทำร่างขอบเขตของ งาน (TOR)		-	250,000.00	✓	
รวม		2,940,000.00	-	-						49,500.00	2,890,500.00		
รวมทุกยุทธศาสตร์		207,684,770.00	-	700,000.00						30,851,562.10	176,133,207.90		

รายงานผลการดำเนินงานโครงการที่จ่ายจากเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
ณ ไตรมาสที่ 1/2567 (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566)

แบบรายงาน 2.2

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาที่กำหนดไว้ตามแผน ดำเนินงาน		สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การดำเนินการตาม แผนการดำเนินงาน	
			วันที่เริ่มต้น	วันที่สิ้นสุด	ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			เป็นไป ตามที่กำหนด	ไม่เป็นไป ตามที่กำหนด
1.ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน											
1	โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติก คอนกรีตถนนสันติสุข	1,163,000.00	1 ธ.ค. 66	29 ก.พ. 67		ขออนุมัติจ้างเหมา		-	1,163,000.00	✓	
2	โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติก คอนกรีตถนนสันติสุข แยกขวา 1	3,255,000.00	1 ธ.ค. 66	29 ก.พ. 67		ขออนุมัติจ้างเหมา		-	3,255,000.00	✓	
3	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจรถนน สันติสุข	8,905,000.00	1 ก.พ. 67	31 มี.ค. 67	✓			-	8,905,000.00	✓	
4	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจร ซอย ข้าง หจก. ดีเอิร์ธทรานสปอร์ต	2,000,000.00	1 ก.พ. 67	31 มี.ค. 67	✓			-	2,000,000.00	✓	
5	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจรถนน เสม็ดเรียง 22	2,328,000.00	1 ก.พ. 67	31 มี.ค. 67	✓			-	2,328,000.00	✓	
6	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจรถนน ตลาดล่าง 18	947,000.00	1 ก.พ. 67	31 มี.ค. 67	✓			-	947,000.00	✓	
7	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจรถนน สุขน 1 ซอย 3	495,000.00	1 ก.พ. 67	31 มี.ค. 67	✓			-	495,000.00	✓	
8	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจรถนน สุขน 1 ซอยสุทธิรักษ์	8,070,000.00	1 ก.พ. 67	31 มี.ค. 67	✓			-	8,070,000.00	✓	
9	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจรถนน เสม็ดเรียง 4	3,490,000.00	1 ก.พ. 67	31 มี.ค. 67	✓			-	3,490,000.00	✓	
10	โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติก คอนกรีตถนนยางงาม 2/1 เชื่อมถนนกาญจนาภิเษก 7	1,980,000.00	1 ม.ค. 67	31 มี.ค. 67	✓			-	1,980,000.00	✓	
รวม		32,633,000.00						-	32,633,000.00		
รวมทุกยุทธศาสตร์		32,633,000.00						-	32,633,000.00		

บัญชีรายละเอียด
ผลการดำเนินโครงการที่จ่ายจากเงินสะสม



สรุปผลการดำเนินโครงการที่จ่ายจากเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565-2566 ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

ณ ไตรมาสที่ 1/2567 (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566)

จำนวนโครงการที่จ่ายจากเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565-2566 ที่ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ มีทั้งหมด **21 โครงการ**
งบประมาณรวมทั้งสิ้น **250,648,000 บาท** (สองร้อยห้าสิบล้านหกแสนสี่หมื่นแปดพันบาทถ้วน) มีรายละเอียดผลการดำเนินงาน ดังนี้

โครงการที่จ่ายจากเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำนวน **9 โครงการ** งบประมาณ **200,368,000 บาท**

ยุทธศาสตร์	รวมทั้งสิ้น			ดำเนินการเสร็จสิ้น			ระหว่างดำเนินการ			ยังไม่ดำเนินการ		โครงการที่ยกเลิก	
	โครง	งบประมา	งบประมา	โครง	งบประมา	งบประมา	โครง	งบประมา	งบประมา	โครง	งบประมา	โครง	งบประมา
	การ	ที่ตั้งไว้	ที่เบิกจ่าย	การ	ที่ตั้งไว้	ที่เบิกจ่าย	การ	ที่ตั้งไว้	ที่เบิกจ่าย	การ	ที่ตั้งไว้	การ	ที่ตั้งไว้
1.ด้านโครงสร้างพื้นฐาน	9	200,368,000.00	46,520,498.94	3	5,460,000.00	4,965,932.00	6	194,908,000.00	41,554,566.94	-	-	-	-
รวม	9	200,368,000.00	46,520,498.94	3	5,460,000.00	4,965,932.00	6	194,908,000.00	41,554,566.94	-	-	-	-
คิดเป็นร้อยละ	100.00			33.33			66.67			0.00		0.00	

โครงการที่จ่ายจากเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จำนวน **12 โครงการ** งบประมาณ **50,280,000 บาท**

ยุทธศาสตร์	รวมทั้งสิ้น			ดำเนินการเสร็จสิ้น			ระหว่างดำเนินการ			ยังไม่ดำเนินการ		โครงการที่ยกเลิก	
	โครง	งบประมา	งบประมา	โครง	งบประมา	งบประมา	โครง	งบประมา	งบประมา	โครง	งบประมา	โครง	งบประมา
	การ	ที่ตั้งไว้	ที่เบิกจ่าย	การ	ที่ตั้งไว้	ที่เบิกจ่าย	การ	ที่ตั้งไว้	ที่เบิกจ่าย	การ	ที่ตั้งไว้	การ	ที่ตั้งไว้
1.ด้านโครงสร้างพื้นฐาน	12	50,280,000.00	6,139,000	1	8,568,000.00	6,139,000.00	11	41,712,000.00	-	-	-	-	-
รวม	12	50,280,000.00	6,139,000	1	8,568,000.00	6,139,000.00	11	41,712,000.00	-	-	-	-	-
คิดเป็นร้อยละ	100.00			8.33			91.67			0.00		0.00	

รวม	21	250,648,000.00	52,659,498.94	4	14,028,000.00	11,104,932.00	17	236,620,000.00	41,554,567	-	-	-	-
คิดเป็นร้อยละ	100.00			19.05			80.95			0.00		0.00	

รายงานผลการดำเนินงานโครงการที่จ่ายจากเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ที่ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ) ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
ณ ไตรมาสที่ 1/2567 (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566)

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาที่กำหนดไว้ตาม แผนดำเนินงาน		สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การดำเนินการตาม แผนการดำเนินงาน	
					ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			เป็นไป ตามที่กำหนด	ไม่เป็นไป ตามที่กำหนด
			วันที่เริ่มต้น	วันที่สิ้นสุด							
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน											
1	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจร ถนนโกลกัรัฐ 18/2	1,960,000.00	1 มิ.ย. 65	30 ก.ย. 65			✓	1,700,000.00	260,000.00		✓
2	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจร ถนนกาญจนวลิ 30 ตอน 3	6,200,000.00	1 ก.ค. 65	31 ธ.ค. 65		ส่งงานงวดที่ 1 เนื้องาน 50%		-	6,200,000.00		✓
3	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจร ถนนชนเกษม 29 ตอน 2	3,500,000.00	1 มิ.ย. 65	30 ก.ย. 65		อยู่ระหว่างดำเนินการ ก่อสร้าง เนื้องาน 5%		-	3,500,000.00		✓
4	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจร ถนนอำเภอ 15/1	2,600,000.00	1 ก.ค. 65	31 ต.ค. 65			✓	2,472,000.00	128,000.00		✓
5	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจร ถนนศรีเกษม 20 แยกขวา 3	1,800,000.00	1 ก.ค. 65	31 ธ.ค. 65		บริหารสัญญา เนื้องาน 64%		-	1,800,000.00		✓
6	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจร ถนนศรีวิชัย 21/20	950,000.00	1 มิ.ย. 65	31 ส.ค. 65		อยู่ระหว่างดำเนินการ ก่อสร้าง เนื้องาน 7.41%		-	950,000.00		✓
7	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจร ถนนพ้อขุนทะเล 10/7 แยกซ้าย 2	900,000.00	1 มิ.ย. 65	31 ส.ค. 65			✓	793,932.00	106,068.00		✓
8	โครงการปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้าเป็น เคเบิลใต้ดินบริเวณถนนชนเกษม	67,468,000.00	1 มิ.ย. 65	30 ก.ย. 65		อยู่ระหว่างดำเนินการ ก่อสร้าง เบิกจ่ายงวดที่ 3 เมื่อวันที่ 15 ธ.ค. 66		21,608,374.81	45,859,625.19		✓
9	โครงการปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้าเป็น เคเบิลใต้ดินบริเวณถนนตลาดใหม่	114,990,000.00	1 มิ.ย. 65	30 ก.ย. 65		อยู่ระหว่างดำเนินการ ก่อสร้าง เบิกจ่ายงวดที่ 3 เมื่อวันที่ 15 ธ.ค. 66		19,946,192.13	95,043,807.87		✓
รวม		200,368,000.00						46,520,498.94	153,847,501.06		
รวมทุกยุทธศาสตร์		200,368,000.00						46,520,498.94	153,847,501.06		

รายงานผลการดำเนินงานโครงการที่จ่ายจากเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ที่ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ) ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
ณ ไตรมาสที่ 1/2567 (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566)


ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาที่กำหนดไว้ตามแผน ดำเนินงาน		สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การดำเนินการตาม แผนการดำเนินงาน	
			วันที่เริ่มต้น	วันที่สิ้นสุด	ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			เป็นไป ตามที่กำหนด	ไม่เป็นไป ตามที่กำหนด
1.ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน											
1	โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนตลาดล่าง STA 0+670-2+315	8,568,000.00	1 ม.ค. 66	31 มี.ค. 66			✓	6,139,000.00	2,429,000.00		✓
2	โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนศรีวิชัย ซอย 59	1,994,000.00	1 ม.ค. 66	31 มี.ค. 66		ทำสัญญาจ้าง วันที่ 1 ธ.ค. 2566 หจก.ภักสุธิโกศล เข้าดำเนินการ เดือน ม.ค. 2567		-	1,994,000.00		✓
3	โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนเปรมฤดี	1,011,000.00	1 ม.ค. 66	31 มี.ค. 66		ทำสัญญาจ้าง วันที่ 1 ธ.ค. 2566 หจก.ภักสุธิโกศล เข้าดำเนินการ เดือน ม.ค. 2567		-	1,011,000.00		✓
4	โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนชนเกษม 49 STA 0+460-1+000	1,865,000.00	1 ม.ค. 66	31 มี.ค. 66		ทำสัญญาจ้าง วันที่ 1 ธ.ค. 2566 หจก.ภักสุธิโกศล เข้าดำเนินการ เดือน ม.ค. 2567		-	1,865,000.00		✓
5	โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนบางใหญ่ 16	410,000.00	1 ม.ค. 66	31 มี.ค. 66		ทำสัญญาจ้าง วันที่ 1 ธ.ค. 2566 หจก.ภักสุธิโกศล เข้าดำเนินการ เดือน ม.ค. 2567		-	410,000.00		✓
6	โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนบางใหญ่ 21	308,000.00	1 ม.ค. 66	31 มี.ค. 66		ทำสัญญาจ้าง วันที่ 1 ธ.ค. 2566 หจก.ภักสุธิโกศล เข้าดำเนินการ เดือน ม.ค. 2567		-	308,000.00		✓
7	โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนบางใหญ่ 23	218,000.00	1 ม.ค. 66	31 มี.ค. 66		ทำสัญญาจ้าง วันที่ 1 ธ.ค. 2566 หจก.ภักสุธิโกศล เข้าดำเนินการ เดือน ม.ค. 2567		-	218,000.00		✓

รายงานผลการดำเนินงานโครงการที่จ่ายจากเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ที่ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ) ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
ณ ไตรมาสที่ 1/2567 (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566)

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาที่กำหนดไว้ตามแผน ดำเนินงาน		สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การดำเนินการตาม แผนการดำเนินงาน	
			วันที่เริ่มต้น	วันที่สิ้นสุด	ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			เป็นไป ตามที่กำหนด	ไม่เป็นไป ตามที่กำหนด
8	โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนเปรมจิตประชา	1,372,000.00	1 ก.พ. 66	30 เม.ย. 66		ทำสัญญาจ้าง วันที่ 1 ธ.ค. 2566 หจก.ภักสุธิโกศล เข้าดำเนินการ เดือน ม.ค. 2567		-	1,372,000.00		✓
9	โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนท่าโรงช้าง STA 0+000-1+398	7,662,000.00	1 ส.ค. 66	31 ธ.ค. 66		ส่งราคากลางให้ฝ่าย พัสดุดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง		-	7,662,000.00	✓	
10	โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบแอสฟัลท์คอนกรีต (Over-lay) ถนนโกลธรร (ชุมชนหนองบัว,ชุมชนศรีธานี-ยาง งาม,ชุมชนค่าย อส.)	19,800,000.00	1 มิ.ย. 66	30 ก.ย. 66		บริหารสัญญา ผลงาน 37%		-	19,800,000.00		✓
11	โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบแอสฟัลท์คอนกรีต (Over-lay) ถนนพ้อขุนทะเล จากแยกตาปานช่วงที่ 1 (Sta 0+000 ถึง Sta 1+100) (ชุมชนบึงขุนทะเล)	6,200,000.00	1 มิ.ย. 66	30 ก.ย. 66		บริหารสัญญา ผู้รับจ้าง ยังไม่เข้าดำเนินการ		-	6,200,000.00		✓
12	โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบแอสฟัลท์คอนกรีต ถนนดีเหล็กและซอยแยก (ตลาดศาลเจ้า) (ชุมชนวัดไทร)	872,000.00	1 มิ.ย. 66	30 ก.ย. 66		จัดทำราคากลาง ครั้งที่ 2 ในระบบ e-GP		-	872,000.00		✓
รวม		50,280,000.00						6,139,000.00	44,141,000.00		
รวมทุกยุทธศาสตร์		50,280,000.00						6,139,000.00	44,141,000.00		

บัญชีรายละเอียด

ผลการดำเนินโครงการที่ขออนุมัติกันเงินไว้ (ที่ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564-2566



สรุปผลการดำเนินโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566
 ที่ขออนุมัติกันเงินไว้ (ที่ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ)
 ณ ไตรมาสที่ 1/2567 (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566)

จำนวนโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566 ที่ขออนุมัติกันเงินไว้ และยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ มีทั้งหมด 77 โครงการ
 งบประมาณ 149,312,519 บาท (หนึ่งร้อยสี่สิบเก้าล้านสามแสนหนึ่งหมื่นสองพันห้าร้อยสิบเก้าบาทถ้วน) มีรายละเอียดผลการดำเนินงาน ดังนี้

1. โครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ที่ขออนุมัติกันเงินไว้ มีโครงการที่ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ จำนวน 1 โครงการ งบประมาณที่กันเงินไว้ 23,900,000 บาท

ยุทธศาสตร์	รวมทั้งสิ้น			ดำเนินการเสร็จสิ้น			ระหว่างดำเนินการ			ยังไม่ดำเนินการ		โครงการที่ยกเลิก	
	โครงการ	งบประมาณที่กันเงินไว้	งบประมาณที่เบิกจ่าย	โครงการ	งบประมาณที่กันเงินไว้	งบประมาณที่เบิกจ่าย	โครงการ	งบประมาณที่กันเงินไว้	งบประมาณที่เบิกจ่าย	โครงการ	งบประมาณที่กันเงินไว้	โครงการ	งบประมาณที่กันเงินไว้
6. ด้านการบริหารจัดการที่ดี	1	23,900,000.00	2,390,000.00	-	-	-	1	23,900,000.00	2,390,000.00	-	-	-	-
รวม	1	23,900,000.00	2,390,000.00	-	-	-	1	23,900,000.00	2,390,000.00	-	-	-	-
คิดเป็นร้อยละ	100.00			0.00			100.00			0.00		0.00	

2. โครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ที่ขออนุมัติกันเงินไว้ มีโครงการที่ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ จำนวน 28 โครงการ งบประมาณที่กันเงินไว้ 39,787,000 บาท

ยุทธศาสตร์	รวมทั้งสิ้น			ดำเนินการเสร็จสิ้น			ระหว่างดำเนินการ			ยังไม่ดำเนินการ		โครงการที่ยกเลิก	
	โครงการ	งบประมาณที่กันเงินไว้	งบประมาณที่เบิกจ่าย	โครงการ	งบประมาณที่กันเงินไว้	งบประมาณที่เบิกจ่าย	โครงการ	งบประมาณที่กันเงินไว้	งบประมาณที่เบิกจ่าย	โครงการ	งบประมาณที่กันเงินไว้	โครงการ	งบประมาณที่กันเงินไว้
1. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน	26	34,252,000.00	4,879,269.00	13	6,202,000.00	4,879,269.00	13	28,050,000.00	-	-	-	-	-
5. ด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น	2	5,535,000.00	1,836,678.00	1	2,700,000.00	1,836,678.00	1	2,835,000.00	-	-	-	-	-
รวม	28	39,787,000.00	6,715,947.00	14	8,902,000.00	6,715,947.00	14	30,885,000.00	-	-	-	-	-
คิดเป็นร้อยละ	100.00			50.00			50.00			0.00		0.00	

สรุปผลการดำเนินโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

ที่ขออนุมัติกันเงินไว้ (ที่ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ)

ณ ไตรมาสที่ 1/2567 (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566)

3. โครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ที่ขออนุมัติกันเงินไว้ มีโครงการที่ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ จำนวน 48 โครงการ งบประมาณที่กันเงินไว้ 85,625,519 บาท

ยุทธศาสตร์	รวมทั้งสิ้น			ดำเนินการเสร็จสิ้น			ระหว่างดำเนินการ			ยังไม่ดำเนินการ		โครงการที่ยกเลิก	
	โครงการ	งบประมาณที่กันเงินไว้	งบประมาณที่เบิกจ่าย	โครงการ	งบประมาณที่กันเงินไว้	งบประมาณที่เบิกจ่าย	โครงการ	งบประมาณที่กันเงินไว้	งบประมาณที่เบิกจ่าย	โครงการ	งบประมาณที่กันเงินไว้	โครงการ	งบประมาณที่กันเงินไว้
1. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน	36	70,518,519.00	992,700.00	2	1,104,000.00	992,700.00	34	69,414,519.00	-	-	-	-	-
3. ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	1	500,000.00	-	-	-	-	1	500,000.00	-	-	-	-	-
4. ด้านสวัสดิการสังคมและคุณภาพชีวิต	2	5,158,000.00	-	-	-	-	2	5,158,000.00	-	-	-	-	-
5. ด้านการศึกษา การกีฬา ศาสนา ประเพณีและวัฒนธรรม	6	7,849,000.00	298,000.00	1	527,000.00	298,000.00	5	7,322,000.00	-	-	-	-	-
6. ด้านการบริหารจัดการที่ดี	3	1,600,000.00	100,000.00	-	-	-	3	1,600,000.00	100,000.00	-	-	-	-
รวม	48	85,625,519.00	1,390,700.00	3	1,631,000.00	1,290,700.00	45	83,994,519.00	100,000.00	-	-	-	-
คิดเป็นร้อยละ		100.00			6.25			93.75		0.00			0.00
รวม	77	149,312,519.00	10,496,647.00	17	10,533,000.00	8,006,647.00	60	138,779,519.00	2,490,000.00	-	-	-	-
คิดเป็นร้อยละ		100.00			22.08			77.92		0.00			0.00

รายงานผลการดำเนินงานโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ที่ขออนุมัติกันเงินไว้ (ที่ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ) ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ณ ไตรมาสที่ 1/2567 (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566)												
ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณ ตามเทศ (บาท)	งบประมาณ ที่กันเงิน (บาท)	ระยะเวลาที่กำหนดไว้ตาม แผนดำเนินงาน		สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การดำเนินการตาม แผนการดำเนินงาน	
				วันที่เริ่มต้น	วันที่สิ้นสุด	ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			เป็นไป ตามที่กำหนด	ไม่เป็นไป ตามที่กำหนด
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี												
1	โครงการก่อสร้างศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลนคร สุราษฎร์ธานี (สวนหลวง ร. 9)	25,000,000.00	23,900,000.00	1 ต.ค. 64	30 ก.ย. 65		อยู่ระหว่างดำเนินการ ก่อสร้าง		2,390,000.00	21,510,000.00		✓
รวม		25,000,000.00	23,900,000.00						2,390,000.00	21,510,000.00		
รวมทุกยุทธศาสตร์		25,000,000.00	23,900,000.00						2,390,000.00	21,510,000.00		

รายงานผลการดำเนินงานโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ที่ขออนุมัติกันเงินไว้ (ที่ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ) ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

ณ ไตรมาสที่ 1/2567 (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566)

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณ ตามเทศบัญญัติ (บาท)	งบประมาณ ที่กันเงิน (บาท)	ระยะเวลาที่กำหนดไว้ตาม แผนดำเนินงาน		สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การดำเนินการตาม แผนการดำเนินงาน	
						ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			เป็นไป ตามที่กำหนด	ไม่เป็นไป ตามที่กำหนด
				วันที่เริ่มต้น	วันที่สิ้นสุด							
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน												
1	โครงการก่อสร้างทางเชื่อมถนนชนเกษม 43,45,47	1,500,000.00	1,152,000.00	1 ต.ค. 66	31 ธ.ค. 66		ก่อสร้าง 9% สิ้นหยุดงาน ตั้งแต่วันที่ 19 ธ.ค. 2565 อยู่ระหว่างเปรียบเทียบ ปริมาณงานเพื่อแก้ไข สัญญาจ้าง		-	1,152,000.00	✓	
2	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำถนนกาญจนาภิเษก (แยกถนนอำเภอถึงถนนเทพมิตร (ชุมชนศรีธานี-ยางงาม)	3,763,000.00	3,763,000.00	1 ต.ค. 65	31 ธ.ค. 65		ก่อสร้างแล้วเสร็จ รอการเบิกจ่าย		-	3,763,000.00		✓
3	โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนน ศรีเกษม ซอย 20	746,000.00	746,000.00	1 ม.ค. 66	31 พ.ค. 66			✓	500,000.00	246,000.00		✓
4	โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนน ชนเกษม ซอย 50/1	439,000.00	439,000.00	1 ม.ค. 66	31 พ.ค. 66			✓	400,000.00	39,000.00		✓
5	โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนน ชนเกษม ซอย 31	433,000.00	433,000.00	1 ม.ค. 66	31 พ.ค. 66			✓	400,000.00	33,000.00		✓
6	โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนน ราษฎร์อุทิศ ซอย 9	697,000.00	697,000.00	1 ม.ค. 66	31 พ.ค. 66			✓	510,000.00	187,000.00		✓
7	โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนน ดอนนก ซอย 16	112,000.00	112,000.00	1 ม.ค. 66	31 พ.ค. 66			✓	100,000.00	12,000.00		✓
8	โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนน ดอนนก ซอย 18	218,000.00	218,000.00	1 ม.ค. 66	31 พ.ค. 66			✓	200,000.00	18,000.00		✓
9	โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนน ดอนนก ซอย 20	504,000.00	504,000.00	1 ม.ค. 66	31 พ.ค. 66			✓	400,000.00	104,000.00		✓
10	โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนน ดอนนก ซอย 22	241,000.00	241,000.00	1 ม.ค. 66	31 พ.ค. 66			✓	200,000.00	41,000.00		✓

รายงานผลการดำเนินงานโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ที่ขออนุมัติกันเงินไว้ (ที่ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ) ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

ณ ไตรมาสที่ 1/2567 (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566)

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณ ตามเทศบัญญัติ (บาท)	งบประมาณ ที่กันเงิน (บาท)	ระยะเวลาที่กำหนดไว้ตาม แผนดำเนินงาน		สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การดำเนินการตาม แผนการดำเนินงาน	
						ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			เป็นไป ตามที่กำหนด	ไม่เป็นไป ตามที่กำหนด
				วันที่เริ่มต้น	วันที่สิ้นสุด							
11	โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนน ชนเกษม ซอย 41	694,000.00	694,000.00	1 ม.ค. 66	31 พ.ค. 66			✓	500,000.00	194,000.00		✓
12	โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนน รัฐรังสรรค์ ซอย 1	631,000.00	631,000.00	1 ม.ค. 66	31 พ.ค. 66			✓	500,000.00	131,000.00		✓
13	โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนน รัฐรังสรรค์ ซอย 2	571,000.00	571,000.00	1 ม.ค. 66	31 พ.ค. 66			✓	410,000.00	161,000.00		✓
14	โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนน สวนหลวง	592,000.00	592,000.00	1 ม.ค. 66	31 พ.ค. 66			✓	435,269.00	156,731.00		✓
15	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำถนนเลียงเมือง 8/1	800,000.00	800,000.00	1 ต.ค. 66	31 ธ.ค. 66		จัดทำแบบรูปและ ราคากลาง		-	800,000.00	✓	
16	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจร ถนนมายเทอเรส	770,000.00	770,000.00	1 ต.ค. 66	31 ธ.ค. 66		จัดทำแบบรูปและ ราคากลาง		-	770,000.00	✓	
17	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจร ถนนพ้อขุนทะเล 6	1,710,000.00	1,710,000.00	1 ต.ค. 66	31 ธ.ค. 66		อยู่ระหว่างเขียนแบบ แปลน		-	1,710,000.00	✓	
18	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจร ถนนราษฎร์อุทิศ 4	1,300,000.00	1,300,000.00	1 ต.ค. 66	31 ม.ค. 67		ขออนุมัติจ้างก่อสร้าง และส่งเอกสารจัดซื้อ จัดจ้างให้ฝ่ายพัสดุ เมื่อ วันที่ 28 พ.ย. 66		-	1,300,000.00	✓	
19	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำถนนศรีวิชัย 21/27	1,050,000.00	1,050,000.00	1 ต.ค. 66	31 ม.ค. 67		จัดทำแบบรูปและ ราคากลาง		-	1,050,000.00	✓	
20	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจร ถนนเสม็ดเรียง 1	3,200,000.00	3,200,000.00	1 ต.ค. 66	31 ม.ค. 67		จัดทำแบบรูปและ ราคากลาง		-	3,200,000.00	✓	

รายงานผลการดำเนินงานโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ที่ขออนุมัติกันเงินไว้ (ที่ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ) ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

ณ ไตรมาสที่ 1/2567 (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566)

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณ ตามเทศบัญญัติ (บาท)	งบประมาณ ที่กันเงิน (บาท)	ระยะเวลาที่กำหนดไว้ตาม แผนดำเนินงาน		สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การดำเนินการตาม แผนการดำเนินงาน	
				วันที่เริ่มต้น	วันที่สิ้นสุด	ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			เป็นไป ตามที่กำหนด	ไม่เป็นไป ตามที่กำหนด
21	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำถนนบุญช่วย 7	2,600,000.00	2,600,000.00	1 ต.ค. 66	31 ม.ค. 67		ขออนุมัติจ้างก่อสร้าง และส่งเอกสารจัดซื้อ จัดจ้างให้ฝ่ายพัสดุ เมื่อ วันที่ 28 พ.ย. 66		-	2,600,000.00	✓	
22	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจร ถนนศรีเกษม 2 แยกซ้าย 2,3	1,600,000.00	1,600,000.00	1 ต.ค. 66	31 ธ.ค. 66		ขออนุมัติจ้างก่อสร้าง และส่งเอกสารจัดซื้อ จัดจ้างให้ฝ่ายพัสดุ เมื่อ วันที่ 28 พ.ย. 66		-	1,600,000.00	✓	
23	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจร ถนนศรีเกษม 20 แยกซ้าย 2,3,4	4,600,000.00	4,600,000.00	1 ต.ค. 66	31 ม.ค. 67		ขออนุมัติจ้างก่อสร้าง และส่งเอกสารจัดซื้อ จัดจ้างให้ฝ่ายพัสดุ เมื่อ วันที่ 28 พ.ย. 66		-	4,600,000.00	✓	
24	โครงการขยายเขตประปา	3,805,000.00	3,805,000.00	1 ก.พ. 66	31 ส.ค. 66		อยู่ระหว่างดำเนินการ ก่อสร้าง ใช้งาน 75%		-	3,805,000.00		✓
25	โครงการก่อสร้างถนนคลองฉนาก - หัวแหลมพัฒนา(ทางเข้า ศาลพ่อตาหินกลิ้ง)	600,000.00	324,000.00	1 ต.ค. 66	30 พ.ย. 66			✓	324,000.00	-	✓	
26	โครงการก่อสร้างปรับปรุงทางเท้า ถนนอำเภอ ตั้งแต่ ร้านกำปั่น ถึงแยก รพช. (ชุมชนหนองบัว)	1,700,000.00	1,700,000.00	1 ต.ค. 66	31 ม.ค. 67		บริหารสัญญา ผู้รับจ้างยัง ไม่เข้าดำเนินการ		-	1,700,000.00	✓	
รวม		34,876,000.00	34,252,000.00						4,879,269.00	29,372,731.00		
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น												
27	โครงการปรับปรุงหลังคาและฝ้าเพดาน - อาคารตรีพูกษา - อาคารปฐมโพธิ์ - อาคารธรรมมาภิบาล โรงเรียนเทศบาล 4 (วัดโพธาราม)	2,700,000.00	2,700,000.00	1 ต.ค. 65	31 พ.ค. 66			✓	1,836,678.00	863,322.00		✓

รายงานผลการดำเนินงานโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ที่ขออนุมัติกันเงินไว้ (ที่ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ) ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

ณ ไตรมาสที่ 1/2567 (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566)

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณ ตามเทศบัญญัติ (บาท)	งบประมาณ ที่กันเงิน (บาท)	ระยะเวลาที่กำหนดไว้ตาม แผนดำเนินงาน		สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การดำเนินการตาม แผนการดำเนินงาน	
						ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			เป็นไป ตามที่กำหนด	ไม่เป็นไป ตามที่กำหนด
				วันที่เริ่มต้น	วันที่สิ้นสุด							
28	โครงการปรับปรุงห้องน้ำ-ห้องส้วม - อาคารตรีพุกษา - อาคารปฐมโพธิ์ - อาคารธรรมมาภิบาล โรงเรียนเทศบาล 4 (วัดโพธาราม)	2,835,000.00	2,835,000.00	1 ต.ค. 65	31 พ.ค. 66		อยู่ระหว่าง ดำเนินการก่อสร้าง		-	2,835,000.00		✓
รวม		5,535,000.00	5,535,000.00						1,836,678.00	3,698,322.00		
รวมทุกยุทธศาสตร์		40,411,000.00	39,787,000.00						6,715,947.00	33,071,053.00		

รายงานผลการดำเนินงานโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
ที่ขออนุมัติกันเงินไว้ (ที่ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ) ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
ณ ไตรมาสที่ 1/2567 (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566)

ลำดับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	งบประมาณ ที่กันเงิน (บาท)	ระยะเวลาที่กำหนดไว้ตาม แผนดำเนินงาน		สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การดำเนินการตาม แผนการดำเนินงาน	
					วันที่เริ่มต้น	วันที่สิ้นสุด	ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			เป็นไป ตามที่กำหนด	ไม่เป็นไป ตามที่กำหนด
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน													
1	สำนักช่าง	โครงการก่อสร้างสะพานทำเทียมเรือพร้อมท่อนขึ้นลง ชุมชนตลาดล่าง	660,000.00	660,000.00	1 ต.ค. 66	31 มี.ค. 67		อยู่ระหว่างการเขียนแบบแปลนเพื่อขออนุญาตเชื่อมต่อทางหลวง		-	660,000.00	✓	
2	สำนักช่าง	โครงการก่อสร้างสะพานทำเทียมเรือพร้อมท่อนขึ้นลง ชุมชนบางกุ้ง	720,000.00	720,000.00	1 พ.ย. 66	30 เม.ย. 67		ขออนุญาตทำสิ่งล่วงล้ำน้ำ		-	720,000.00	✓	
3	สำนักช่าง	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณถนนตอนนอก จากสี่แยกถนนมัยถึงสี่แยกแสงเพชร	9,100,000.00	9,100,000.00	1 ต.ค. 66	30 ก.ย. 67		ปรับแก้ไขแบบแปลน		-	9,100,000.00	✓	
4	สำนักช่าง	โครงการจ้างที่ปรึกษาเพื่อออกแบบปรับปรุงภูมิทัศน์บึงขุนทะเล	2,500,000.00	2,500,000.00	1 มี.ค. 66	30 ก.ย. 66		ผู้รับจ้างดำเนินการออกแบบ		-	2,500,000.00		✓
5	สำนักช่าง	โครงการขยายเขตประปา	1,680,519.00	1,680,519.00	1 ม.ค. 66	30 ก.ย. 66		จัดทำแบบรูปและราคากลาง		-	1,680,519.00		✓
6	สำนักช่าง	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำถนนตลาดใหม่ 3/1	187,000.00	187,000.00	1 ธ.ค. 66	29 ก.พ. 67		อยู่ระหว่างการปรับแบบแปลนให้ตรงกับความต้องการของชุมชน		-	187,000.00	✓	
7	สำนักช่าง	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและฝิวจรางถนนตลาดใหม่ 13	937,000.00	937,000.00	1 ธ.ค. 66	29 ก.พ. 67		อยู่ระหว่างขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง ครั้งที่ 2		-	937,000.00	✓	
8	สำนักช่าง	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและฝิวจรางถนนปทุมพร 6/2	555,000.00	555,000.00	1 มิ.ย. 66	30 ก.ย. 66			✓	523,300.00	31,700.00		✓
9	สำนักช่าง	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำถนนการเคหะต่อเนื่องถนนพหลโยธินเล 3	4,026,000.00	4,026,000.00	1 มิ.ย. 66	30 ก.ย. 66		จัดทำแบบรูปและราคากลาง		-	4,026,000.00		✓
10	สำนักช่าง	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและฝิวจรางถนนพหลโยธินเล 15/5	1,854,000.00	1,854,000.00	1 มิ.ย. 66	30 ก.ย. 66		ยกเลิกประกวดราคาจ้างเนื่องจากปัญหาของระบบจัดซื้อจัดจ้าง ทำให้ราคากลางไม่ถูกต้อง		-	1,854,000.00		✓
11	สำนักช่าง	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและฝิวจรางถนนตอนนอก 11 ซอยตรงข้ามสนามหญ้าเทียม	779,000.00	779,000.00	1 พ.ค. 66	30 ก.ย. 66		ก่อสร้างแล้วเสร็จ รอการเบิกจ่าย		-	779,000.00		✓

รายงานผลการดำเนินงานโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
ที่ขออนุมัติกันเงินไว้ (ที่ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ) ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
ณ ไตรมาสที่ 1/2567 (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566)

ลำดับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	งบประมาณ ที่กั้นเงิน (บาท)	ระยะเวลาที่กำหนดไว้ตาม แผนดำเนินงาน		สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การดำเนินการตาม แผนการดำเนินงาน	
					วันที่เริ่มต้น	วันที่สิ้นสุด	ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			เป็นไป ตามที่กำหนด	ไม่เป็นไป ตามที่กำหนด
12	สำนักช่าง	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ ถนนตอนนบก 37,39	2,341,000.00	2,341,000.00	1 พ.ย. 66	31 มี.ค. 67		อยู่ระหว่างการจัดทำ แบบรูป		-	2,341,000.00	✓	
13	สำนักช่าง	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ และผิวจราจรถนนข้างโรงเรียนเมือง สุราษฎร์ธานี แยกซ้าย 1	355,000.00	355,000.00	1 ธ.ค. 66	29 ก.พ. 67		อยู่ระหว่างการเขียน แบบ		-	355,000.00	✓	
14	สำนักช่าง	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ ถนนชนเกษมบริเวณสี่แยกเสม็ดเรียง	1,857,000.00	1,857,000.00	1 ธ.ค. 66	31 มี.ค. 67		อยู่ระหว่างการเขียนแบบ		-	1,857,000.00	✓	
15	สำนักช่าง	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ และผิวจราจรถนนโศภนรัฐ 1	1,877,000.00	1,877,000.00	1 ธ.ค. 66	31 มี.ค. 67		อยู่ระหว่างการเขียนแบบ		-	1,877,000.00	✓	
16	สำนักช่าง	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ และผิวจราจรถนนโศภนรัฐ 3	1,978,000.00	1,978,000.00	1 ธ.ค. 66	31 มี.ค. 67		อยู่ระหว่างการเขียนแบบ		-	1,978,000.00	✓	
17	สำนักช่าง	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ และผิวจราจรถนนยางงาม (หน้าหมู่บ้านบ้านสวดยางงาม)	3,513,000.00	3,513,000.00	1 ธ.ค. 66	31 พ.ค. 67		อยู่ระหว่างการปรับแบบ แปลนให้ตรงกับ ความต้องการของชุมชน		-	3,513,000.00	✓	
18	สำนักช่าง	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ ถนนตลาดล่าง 24	2,960,000.00	2,960,000.00	1 ธ.ค. 66	30 เม.ย. 67		รอจ้างรังวัดสอบแนว เขตที่ดิน		-	2,960,000.00	✓	
19	สำนักช่าง	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ ถนนตลาดล่าง 24 (หลังหมู่บ้านสุขเจริญ)	4,000,000.00	4,000,000.00	1 ธ.ค. 66	30 เม.ย. 67		ขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง		-	4,000,000.00	✓	
20	สำนักช่าง	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ และผิวจราจรถนนปากน้ำ 8/1	549,000.00	549,000.00	1 ก.พ. 66	30 ก.ย. 66			✓	469,400.00	79,600.00		✓
21	สำนักช่าง	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ และผิวจราจรถนนกาญจนาภิเษก 1 แยก 3	970,000.00	970,000.00	1 พ.ย. 66	31 ม.ค. 67		อยู่ระหว่างการเขียนแบบ		-	970,000.00	✓	
22	สำนักช่าง	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ และผิวจราจรถนนกาญจนาภิเษก 1 แยก 4	729,000.00	729,000.00	1 พ.ย. 66	31 ม.ค. 67		อยู่ระหว่างการเขียนแบบ		-	729,000.00	✓	
23	สำนักช่าง	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ และผิวจราจรถนนกาญจนาภิเษก 16 แยก 1	619,000.00	619,000.00	1 พ.ย. 66	29 ก.พ. 67		รอจ้างรังวัดสอบแนว เขตที่ดิน		-	619,000.00	✓	

รายงานผลการดำเนินงานโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
ที่ขออนุมัติเงินไว้ (ที่ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ) ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
ณ ไตรมาสที่ 1/2567 (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566)

ลำดับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	งบประมาณ ที่กันเงิน (บาท)	ระยะเวลาที่กำหนดไว้ตาม แผนดำเนินงาน		สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การดำเนินการตาม แผนการดำเนินงาน	
					วันที่เริ่มต้น	วันที่สิ้นสุด	ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			เป็นไป ตามที่กำหนด	ไม่เป็นไป ตามที่กำหนด
24	สำนักช่าง	โครงการก่อสร้างอาคารสถานีสูบน้ำ บ้านมะขาม	1,130,000.00	1,130,000.00	1 พ.ย. 66	29 ก.พ. 67		อยู่ระหว่างการเตรียม เอกสารขออนุมัติ จัดซื้อจัดจ้าง		-	1,130,000.00	✓	
25	สำนักช่าง	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ และผิวจราจรถนนชนเกษม 26	2,927,000.00	2,927,000.00	1 พ.ย. 66	29 ก.พ. 67		รอจ้างรังวัดสอบแนว เขตที่ดิน		-	2,927,000.00	✓	
26	สำนักช่าง	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ ถนนโกลกบุรีบริเวณแยกโรงเรียน เทศบาล 1	929,000.00	929,000.00	1 พ.ย. 66	31 ม.ค. 67		ขออนุญาตเชื่อมต่อ ทางหลวง		-	929,000.00	✓	
27	สำนักช่าง	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและ ผิวจราจรถนนศรีเกษมหลังซอยบุญช่วย 3 พร้อมก่อสร้างอาคารสถานีสูบน้ำ และระบบเปิด-ปิดประตูกันน้ำ	1,800,000.00	1,800,000.00	1 พ.ย. 66	29 ก.พ. 67		รอจ้างรังวัดสอบแนว เขตที่ดิน		-	1,800,000.00	✓	
28	สำนักช่าง	โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบ ค.ส.ล. พร้อมคูระบายน้ำ ทั้ง 2 ข้าง ถนนปรีดาราชบุรี แยกซ้าย 1 (ซอย ส.ดาวเทียม)	2,000,000.00	2,000,000.00	1 ต.ค. 66	29 ก.พ. 67		จัดทำราคากลาง		-	2,000,000.00	✓	
29	สำนักช่าง	โครงการขยายผิวจราจรถนนคอนกรีต ช่วงคอสะพานข้ามแม่น้ำตาปี	5,000,000.00	900,000.00	1 ต.ค. 66	31 ธ.ค. 66		อยู่ระหว่างดำเนินการ ก่อสร้าง เสร็จงาน 73%		-	900,000.00	✓	
30	สำนักช่าง	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ และผิวจราจรถนนชนเกษม 30	1,950,000.00	1,950,000.00	1 พ.ย. 66	29 ก.พ. 67		รอจ้างรังวัดสอบแนว เขตที่ดิน		-	1,950,000.00	✓	
31	สำนักช่าง	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ และผิวจราจรถนนตลาดล่าง 41	436,000.00	436,000.00	1 พ.ย. 66	31 ม.ค. 67		อยู่ระหว่างปรับแบบ แปลน		-	436,000.00	✓	
32	สำนักช่าง	โครงการจ้างเหมาผู้ต้องขัง ขุดลอกท่อระบายน้ำ โดยวิธีจ้างเหมา	2,500,000.00	2,500,000.00	1 พ.ค. 66	30 ก.ย. 66		ดำเนินการลอกท่อ ระบายน้ำตามแผนงาน		-	2,500,000.00		✓

รายงานผลการดำเนินงานโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
ที่ขออนุมัติกันเงินไว้ (ที่ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ) ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
ณ ไตรมาสที่ 1/2567 (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566)

ลำดับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	งบประมาณ ที่กั้นเงิน (บาท)	ระยะเวลาที่กำหนดไว้ตาม แผนดำเนินงาน		สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การดำเนินการตาม แผนการดำเนินงาน	
					วันที่เริ่มต้น	วันที่สิ้นสุด	ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			เป็นไป ตามที่กำหนด	ไม่เป็นไป ตามที่กำหนด
33	สำนักช่าง	โครงการขยายผิวจราจรแบบคอนกรีตเสริมเหล็กถนนปากน้ำ บริเวณหน้าหมู่บ้านเสาวลักษณ์ 1 (ชุมชนบางกุ้ง)	350,000.00	350,000.00	1 ต.ค. 66	31 ม.ค. 67		จัดทำแบบรูปรายการ		-	350,000.00	✓	
34	สำนักช่าง	โครงการติดตั้งเสาไฟ High Mast	2,250,000.00	2,250,000.00	1 ต.ค. 66	31 มี.ค. 67		ขอความอนุเคราะห์ส่วนควบคุมการก่อสร้างประมาณการฐานรากเสาไฟ High Mast		-	2,250,000.00	✓	
35	สำนักช่าง	โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบแอสฟัลท์คอนกรีต (Over-lay) ถนนพ้อขุนทะเล ช่วงที่ 2 (ชุมชนบึงขุนทะเล)	5,800,000.00	5,800,000.00	1 ต.ค. 66	29 ก.พ. 67		จัดทำแบบรูปรายการ		-	5,800,000.00	✓	
36	สำนักช่าง	โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบแอสฟัลท์คอนกรีต ถนนเมืองใหม่ (ชุมชนบางกุ้ง)	2,800,000.00	2,800,000.00	1 ต.ค. 66	29 ก.พ. 67		จัดทำแบบรูปรายการ		-	2,800,000.00	✓	
รวม			74,618,519.00	70,518,519.00						992,700.00	69,525,819.00		
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม													
37	สำนักช่าง	โครงการซ่อมแซมปรับปรุงพื้นลานอเนกประสงค์บริเวณสะพานริศ	500,000.00	500,000.00	1 ต.ค. 66	31 ม.ค. 67		จัดทำแบบแปลน		-	500,000.00	✓	
รวม			500,000.00	500,000.00						-	500,000.00		
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสวัสดิการสังคมและคุณภาพชีวิต													
38	สำนักสาธารณสุขฯ	โครงการปรับปรุงและซ่อมแซมโรงฆ่าสัตว์ เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี	1,795,430.00	1,795,000.00	1 ต.ค. 66	30 เม.ย. 67		คณะกรรมการพิจารณา กำหนดราคากลาง		-	1,795,000.00	✓	
39	กองสวัสดิการสังคม	โครงการปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมผู้สูงอายุเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี (ศพอส.)	3,363,000.00	3,363,000.00	1 ต.ค. 66	30 ก.ย. 67		ประสานสำนักช่าง เพื่อแก้ไข พร.4/5		-	3,363,000.00	✓	
รวม			5,158,430.00	5,158,000.00						-	5,158,000.00		

รายงานผลการดำเนินงานโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
ที่ขออนุมัติกันเงินไว้ (ที่ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ) ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
ณ ไตรมาสที่ 1/2567 (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566)

ลำดับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	งบประมาณ ที่กั้นเงิน (บาท)	ระยะเวลาที่กำหนดไว้ตาม แผนดำเนินงาน		สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การดำเนินการตาม แผนการดำเนินงาน	
					วันที่เริ่มต้น	วันที่สิ้นสุด	ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			เป็นไป ตามที่กำหนด	ไม่เป็นไป ตามที่กำหนด
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ การกีฬา ศาสนา ประเพณีและวัฒนธรรม													
40	สำนักงานการศึกษา	โครงการก่อสร้างอ่างล้างจานนักเรียน	365,000.00	365,000.00	1 ต.ค. 66	29 ก.พ. 67		คณะกรรมการพิจารณา กำหนดราคากลาง		-	365,000.00	✓	
41	สำนักงานการศึกษา	โครงการต่อเติมหลังคาคลุมระหว่าง อาคารประชาชนภูมิ ๒,๓ อาคารหลังคาคลุมลานอเนกประสงค์	1,157,000.00	1,157,000.00	1 ต.ค. 66	31 มี.ค. 67		คณะกรรมการพิจารณา กำหนดราคากลาง		-	1,157,000.00	✓	
42	สำนักงานการศึกษา	โครงการก่อสร้างสนามเด็กเล่นโรงเรียน เทศบาล 1 (แตงอ่อนเดิมวิทยา)	1,700,000.00	1,700,000.00	1 ต.ค. 66	29 ก.พ. 67		ลงนามสัญญา เมื่อ วันที่ 20 พ.ย. 2566		-	1,700,000.00	✓	
43	สำนักงานการศึกษา	โครงการทาสีภายนอกอาคารเรียน 1,2,3	527,000.00	527,000.00	1 ธ.ค. 65	30 ก.ย. 66			✓	298,000.00	229,000.00		✓
44	สำนักงานการศึกษา	โครงการจัดทำระบบสารสนเทศเด็กปฐมวัย สำนักงานการศึกษา เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี	100,000.00	100,000.00	1 มิ.ย. 66	30 ก.ย. 66		รอผู้รับจ้างส่งมอบงาน		-	100,000.00		✓
45	สำนักงานการศึกษา	โครงการปรับปรุงอาคารสนามแบดมินตัน	4,000,000.00	4,000,000.00	1 ต.ค. 66	30 ก.ย. 67		คณะกรรมการจัดทำ รูปแบบการงานก่อสร้าง		-	4,000,000.00	✓	
รวม			7,849,000.00	7,849,000.00						298,000.00	7,551,000.00		
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการที่ดี													
46	กองยุทธศาสตร์ฯ	โครงการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี (จ้างที่ปรึกษา)	250,000.00	250,000.00	1 ต.ค. 66	31 ธ.ค. 66		ดำเนินการแล้วเสร็จ รอเบิกจ่ายงวดที่ 3		100,000.00	150,000.00	✓	
47	สำนักปลัดฯ	โครงการปรับปรุงเคาน์เตอร์บริการ ประชาชนสำนักงานเทศบาลนคร สุราษฎร์ธานี	500,000.00	500,000.00	1 ต.ค. 66	31 มี.ค. 67		อยู่ระหว่างจัดทำข้อมูล ราคากลาง		-	500,000.00	✓	
48	กองยุทธศาสตร์ฯ	โครงการก่อสร้างป้ายสำหรับติดตั้งจอ LED บริเวณสี่แยกวัดโพธิ์	850,000.00	850,000.00	1 ต.ค. 66	31 มี.ค. 67		สำนักช่างจัดทำแบบ รูปรายการแล้วเสร็จ รอเสนอผู้บริหารเพื่อ อนุมัติ		-	850,000.00	✓	
รวม			1,600,000.00	1,600,000.00						100,000.00	1,500,000.00		
รวมทุกยุทธศาสตร์			89,725,949.00	85,625,519.00						1,390,700.00	84,234,819.00		
