



[ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2569]

รายงานติดตาม

ผลการเบิกจ่ายและผลการดำเนินงานโครงการ

ไตรมาสที่ 3/2569

2
1
5
6
9



รวบรวมโดย :

งานวิจัยและประเมินผล

ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ



คำนำ




ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ครั้งที่ 5/2568 เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2568 ได้กำหนดแนวทางวิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 กำหนดให้มีการติดตามผลการเบิกจ่ายและผลการดำเนินงานโครงการตามแผนพัฒนา ประจำปีเดือนและประจำไตรมาส โดยมีมอบหมายให้งานวิจัยและประเมินผล จัดทำรายงานสรุปผลในภาพรวมนำเสนอผู้บริหารทราบทุกสิ้นเดือน และเสนอต่อคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีทราบ และให้ข้อเสนอแนะทุกสิ้นไตรมาส

ทั้งนี้เพื่อติดตามความก้าวหน้าและผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี อย่างต่อเนื่องและเกิดประโยชน์ต่อการดำเนินงานของหน่วยงานต่อไป



สารบัญ



หน้า 1	สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณตามเทศบัญญัติฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 (ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2569)
หน้า 2	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณตามเทศบัญญัติตั้งงบประมาณรายจ่าย แยกรายแผนงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 (ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2569)
หน้า 9	เปรียบเทียบผลการเบิกจ่ายงบประมาณตามเทศบัญญัติตั้งงบประมาณรายจ่าย (ข้อมูล ณ ไตรมาสที่ 3/2568 และ ไตรมาสที่ 4/2569)
หน้า 11	สรุปภาพรวมแสดงสถานะการดำเนินโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 (ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2569)
หน้า 14	สรุปผลการดำเนินโครงการตามเทศบัญญัติฯ ,เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 (ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2569)
หน้า 50	สรุปผลการดำเนินโครงการที่จ่ายจากเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567-2568 (ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2569)
หน้า 55	สรุปผลการดำเนินโครงการตามเทศบัญญัติฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566-2568 ที่ขออนุมัติกันเงินไว้ (ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2569)

สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ประจำไตรมาสที่ 3/2569

(ข้อมูล ณ 30 มิถุนายน 2569)

ผลการเบิกจ่ายจำแนกตามแผนงาน

1 แผนงานสาธารณสุข
สามารถเบิกจ่ายได้ **มากที่สุด** **71.29%**

เมื่อเทียบกับแผนงานอื่น ๆ

2 แผนงานสังคมสงเคราะห์
สามารถเบิกจ่ายได้ **รองลงมา** **40.16 %**

มีผลการเบิกจ่ายใกล้เคียงกับแผนงานสาธารณสุข

3 แผนงานการศึกษา
สามารถเบิกจ่ายได้ **รองลงมา** **66.94%**

มีผลการเบิกจ่ายใกล้เคียงกับแผนงานสังคมสงเคราะห์

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

สามารถเบิกจ่ายได้ **น้อยที่สุด** **30.46 %**

เมื่อเทียบกับแผนงานอื่น ๆ


รายจ่ายประจำ

รายจ่ายประจำเบิกจ่ายแล้ว

ร้อยละ **64.69** (806,501,504.03 บาท)

จากงบประมาณรายจ่ายประจำทั้งหมด

1,234,893,780 บาท

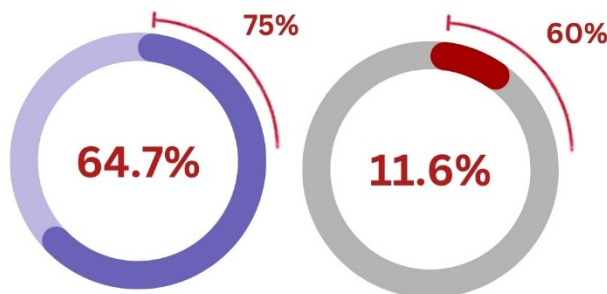

รายจ่ายงบลงทุน

การเบิกจ่ายงบลงทุนยังล่าช้า
เบิกจ่ายได้เพียงร้อยละ **11.61**

ผลการเบิกจ่ายยังห่างไกลจากเป้าหมาย
ประจำไตรมาสที่ 3/69 ที่ตั้งไว้ **ร้อยละ 60**

วิเคราะห์ประเภทรายจ่ายและเป้าหมาย

● เป้าหมายไตรมาส 3 (%) ● ผลการเบิกจ่าย (%)

ภาพรวมทั้งหมด

75% vs 59.56%

รายจ่ายประจำ

75% vs 64.69%

รายจ่ายงบลงทุน

60% vs 11.61%

ภาพรวมการเบิกจ่ายทั้งหมดอยู่ที่

59.56%


มียอดการเบิกจ่าย **712.18** ล้านบาท

จากงบประมาณรวมทั้งสิ้น **1,380** ล้านบาท

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย แยกตามแผนงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569

ประกอบด้วย 12 แผนงาน

แผนงาน



เป้าหมายการเบิกจ่าย
ไตรมาสที่ 3/69

80 100

การเบิกจ่าย (ร้อยละ)

สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569

ประจำปีไตรมาสถที่ 3/2569 (ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2569)

เป้าหมายการเบิกจ่ายไตรมาสที่ 3 (ระหว่างเดือนเมษายน - มิถุนายน 2569)

รายจ่ายประจำร้อยละ 75 (ของรายจ่ายประจำทั้งหมด) งบลงทุนร้อยละ 60 (ของงบลงทุนทั้งหมด) การเบิกจ่ายในภาพรวมร้อยละ 75 (ของงบประมาณทั้งหมด)

ลำดับ	แผนงาน / งาน	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	การโอนงบประมาณ		การเบิกจ่าย		งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การ เบิกจ่าย (ร้อยละ)	หน่วยงาน ผู้เบิก
			โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	ผูกพัน (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)			
1	แผนงานบริหารงานทั่วไป	166,604,500.00	10,116,682.00	24,057,902.00	7,659,136.26	94,029,155.94	50,974,987.80	61.59	
	รายจ่ายประจำ	166,604,500.00	10,061,182.00	24,057,902.00	7,622,636.26	94,029,155.94	50,955,987.80	61.61	
	- งานบริหารทั่วไป	103,470,700.00	4,679,122.00	22,957,702.00	4,234,854.92	50,167,417.64	30,789,847.44		สป./กองยุทธฯ/กจ.
	- งานวางแผนสถิติและวิชาการ	4,313,600.00	140,000.00	140,000.00	275,450.00	2,644,970.00	1,393,180.00		กองยุทธฯ
	- งานบริหารงานคลัง	57,910,600.00	5,230,060.00	916,000.00	3,085,570.05	40,805,255.30	18,333,834.65		คลัง/สารสนเทศฯ
	- งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน	909,600.00	12,000.00	44,200.00	26,761.29	411,513.00	439,125.71		หน่วยตรวจสอบภายใน
	รายจ่ายงบลงทุน	-	55,500.00	-	36,500.00	-	19,000.00	-	
	- งานบริหารทั่วไป (ครุภัณฑ์)	-	23,300.00	-	4,300.00	-	19,000.00		
	- งานควบคุมภายในและตรวจสอบภายใน (ครุภัณฑ์)	-	32,200.00	-	32,200.00	-	-		
2	แผนงานรักษาความสงบภายใน	37,130,650.00	2,219,745.00	1,903,745.00	2,129,088.76	19,016,837.05	16,300,724.19	50.78	
	รายจ่ายประจำ	31,160,650.00	1,898,000.00	1,903,745.00	1,039,088.76	19,016,837.05	11,098,979.19	61.04	
	- งานเทศกิจ	11,174,850.00	211,000.00	375,000.00	176,367.00	6,995,844.16	3,838,638.84		สำนักปลัดเทศบาล
	- งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	15,353,000.00	920,000.00	1,261,745.00	271,511.76	8,753,207.61	5,986,535.63		
	- งานจราจร	4,632,800.00	767,000.00	267,000.00	591,210.00	3,267,785.28	1,273,804.72		สำนักช่าง

ลำดับ	แผนงาน / งาน	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	การโอนงบประมาณ		การเบิกจ่าย		งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การ เบิกจ่าย (ร้อยละ)	หน่วยงาน ผู้เบิก
			โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	ผูกพัน (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)			
	รายจ่ายงบลงทุน	5,970,000.00	321,745.00	-	1,090,000.00	-	5,201,745.00	-	
	- งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ครุภัณฑ์)	5,970,000.00	321,745.00	-	1,090,000.00	-	5,201,745.00		
3	แผนงานการศึกษา	355,701,370.00	10,098,600.00	10,316,744.00	17,331,468.70	237,815,814.37	100,335,942.93	66.90	
	รายจ่ายประจำ	353,622,550.00	9,590,300.00	10,316,744.00	16,831,548.70	236,237,514.37	99,827,042.93	66.94	
	- งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	7,986,600.00	562,000.00	242,000.00	273,181.65	5,955,836.87	2,077,581.48		สำนักงานการศึกษา
	- งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	199,946,150.00	5,948,300.00	5,515,144.00	8,534,654.13	135,823,133.05	56,021,518.82		
	- งานระดับมัธยมศึกษา	139,429,000.00	2,915,000.00	3,935,000.00	7,962,887.25	90,897,256.89	39,548,855.86		
	- งานศึกษาไม่กำหนดระดับ	6,260,800.00	165,000.00	624,600.00	60,825.67	3,561,287.56	2,179,086.77		
	รายจ่ายงบลงทุน	2,078,820.00	508,300.00	-	499,920.00	1,578,300.00	508,900.00	61.01	
	- งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา (ครุภัณฑ์)	-	55,000.00	-	-	-	55,000.00		
	- งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา (ครุภัณฑ์)	535,800.00	206,800.00	-	-	535,600.00	207,000.00		
	- งานระดับมัธยมศึกษา (ครุภัณฑ์)	1,543,020.00	17,000.00	-	499,920.00	1,042,700.00	17,400.00		
	- งานศึกษาไม่กำหนดระดับ (ครุภัณฑ์)	-	229,500.00	-	-	-	229,500.00		
4	แผนงานสาธารณสุข	66,599,440.00	443,130.00	855,610.00	762,095.15	47,183,680.51	18,241,184.34	71.29	
	รายจ่ายประจำ	66,599,440.00	443,130.00	855,610.00	762,095.15	47,183,680.51	18,241,184.34	71.29	
	- งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	8,968,810.00	100,000.00	398,700.00	152,611.45	6,373,626.87	2,143,871.68		สำนักงานสาธารณสุข
	- งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	18,902,930.00	311,570.00	354,910.00	545,283.70	13,300,373.64	5,013,932.66		
	- งานศูนย์บริการสาธารณสุข	38,727,700.00	31,560.00	102,000.00	64,200.00	27,509,680.00	11,083,380.00		
	รายจ่ายงบลงทุน	-	-	-	-	-	-	-	


ลำดับ	แผนงาน / งาน	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	การโอนงบประมาณ		การเบิกจ่าย		งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การ เบิกจ่าย (ร้อยละ)	หน่วยงาน ผู้เบิก
			โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	ผูกพัน (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)			
5	แผนงานสังคมสงเคราะห์	11,597,580.00	574,280.00	371,415.00	304,431.88	8,279,177.52	3,216,835.60	70.16	
	รายจ่ายประจำ	11,597,580.00	574,280.00	371,415.00	304,431.88	8,279,177.52	3,216,835.60	70.16	
	- งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์	4,745,000.00	346,080.00	-	10,421.58	3,691,220.25	1,389,438.17		กองสวัสดิการสังคม
	- งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	6,852,580.00	228,200.00	371,415.00	294,010.30	4,587,957.27	1,827,397.43		
	รายจ่ายงบลงทุน	-	-	-	-	-	-	-	
6	แผนงานเคหะและชุมชน	152,489,740.00	42,212,664.00	3,662,738.00	12,134,806.50	115,414,701.27	63,490,158.23	60.41	
	รายจ่ายประจำ	140,689,740.00	41,976,823.00	2,630,638.00	5,166,906.50	114,680,860.27	60,188,158.23	63.70	
	- งานไฟฟ้าและประปา	1,089,000.00	688,800.00	-	-	1,087,112.51	690,687.49		สำนักช่าง
	- งานสวนสาธารณะ	10,384,900.00	1,545,400.00	209,900.00	228,691.86	8,697,382.42	2,794,325.72		
	- งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	113,353,640.00	16,100,000.00	861,858.00	4,763,996.93	91,269,645.54	32,558,139.53		สข. / สร.
	- งานบำบัดน้ำเสีย	15,862,200.00	23,642,623.00	1,558,880.00	174,217.71	13,626,719.80	24,145,005.49		สำนักช่าง
	รายจ่ายงบลงทุน	11,800,000.00	235,841.00	1,032,100.00	6,967,900.00	733,841.00	3,302,000.00	6.67	
	- งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล (ค่าครุภัณฑ์)	11,800,000.00	-	1,032,100.00	6,967,900.00	498,000.00	3,302,000.00		สข. / สร.
	- งานบำบัดน้ำเสีย (ค่าครุภัณฑ์)	-	235,841.00	-	-	235,841.00	-		
7	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	19,163,000.00	561,580.00	1,390,125.00	1,100,150.00	11,830,421.75	5,403,883.25	64.53	
	รายจ่ายประจำ	19,163,000.00	561,580.00	1,390,125.00	1,100,150.00	11,830,421.75	5,403,883.25	64.53	
	- งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	7,483,000.00	-	915,000.00	504,500.00	3,335,500.00	2,728,000.00		กองสวัสดิการสังคม
	- งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	11,680,000.00	561,580.00	475,125.00	595,650.00	8,494,921.75	2,675,883.25		
	รายจ่ายงบลงทุน	-	-	-	-	-	-	-	

ลำดับ	แผนงาน / งาน	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	การโอนงบประมาณ		การเบิกจ่าย		งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การ เบิกจ่าย (ร้อยละ)	หน่วยงาน ผู้เบิก
			โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	ผูกพัน (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)			
8	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ	30,740,100.00	10,823,479.00	4,258,435.00	2,517,432.57	17,418,392.55	17,369,318.88	46.69	
	รายจ่ายประจำ	30,740,100.00	10,823,479.00	4,258,435.00	2,517,432.57	17,418,392.55	17,369,318.88	46.69	
	- งานกีฬาและนันทนาการ	12,642,100.00	3,501,279.00	2,574,235.00	2,493,071.87	7,208,294.16	3,867,777.97		สำนักงานการศึกษา
	- งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	12,626,900.00	658,000.00	490,000.00	12,820.00	5,720,040.84	7,062,039.16		
	- งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว	5,471,100.00	6,664,200.00	1,194,200.00	11,540.70	4,490,057.55	6,439,501.75		สำนักปลัดเทศบาล
	รายจ่ายงบลงทุน	-	-	-	-	-	-	-	
9	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	189,766,940.00	6,573,000.00	16,120,509.00	23,943,207.73	54,886,092.58	101,390,130.69	30.46	
	รายจ่ายประจำ	64,859,540.00	6,573,000.00	4,120,745.00	1,497,707.73	41,734,064.58	24,080,022.69	62.00	
	- งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมฯ	9,209,140.00	125,000.00	125,000.00	131,153.00	6,547,281.15	2,530,705.85		สำนักช่าง
	- งานก่อสร้าง	55,650,400.00	6,448,000.00	3,995,745.00	1,366,554.73	35,186,783.43	21,549,316.84		
	รายจ่ายงบลงทุน	124,907,400.00	-	11,999,764.00	22,445,500.00	13,152,028.00	77,310,108.00	11.65	
	- งานก่อสร้าง (ค่าครุภัณฑ์)	7,679,000.00	-	156,100.00	-	7,522,900.00	-		
	- งานก่อสร้าง (ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)	117,228,400.00	-	11,843,664.00	22,445,500.00	5,629,128.00	77,310,108.00		
10	แผนงานการเกษตร	5,723,300.00	850,000.00	497,100.00	295,318.10	3,831,523.65	1,949,358.25	63.06	
	รายจ่ายประจำ	5,723,300.00	850,000.00	497,100.00	295,318.10	3,831,523.65	1,949,358.25	63.06	
	- งานส่งเสริมการเกษตร	5,723,300.00	850,000.00	497,100.00	295,318.10	3,831,523.65	1,949,358.25		สำนักช่าง
	รายจ่ายงบลงทุน	-	-	-	-	-	-		


ลำดับ	แผนงาน / งาน	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	การโอนงบประมาณ		การเบิกจ่าย		งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การ เบิกจ่าย (ร้อยละ)	หน่วยงาน ผู้เบิก
			โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	ผูกพัน (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)			
11	แผนงานการพาณิชย์	3,732,580.00	557,750.00	515,587.00	380,646.00	1,986,189.53	1,407,907.47	52.62	
	รายจ่ายประจำ	3,382,580.00	557,750.00	515,587.00	30,646.00	1,986,189.53	1,407,907.47	58.00	
	- งานตลาดสด	637,300.00	-	-	6,000.00	429,347.00	201,953.00		สำนักปลัดเทศบาล
	- งานโรงฆ่าสัตว์	2,745,280.00	557,750.00	515,587.00	24,646.00	1,556,842.53	1,205,954.47		สำนักสาธารณสุข
	รายจ่ายงบลงทุน	350,000.00	-	-	350,000.00	-	-	-	
	- งานโรงฆ่าสัตว์ (ค่าครุภัณฑ์)	350,000.00	-	-	350,000.00	-	-		
12	แผนงานงบกลาง	340,750,800.00	-	21,081,000.00	135,000.00	210,273,686.31	109,261,113.69	65.78	
	รายจ่ายประจำ	340,750,800.00	-	21,081,000.00	135,000.00	210,273,686.31	109,261,113.69	65.78	
	รายจ่ายงบลงทุน	-	-	-	-	-	-		
	การเบิกจ่ายในภาพรวม	1,380,000,000.00	85,030,910.00	85,030,910.00	68,692,781.65	821,965,673.03	489,341,545.32	59.56	
	รวมรายจ่ายประจำ	1,234,893,780.00	83,909,524.00	71,999,046.00	37,302,961.65	806,501,504.03	402,999,792.32	64.69	
	รวมงบลงทุน	145,106,220.00	1,121,386.00	13,031,864.00	31,389,820.00	15,464,169.00	86,341,753.00	11.61	

เปรียบเทียบผลการเบิกจ่ายงบประมาณตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ข้อมูล ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2569 และ วันที่ 30 มิถุนายน 2569

ผลการเบิกจ่ายจำแนกตามประเภท

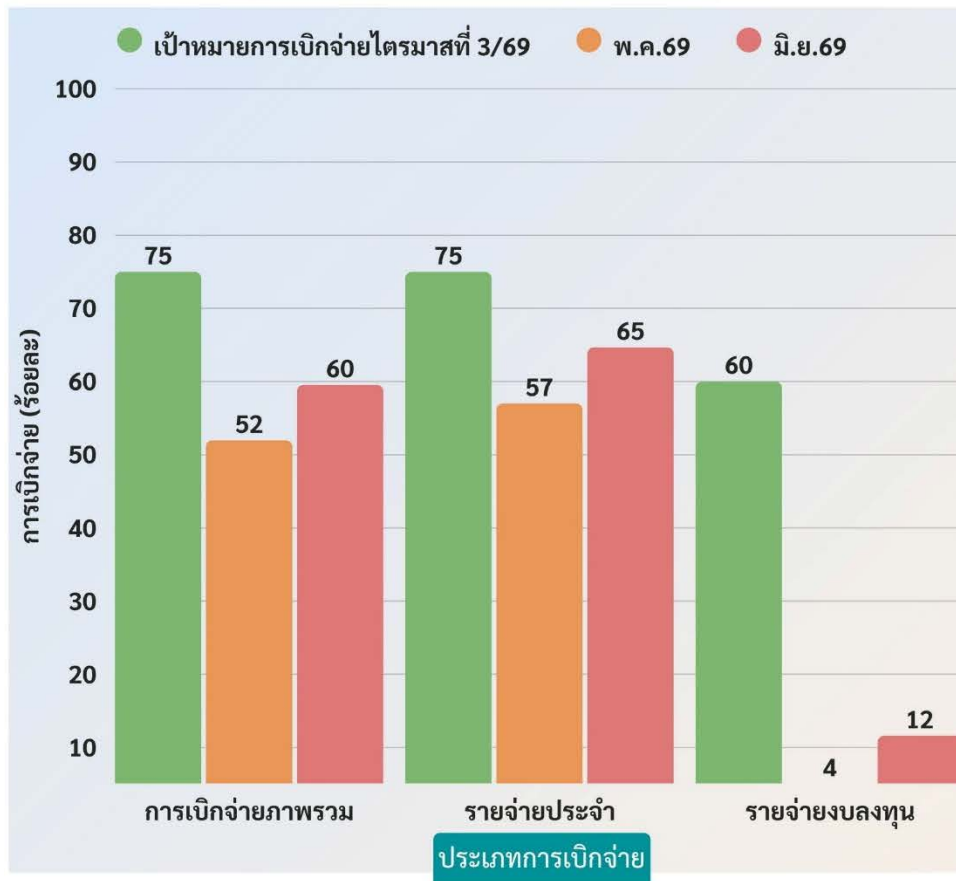

ผลการเบิกจ่ายแยกตามแผนงาน

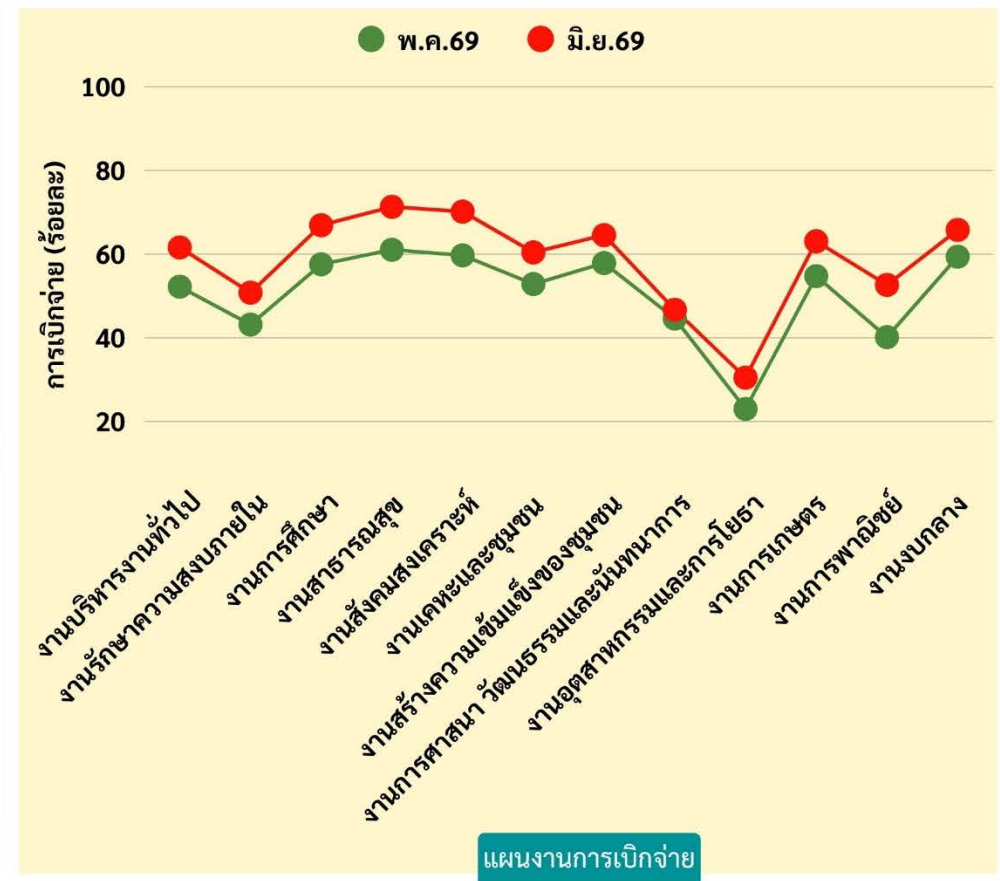


ความก้าวหน้าผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำเดือนมิถุนายน 2569 (ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2569) เมื่อเปรียบเทียบกับผลการเบิกจ่าย ณ วันที่ 30 พฤษภาคม 2569


- การเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม สามารถเบิกจ่ายได้เพิ่มขึ้นจากเดือนพฤษภาคม 2569 คิดเป็นร้อยละ 7.95 ของงบประมาณทั้งหมด
- การเบิกจ่ายรายจ่ายประจำ สามารถเบิกจ่ายได้เพิ่มขึ้นจากเดือนพฤษภาคม 2569 คิดเป็นร้อยละ 8.01 ของรายจ่ายประจำทั้งหมด
- การเบิกจ่ายบงลงทุน เพิ่มขึ้นจากเดือนพฤษภาคม 2569 คิดเป็นร้อยละ 7.52 ของบงลงทุนทั้งหมด

เปรียบเทียบผลการเบิกจ่ายงบประมาณตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ข้อมูล ณ ไตรมาสที่ 3/2568 และ ไตรมาสที่ 3/2569

ผลการเบิกจ่ายจำแนกตามประเภท

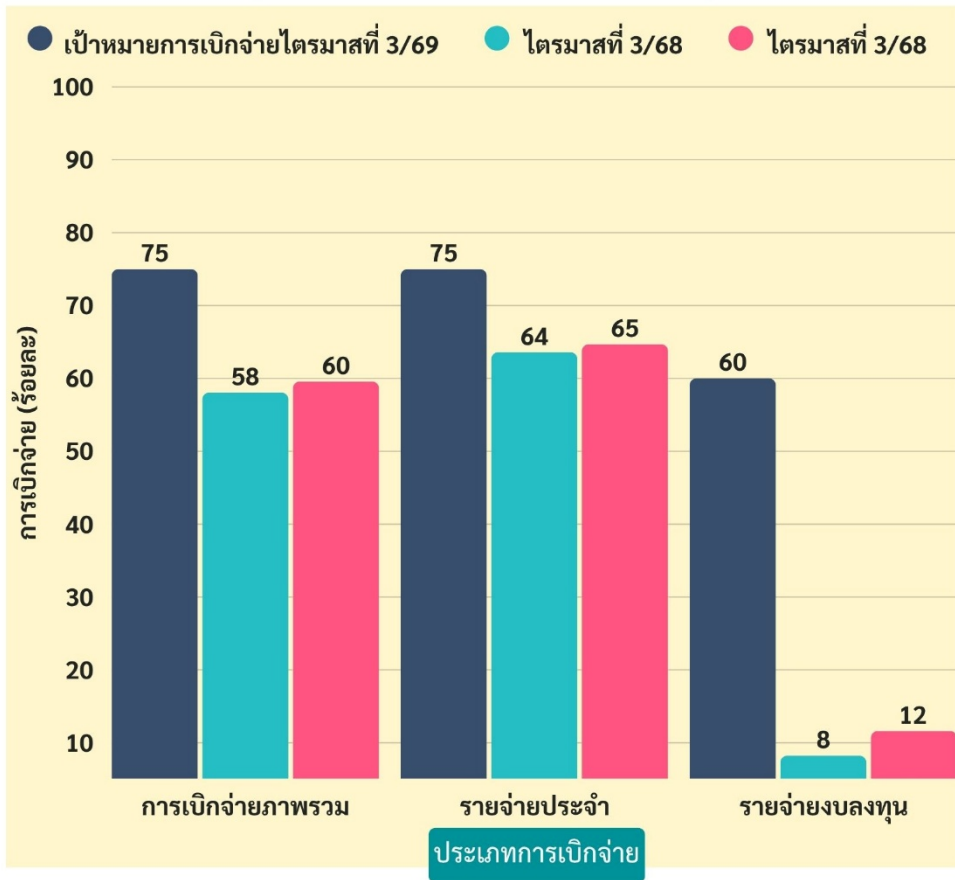

ผลการเบิกจ่ายแยกตามแผนงาน

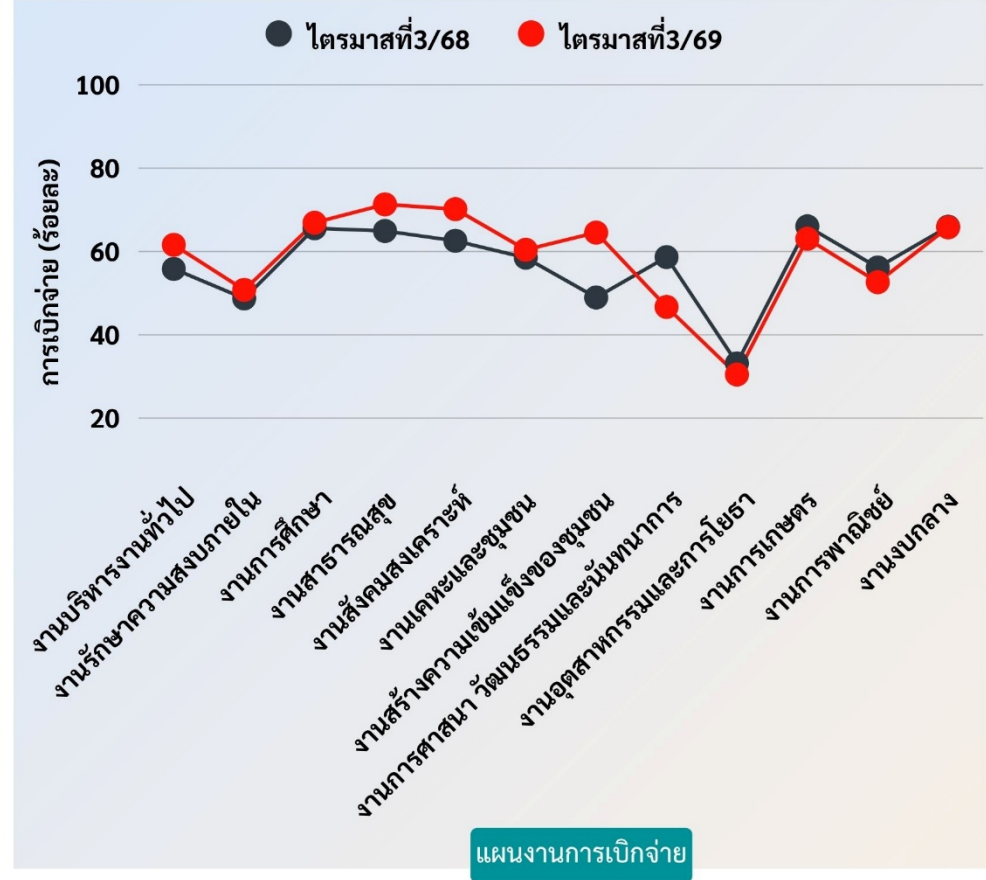

ความก้าวหน้าผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีไตรมาสที่ 3/2569 (ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2569) เมื่อเปรียบเทียบกับผลการเบิกจ่าย ณ ไตรมาสที่ 3/2568 (ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2568)

- การเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม สามารถเบิกจ่ายได้เพิ่มขึ้นจาก ไตรมาสที่ 3/2568 คิดเป็นร้อยละ 1.51 ของงบประมาณทั้งหมด
- การเบิกจ่ายรายจ่ายประจำ สามารถเบิกจ่ายได้เพิ่มขึ้นจาก ไตรมาสที่ 3/2568 คิดเป็นร้อยละ 1.11 ของรายจ่ายประจำทั้งหมด
- การเบิกจ่ายลงทุน เพิ่มขึ้นจาก ไตรมาสที่ 3/2568 คิดเป็นร้อยละ 3.39 ของงบลงทุนทั้งหมด

รายงาน

ผลการดำเนินโครงการ

- ✓ โครงการที่ตั้งจ่ายจากงบประมาณตามเทศบัญญัติ ฯ
- ✓ โครงการที่ตั้งจ่ายจากเงินสะสม
- ✓ โครงการที่อนุมัติกันเงินไว้ (ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ)

สรุปภาพรวมแสดงสถานะการดำเนินโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569

เพื่อแสดงสัดส่วนความคืบหน้าและสถานะปัจจุบันของโครงการทั้งหมดที่ได้รับอนุมัติ **จำนวน 226 โครงการ**
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2569)

ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว 108 โครงการ

40.15 % คิดเป็นสัดส่วนร้อยละมากที่สุดของโครงการทั้งหมด

อยู่ระหว่างดำเนินการ 127 โครงการ

มีโครงการที่กำลังขับเคลื่อนอย่างต่อเนื่องคิดเป็นร้อยละ **47.21 %**



สถานะการบริหารจัดการโครงการ

โครงการที่ยังไม่เริ่มและถูกยกเลิกมีสัดส่วนน้อยมาก

สถานะ	จำนวนโครงการ	คิดเป็นร้อยละ
✓ ยังไม่ดำเนินการ	28	10.41 %
✗ ยกเลิก	6	2.23 %

28

โครงการ

ยังไม่ดำเนินการ

6

โครงการ

ยกเลิก

สรุปผลการดำเนินงานโครงการตามยุทธศาสตร์การพัฒนา ประจำปี 2569

ภาพรวมและสถานะโครงการทั้งหมด

โครงการทั้งหมด
269 โครงการ



ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว
108 โครงการ

คิดเป็นร้อยละ 40.15



อยู่ระหว่างดำเนินการ
127 โครงการ

คิดเป็นร้อยละ 47.21



ยังไม่ดำเนินการ
28 โครงการ

คิดเป็นร้อยละ 10.41



ยกเลิก
6 โครงการ

คิดเป็นร้อยละ 2.23

แหล่งที่มาของงบประมาณและการจัดสรรให้โครงการ

- งบประมาณตามเทศบัญญัติฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569
- เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569



เปรียบเทียบจำนวนโครงการและความสำเร็จ


ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ดำเนินการเสร็จ	11 โครงการ
ระหว่างดำเนินการ	63 โครงการ
ไม่ได้ดำเนินการ	12 โครงการ
ยกเลิก	- โครงการ
ทั้งหมด	86 โครงการ



ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว

ดำเนินการเสร็จ	2 โครงการ
ระหว่างดำเนินการ	5 โครงการ
ไม่ได้ดำเนินการ	2 โครงการ
ยกเลิก	- โครงการ
ทั้งหมด	9 โครงการ



ยุทธศาสตร์ที่ 3

ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม


ดำเนินการเสร็จ	- โครงการ
ระหว่างดำเนินการ	4 โครงการ
ไม่ได้ดำเนินการ	- โครงการ
ยกเลิก	- โครงการ
ทั้งหมด	4 โครงการ



ยุทธศาสตร์ที่ 4

ด้านสวัสดิการสังคมและคุณภาพชีวิต


ดำเนินการเสร็จ	75 โครงการ
ระหว่างดำเนินการ	24 โครงการ
ไม่ได้ดำเนินการ	8 โครงการ
ยกเลิก	1 โครงการ
ทั้งหมด	108 โครงการ



ยุทธศาสตร์ที่ 5

ด้านการศึกษา การกีฬา ศาสนา ประเพณีและวัฒนธรรม


ดำเนินการเสร็จ	16 โครงการ
ระหว่างดำเนินการ	25 โครงการ
ไม่ได้ดำเนินการ	6 โครงการ
ยกเลิก	5 โครงการ
ทั้งหมด	52 โครงการ



ยุทธศาสตร์ที่ 6

ด้านการบริหารจัดการที่ดี

ดำเนินการเสร็จ	4 โครงการ
ระหว่างดำเนินการ	6 โครงการ
ไม่ได้ดำเนินการ	- โครงการ
ยกเลิก	- โครงการ
ทั้งหมด	10 โครงการ



สรุปผลการดำเนินโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569


เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

ณ ไตรมาสที่ 3/2569 (ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2569)

ที่	ยุทธศาสตร์การพัฒนา	ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น				ที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ				ที่ได้ดำเนินการ			
		โครงการ		งบประมาณ		โครงการ		งบประมาณ		โครงการ		งบประมาณ	
		จำนวน	ร้อยละ	จำนวน (บาท)	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน (บาท)	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน (บาท)	ร้อยละ
1	ด้านโครงสร้างพื้นฐาน	147	39.30	970,458,796.00	63.52	86	22.99	427,033,648.00	27.95	74	19.79	410,576,648.00	26.88
2	ด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว	13	3.48	16,700,000.00	1.09	9	2.41	8,749,800.00	0.57	7	1.87	8,739,800.00	0.57
3	ด้านการจัดการ ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม	9	2.41	136,100,000.00	8.91	4	1.07	20,650,000.00	1.35	4	1.07	20,650,000.00	1.35
4	ด้านสวัสดิการสังคมและ คุณภาพชีวิต	125	33.42	42,049,700.00	2.75	108	28.88	24,628,125.00	1.61	99	26.47	24,152,425.00	1.58
5	ด้านการศึกษา การกีฬา ศาสนา ประเพณีและวัฒนธรรม	63	16.84	355,414,500.00	23.26	52	13.90	159,870,200.00	10.46	41	10.96	154,937,200.00	10.14
6	ด้านการบริหารจัดการที่ดี	17	4.55	6,970,000.00	0.46	10	2.67	1,470,000.00	0.10	10	2.67	1,470,000.00	0.10
รวมทั้งสิ้น		374	100.00	1,527,692,996.00	100.00	269	71.93	642,401,773.00	42.05	235	62.83	620,526,073.00	40.62

หมายเหตุ ที่ได้ดำเนินการ หมายถึง โครงการที่ดำเนินการเสร็จสิ้นรวมกับโครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ

บัญชีรายละเอียด
ผลการดำเนินโครงการที่ถ่ายจากงบประมาณ
ตามเทศบัญญัติฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569



สรุปผลการดำเนินโครงการตามแผนพัฒนาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ ไตรมาสที่ 3/2569 (ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2569)

จำนวนโครงการที่ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 มีทั้งหมด 269 โครงการ งบประมาณรวมทั้งสิ้น 642,401,773 บาท (หกร้อยสี่สิบสองล้านสี่แสนหนึ่งพันเจ็ดร้อยเจ็ดสิบสามบาทถ้วน)
มีรายละเอียดผลการดำเนินงาน ดังนี้

1. โครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 จำนวน 226 โครงการ งบประมาณ 316,100,125 บาท

ยุทธศาสตร์	รวมทั้งสิ้น			ดำเนินการเสร็จสิ้น			ระหว่างดำเนินการ			ไม่ได้ดำเนินการ		ยกเลิก	
	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบประมาณที่เบิกจ่าย	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบประมาณที่เบิกจ่าย	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบประมาณที่เบิกจ่าย	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้
1. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน	43	100,732,000.00	13,536,240.50	11	20,293,000.00	12,449,128.00	32	80,439,000.00	1,087,112.50	-	-	-	-
2. ด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว	9	8,749,800.00	3,645,800.00	2	1,944,600.00	1,944,600.00	5	6,795,200.00	1,701,200.00	2	10,000.00	-	-
3. ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	4	20,650,000.00	442,575.00	-	-	-	4	20,650,000.00	442,575.00	-	-	-	-
4. ด้านสวัสดิการสังคมและคุณภาพชีวิต	108	24,628,125.00	10,244,351.30	75	9,115,310.00	8,901,816.30	24	15,037,115.00	1,342,535.00	8	475,700.00	1	-
5. ด้านการศึกษา การกีฬา ศาสนา ประเพณีและวัฒนธรรม	52	159,870,200.00	95,679,433.03	16	6,144,456.00	6,071,490.75	25	148,792,744.00	89,607,942.28	6	4,933,000.00	5	-
6. ด้านการบริหารจัดการที่ดี	10	1,470,000.00	328,690.00	4	340,000.00	249,890.00	6	1,130,000.00	78,800.00	-	-	-	-
รวม	226	316,100,125.00	123,877,089.83	108	37,837,366.00	29,616,925.05	96	272,844,059.00	94,260,164.78	16	5,418,700.00	6	-
คิดเป็นร้อยละ		100.00			47.79			42.48			7.08		2.65

สรุปผลการดำเนินโครงการตามแผนพัฒนาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ ไตรมาสที่ 3/2569 (ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2569)

2. โครงการที่จ่ายจากเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 จำนวน 42 โครงการ งบประมาณ 306,501,648 บาท

ยุทธศาสตร์	รวมทั้งสิ้น			ดำเนินการเสร็จสิ้น			ระหว่างดำเนินการ			ไม่ได้ดำเนินการ		ยกเลิก	
	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบประมาณที่เบิกจ่าย	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบประมาณที่เบิกจ่าย	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบประมาณที่เบิกจ่าย	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้
1. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน	42	306,501,648.00	-	-	-	-	30	290,044,648.00	-	12	16,457,000.00	-	-
รวม	42	306,501,648.00	-	-	-	-	30	290,044,648.00	-	12	16,457,000.00	-	-
คิดเป็นร้อยละ	100.00			0.00			71.43			28.57		0.00	

3. โครงการที่จ่ายจากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 จำนวน 1 โครงการ งบประมาณ 19,800,000 บาท

ยุทธศาสตร์	รวมทั้งสิ้น			ดำเนินการเสร็จสิ้น			ระหว่างดำเนินการ			ไม่ได้ดำเนินการ		ยกเลิก	
	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบประมาณที่เบิกจ่าย	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบประมาณที่เบิกจ่าย	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบประมาณที่เบิกจ่าย	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้
1. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน	1	19,800,000.00	-	-	-	-	1	19,800,000.00	-	-	-	-	-
รวม	1	19,800,000.00	-	-	-	-	1	19,800,000.00	-	-	-	-	-
คิดเป็นร้อยละ	100.00			0.00			100.00			0.00		0.00	

รวมทั้งสิ้น	269	642,401,773.00	123,877,089.83	108	37,837,366.00	29,616,925.05	127	582,688,707.00	94,260,164.78	28	21,875,700.00	6	-
คิดเป็นร้อยละ	100.00			40.15			47.21			10.41		2.23	

รายงานผลการดำเนินงานของโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

ณ ไตรมาสที่ 3/2569 (ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2569)

แบบรายงาน 2.1

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	แผนการดำเนินงานที่กำหนดไว้		สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมา นคงเหลือ (บาท)	หมายเหตุ (กรณีไม่เป็นไปตาม แผนการดำเนินงาน)
					วันที่เริ่มต้น	วันที่สิ้นสุด	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน												
1	โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลติกคอนกรีตถนนกาญจนาภิเษก 16 ซอย 9 แยกซ้าย 1	537,000.00	-	-	1 ม.ค. 69	30 เม.ย. 69			✓	342,216.00	194,784.00	
2	โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลติกคอนกรีตถนนกาญจนาภิเษก 16 ซอย 9 แยกซ้าย 2	568,000.00	-	-	1 ม.ค. 69	30 เม.ย. 69			✓	361,600.00	206,400.00	
3	โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลติกคอนกรีตถนนกาญจนาภิเษก 15	3,867,000.00	-	-	1 ม.ค. 69	30 เม.ย. 69			✓	2,460,140.00	1,406,860.00	
4	โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลติกคอนกรีตถนนกาญจนาภิเษก 32	2,337,000.00	-	-	1 ม.ค. 69	30 เม.ย. 69			✓	1,487,290.00	849,710.00	
5	โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลติกคอนกรีตถนนชนเกษม	7,701,000.00	-	-	1 มี.ค. 69	30 มิ.ย. 69		ขออนุมัติใช้ผลทดสอบ		-	7,701,000.00	
6	โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลติกคอนกรีตถนนชนเกษม ซอย 27	886,000.00	-	-	1 ม.ค. 69	30 เม.ย. 69			✓	563,928.00	322,072.00	
7	โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลติกคอนกรีตถนนตลาดใหม่ Sta 0+325-2+200 แยกวัดโพธิ์ - ตลาดเกษตร 2	9,033,000.00	-	-	1 ต.ค. 68	31 ม.ค. 69			✓	5,188,177.00	3,844,823.00	
8	โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลติกคอนกรีตถนนปากน้ำ ซอย 6	1,688,000.00	-	-	1 ม.ค. 69	30 เม.ย. 69			✓	1,074,036.00	613,964.00	
9	โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลติกคอนกรีตถนนเลียยมือง ซอย 13/3	585,000.00	-	-	1 ม.ค. 69	30 เม.ย. 69			✓	361,638.00	223,362.00	
10	โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลติกคอนกรีตถนนวัดธรรมบูชา	287,000.00	-	-	1 ต.ค. 68	31 ม.ค. 69			✓	162,951.00	124,049.00	
11	โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลติกคอนกรีตถนนวัดโพธิ์ 31 ซอย 10	155,000.00	-	-	1 ม.ค. 69	30 เม.ย. 69			✓	99,152.00	55,848.00	
12	โครงการปรับปรุงทางเท้าถนนวัดโพธิ์ซอย 2	1,202,000.00	-	-	1 มิ.ย. 69	30 ก.ย. 69		จัดทำราคากลางครั้งที่ 2		-	1,202,000.00	

รายงานผลการดำเนินงานของโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

ณ ไตรมาสที่ 3/2569 (ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2569)

แบบรายงาน 2.1

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	แผนการดำเนินงานที่กำหนดไว้		สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หมายเหตุ (กรณีไม่เป็นไปตาม แผนการดำเนินงาน)
					วันที่เริ่มต้น	วันที่สิ้นสุด	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			
13	โครงการปรับปรุงสะพานข้ามคลองกุตุ	2,000,000.00	-	-	1 มิ.ย. 69	31 ธ.ค. 69		จัดทำราคากลาง		-	2,000,000.00	
14	โครงการก่อสร้างสะพานข้ามคลองบางกุ้ง	5,500,000.00	-	-	1 มี.ค. 69	31 ธ.ค. 69		จัดทำราคากลาง		-	5,500,000.00	
15	โครงการปรับปรุงพื้นลานทางเดินบริเวณสะพานนริศ	350,000.00	-	-	1 ธ.ค. 68	31 พ.ค. 69			✓	348,000.00	2,000.00	
16	โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลท์คอนกรีต (Over-lay) ถนนชนเกษม ช่วงที่ 1	2,200,000.00	-	-	1 ต.ค. 68	31 พ.ค. 69		อยู่ระหว่างก่อสร้าง ผลงาน 0.05%		-	2,200,000.00	ล่วงเลยระยะเวลาสิ้นสุด แต่ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ
17	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจรถนนศรีวิชัย 20	7,258,000.00	-	-	1 ม.ค. 69	31 พ.ค. 69		ออกแบบและเขียนแบบ		-	7,258,000.00	ล่วงเลยระยะเวลาสิ้นสุด แต่ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ
18	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจร ถนนกาญจนาวิถี 25	1,622,000.00	-	-	1 ม.ค. 69	30 เม.ย. 69		จัดทำราคากลาง		-	1,622,000.00	ล่วงเลยระยะเวลาสิ้นสุด แต่ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ
19	โครงการปรับปรุงท่อระบายน้ำและผิวจราจร ถนนกาญจนาวิถี 25/1	1,024,000.00	-	-	1 ม.ค. 69	30 เม.ย. 69		เขตก่อสร้างเข้าที่ เอกชน รออุทกที่คืน		-	1,024,000.00	ล่วงเลยระยะเวลาสิ้นสุด แต่ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ
20	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจร ถนนศรีวิชัย 21 แยกซอยบ้านมะขาม เชื่อมต่อ ถนนเลี่ยงเมืองแยกขวา 1	719,000.00	-	-	1 ธ.ค. 68	28 ก.พ. 69		จัดทำราคากลาง		-	719,000.00	ล่วงเลยระยะเวลาสิ้นสุด แต่ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ
21	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจร ถนนศรีวิชัย 26 ซอย 8	1,020,000.00	-	-	1 ธ.ค. 68	28 ก.พ. 69		จัดทำราคากลาง		-	1,020,000.00	ล่วงเลยระยะเวลาสิ้นสุด แต่ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ
22	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจร ถนนค่ายอ.ส. 2	4,189,000.00	-	-	1 ก.พ. 69	31 พ.ค. 69		ขออนุมัติจ้าง		-	4,189,000.00	ล่วงเลยระยะเวลาสิ้นสุด แต่ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ
23	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจร ถนนข้างโรงพยาบาลค่ายวิภาวดี แยกขวา 1	2,724,000.00	-	-	1 ธ.ค. 68	31 มี.ค. 69		ขออนุมัติจ้าง		-	2,724,000.00	ล่วงเลยระยะเวลาสิ้นสุด แต่ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ
24	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจร ถนนกาญจนาวิถี 29	2,932,000.00	-	-	1 ธ.ค. 68	31 มี.ค. 69		จัดทำราคากลาง		-	2,932,000.00	ล่วงเลยระยะเวลาสิ้นสุด แต่ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ
25	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจร ถนนตลาดใหม่ 39 ซอย 2	1,069,000.00	-	-	1 ก.พ. 69	31 พ.ค. 69		ขอเปลี่ยนแปลง ค่าจ้างงบประมาณ		-	1,069,000.00	ล่วงเลยระยะเวลาสิ้นสุด แต่ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ
26	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจร ถนนโรงน้ำแข็ง (บางอิฐ)	2,194,000.00	-	-	1 ก.พ. 69	31 พ.ค. 69		ออกแบบและเขียนแบบ		-	2,194,000.00	ล่วงเลยระยะเวลาสิ้นสุด แต่ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ

รายงานผลการดำเนินงานของโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

ณ ไตรมาสที่ 3/2569 (ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2569)

แบบรายงาน 2.1

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	แผนการดำเนินงานที่กำหนดไว้		สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หมายเหตุ (กรณีไม่เป็นไปตาม แผนการดำเนินงาน)
					วันที่เริ่มต้น	วันที่สิ้นสุด	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			
27	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและฝิวจราจรถนนบางกุ้ง 1 หน้าหมู่บ้านปาร์ครีเด้นซ์	4,728,000.00	-	-	1 ก.พ. 69	31 พ.ค. 69		ขออนุมัติจ้าง		-	4,728,000.00	ล่วงเลยระยะเวลาสิ้นสุด แต่ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ
28	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและฝิวจราจรถนนกาญจนาวิถี 16 ซอย 1 (พวงทิพย์)	2,216,000.00	-	-	1 ก.พ. 69	31 พ.ค. 69		ออกสำรวจ จัดทำค่าระดับ		-	2,216,000.00	ล่วงเลยระยะเวลาสิ้นสุด แต่ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ
29	โครงการปรับปรุงบ่อพัก ค.ส.ล. ถนนในเขตเทศบาล	8,185,000.00	-	-	1 พ.ย. 68	31 มี.ค. 69		บริหารสัญญา ผลงาน 0%		-	8,185,000.00	ล่วงเลยระยะเวลาสิ้นสุด แต่ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ
30	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและฝิวจราจรถนนพ้อขุนทะเล 13	4,100,000.00	-	-	1 มี.ค. 69	30 มิ.ย. 69		ออกสำรวจ จัดทำค่าระดับ		-	4,100,000.00	
31	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและฝิวจราจรถนนพ้อขุนทะเล 11	3,174,000.00	-	-	1 มี.ค. 69	30 มิ.ย. 69		ขออนุมัติจ้าง		-	3,174,000.00	
32	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและฝิวจราจรถนนพ้อขุนทะเล 10/5	2,226,000.00	-	-	1 มี.ค. 69	30 มิ.ย. 69		ขออนุมัติจ้าง		-	2,226,000.00	
33	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำถนนเลียบบึงพ้อขุนทะเล (โรงเรียนนานาชาติ - สะพานข้ามคลองท่ากูบ)	4,327,000.00	-	-	1 มี.ค. 69	30 มิ.ย. 69		ออกแบบและเขียนแบบ		-	4,327,000.00	
34	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและฝิวจราจรถนนชนเกษม 37	2,900,000.00	-	-	1 มี.ค. 69	30 มิ.ย. 69		ออกสำรวจ จัดทำค่าระดับ		-	2,900,000.00	
35	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและฝิวจราจรถนนเลียงเมือง 4	1,144,000.00	-	-	1 มี.ค. 69	30 มิ.ย. 69		ออกสำรวจ จัดทำค่าระดับ		-	1,144,000.00	
36	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและฝิวจราจรถนนวิภาวดี ซอยมายเทอเรส	702,000.00	-	-	1 ต.ค. 68	31 ธ.ค. 68		อยู่ระหว่างทำสัญญา		-	702,000.00	ล่วงเลยระยะเวลาสิ้นสุด แต่ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ
37	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและฝิวจราจรถนนตอนนง 11 (ข้างสำนักงานทะเบียนธุรกิจนำเที่ยว)	1,400,000.00	-	-	1 พ.ย. 68	28 ก.พ. 69		ออกสำรวจ จัดทำค่าระดับ		-	1,400,000.00	ล่วงเลยระยะเวลาสิ้นสุด แต่ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ
38	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและฝิวจราจรถนนบางใหญ่ 4	894,000.00	-	-	1 พ.ย. 68	28 ก.พ. 69		จัดทำราคากลาง		-	894,000.00	ล่วงเลยระยะเวลาสิ้นสุด แต่ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ

รายงานผลการดำเนินงานของโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

ณ ไตรมาสที่ 3/2569 (ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2569)

แบบรายงาน 2.1

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	แผนการดำเนินงานที่กำหนดไว้		สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หมายเหตุ (กรณีไม่เป็นไปตาม แผนการดำเนินงาน)
					วันที่เริ่มต้น	วันที่สิ้นสุด	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			
39	โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะถนนยางงาม 2/1 เชื่อมต่อถนนกาญจนาภิเษก 7	803,000.00	-	-	1 พ.ย. 68	31 ส.ค. 69		เบิกจ่ายเงินแล้ว อยู่ระหว่างการไฟฟ้า ส่วนภูมิภาคดำเนินการ		802,948.30	51.70	
40	โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะซอยตรงข้าม ซอยบุญช่วย 10	28,000.00	-	-	1 พ.ย. 68	31 ส.ค. 69		เบิกจ่ายเงินแล้ว อยู่ระหว่างการไฟฟ้า ส่วนภูมิภาคดำเนินการ		27,412.30	587.70	
41	โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะซอยกาญจนาภิเษก 28/1	90,000.00	-	-	1 พ.ย. 68	31 ส.ค. 69		เบิกจ่ายเงินแล้ว อยู่ระหว่างการไฟฟ้า ส่วนภูมิภาคดำเนินการ		89,384.60	615.40	
42	โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะถนนทางขึ้นเขาท่าเพชร	117,000.00	-	-	1 พ.ย. 68	31 ส.ค. 69		เบิกจ่ายเงินแล้ว อยู่ระหว่างการไฟฟ้า ส่วนภูมิภาคดำเนินการ		116,730.60	269.40	
43	โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะซอยปากน้ำ 1/1	51,000.00	-	-	1 พ.ย. 68	31 ส.ค. 69		เบิกจ่ายเงินแล้ว อยู่ระหว่างการไฟฟ้า ส่วนภูมิภาคดำเนินการ		50,636.70	363.30	
รวม		100,732,000.00	-	-						13,536,240.50	87,195,759.50	
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว												
44	โครงการเคาท์ดาว์น/สวีตตีปีใหม่	500,000.00	-	5,400.00	1 ต.ค. 68	31 ม.ค. 69			✓	494,600.00	-	
45	โครงการตลาดสะพานโค้ง 100 ปี	400,000.00	-	200,000.00	1 ต.ค. 68	30 ก.ย. 69		จำหน่ายสินค้า ทุกวันเสาร์และ วันอาทิตย์		188,000.00	12,000.00	
46	โครงการถนนคนเดิน	300,000.00	-	200,000.00	1 ต.ค. 68	30 ก.ย. 69		จำหน่ายสินค้า ทุกวันเสาร์		18,000.00	82,000.00	
47	โครงการเย็นทั่วหล้า มหาสงกรานต์	500,000.00	1,000,000.00	50,000.00	1 ก.พ. 69	31 พ.ค. 69			✓	1,450,000.00	-	
48	โครงการส่งเสริมกิจกรรมและประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี	1,500,000.00	-	4,800.00	1 ต.ค. 68	30 ก.ย. 69		จัดกิจกรรมภายใน ปีงบประมาณ		1,495,200.00	-	

รายงานผลการดำเนินงานของโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

ณ ไตรมาสที่ 3/2569 (ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2569)

แบบรายงาน 2.1

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	แผนการดำเนินงานที่กำหนดไว้		สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หมายเหตุ (กรณีไม่เป็นไปตาม แผนการดำเนินงาน)
					วันที่เริ่มต้น	วันที่สิ้นสุด	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			
49	โครงการถนนคนเดินเชิงศิลปะย่านเมืองเก่าบ้านล่าง	300,000.00	-	300,000.00	1 ต.ค. 68	30 ก.ย. 69	✓			-	-	ล่วงเลยเวลาเริ่มดำเนินการ แต่ยังไม่เริ่มดำเนินการ
50	โครงการเทศกาลดนตรี	500,000.00	-	490,000.00	1 ม.ค. 69	31 พ.ค. 69	✓			-	10,000.00	ล่วงเลยเวลาเริ่มดำเนินการ แต่ยังไม่เริ่มดำเนินการ
51	โครงการจัดงาน Surat Music Nighth Run	-	2,000,000.00	-	1 พ.ค. 69	30 ก.ย. 69		พิจารณาราคากลาง		-	2,000,000.00	
52	โครงการปั่นให้ทรอยใจเกินร้อยเมืองคนดี	-	3,000,000.00	-	1 เม.ย. 69	30 ก.ย. 69		ประกวดผล ผู้ชนะประกวดราคา		-	3,000,000.00	
รวม		4,000,000.00	6,000,000.00	1,250,200.00						3,645,800.00	5,104,000.00	
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม												
53	โครงการเฝ้าระวังสิ่งแวดล้อมเมือง	200,000.00	-	-	1 ต.ค. 68	30 ก.ย. 69		- เฝ้าระวังคุณภาพอากาศ ทุกวันจันทร์ พุธ ศุกร์ - ตรวจสอบคุณภาพน้ำ ทุกไตรมาส - จัดอบรมแกนนำชุมชน เมื่อวันที่ 18 มิ.ย. 2569		99,620.00	100,380.00	
54	โครงการลดโลกร้อนกับนครสุราษฎร์ธานี	200,000.00	-	-	1 ต.ค. 68	30 ก.ย. 69		กำหนดจัดประชุม ให้ความรู้คณะอนุกรรมการ เพื่อขับเคลื่อนงาน อพ.สธ. เดือนมิถุนายน 2569		172,655.00	27,345.00	
55	โครงการลดขยะต้นทางกับนครสุราษฎร์ธานี	250,000.00	-	-	1 ต.ค. 68	30 ก.ย. 69		ดำเนินโครงการตลอด ทั้งปี		170,300.00	79,700.00	
56	โครงการจ้างที่ปรึกษาศึกษาความเหมาะสมและออกแบบ รายละเอียดระบบรวบรวมและระบบบำบัดน้ำเสียในพื้นที่ เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี (โอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่)	-	20,000,000.00	-	1 มิ.ย. 69	31 ก.ค. 71		ขออนุมัติจ้าง		-	20,000,000.00	
รวม		650,000.00	20,000,000.00	-						442,575.00	20,207,425.00	

รายงานผลการดำเนินงานของโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

ณ ไตรมาสที่ 3/2569 (ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2569)

แบบรายงาน 2.1

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	แผนการดำเนินงานที่กำหนดไว้		สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หมายเหตุ (กรณีไม่เป็นไปตาม แผนการดำเนินงาน)
					วันที่เริ่มต้น	วันที่สิ้นสุด	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสวัสดิการสังคมและคุณภาพชีวิต												
57	โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการด้านบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการชุมชน	250,000.00	-	-	1 พ.ค. 69	30 มิ.ย. 69			✓	203,450.00	46,550.00	
58	โครงการบุคคลต้นแบบในชุมชน	300,000.00	-	93,000.00	1 ต.ค. 68	31 ธ.ค. 68			✓	206,700.00	300.00	
59	โครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการและคณะทำงานชุมชน	1,600,000.00	-	126,800.00	1 ธ.ค. 68	28 ก.พ. 69			✓	1,473,151.30	48.70	
60	โครงการพัฒนาระบบข้อมูลครัวเรือนชุมชนเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี	50,000.00	-	-	1 ต.ค. 68	30 ก.ย. 69		ปรับปรุงฐานข้อมูลครัวเรือนชุมชนเพื่อใช้ในการพัฒนาชุมชน		-	50,000.00	
61	โครงการแข่งขันกีฬาพื้นบ้านชุมชนสัมพันธ์	300,000.00	-	18,850.00	1 ก.พ. 69	30 ก.ย. 69			✓	281,150.00	-	
62	โครงการส่งเสริมการใช้จักรยานเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนในชุมชน	20,000.00	-	-	1 พ.ค. 69	30 มิ.ย. 69		แก้ไขค่าจ้างงบประมาณเพื่อจัดโครงการ		-	20,000.00	
63	โครงการพัฒนาศักยภาพสตรี	780,000.00	-	-	1 ม.ค. 69	31 มี.ค. 69			✓	723,670.00	56,330.00	
64	โครงการสตรีต้นแบบในชุมชนผู้ทำหน้าที่มารดาที่สมบูรณ์แบบ	200,000.00	-	-	1 ก.ค. 69	30 ก.ย. 69	✓			-	200,000.00	
65	โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการกลุ่มผู้นำสตรีเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี	70,000.00	-	-	1 ต.ค. 68	30 ก.ย. 69		จัดฝึกอบรม หลักสูตรส่งเสริมเครือข่ายแกนนำสตรีสร้างสังคมจิตอาสาพัฒนาชุมชนเมื่อวันที่ 25 มิ.ย. 2569 ณ ร.ร.เทศบาล 1		55,135.00	14,865.00	

รายงานผลการดำเนินงานของโครงการตามเทคโนโลยีดิจิทัลงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

ณ ไตรมาสที่ 3/2569 (ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2569)

แบบรายงาน 2.1

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	แผนการดำเนินงานที่กำหนดไว้		สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หมายเหตุ (กรณีไม่เป็นไปตาม แผนการดำเนินงาน)
					วันที่เริ่มต้น	วันที่สิ้นสุด	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			
66	โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพเครือข่ายผู้ผลิต ผลิตภัณฑ์ชุมชน	20,000.00	-	-	1 ต.ค. 68	30 ก.ย. 69		ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร การตรวจสอบคุณภาพ ผลิตภัณฑ์ชุมชน สู่มาตรฐาน OTOP/ อย./มผช. เมื่อวันที่ 17 มิ.ย. 2569 ณ ห้องประชุมเล็ก ชั้น 9		9,300.00	10,700.00	
67	โครงการส่งเสริมศักยภาพและพัฒนาระบบสวัสดิการสังคม	406,000.00	-	62,775.00	1 ต.ค. 68	30 ก.ย. 69		เตรียมการจัดฝึกอบรม เชิงปฏิบัติการ การใช้ งานโปรแกรมการ จัดการฐานข้อมูล กองทุนฯ		343,225.00	-	
68	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพกระถางปันสุข ปลูกผักสวนครัว / ชุมชนปากน้ำ	30,000.00	-	-	1 ม.ค. 69	31 พ.ค. 69			✓	30,000.00	-	
69	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการซ่อมเครื่องมือประมง / ชุมชนหาดตายวง	30,000.00	-	-	1 ม.ค. 69	31 พ.ค. 69			✓	30,000.00	-	
70	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการทำกระเป๋ามีตะและ ผ้าทั่วไป / ชุมชนหน้าค่าย อส.	30,400.00	-	-	1 ม.ค. 69	31 พ.ค. 69			✓	30,400.00	-	
71	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการทำกระเป๋ามัดย้อมจาก สีธรรมชาติ / ชุมชนตลาดดอนนก	30,000.00	-	-	1 ม.ค. 69	31 พ.ค. 69			✓	30,000.00	-	
72	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการทำกระเป๋ามีตะ Eco Print / ชุมชนมะขามเตี้ย	30,000.00	-	-	1 ม.ค. 69	31 พ.ค. 69			✓	30,000.00	-	
73	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการทำกะหรี่ปั๊ / ชุมชน เมตตาธรรม	30,000.00	-	-	1 ม.ค. 69	31 พ.ค. 69			✓	30,000.00	-	

รายงานผลการดำเนินงานของโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

ณ ไตรมาสที่ 3/2569 (ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2569)

แบบรายงาน 2.1

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	แผนการดำเนินงานที่กำหนดไว้		สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หมายเหตุ (กรณีไม่เป็นไปตาม แผนการดำเนินงาน)
					วันที่เริ่มต้น	วันที่สิ้นสุด	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			
74	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการทำขนมไทย (ขนมฝอยทอง ทองหยิบ ทองหยอด เม็ดขนุน ขนมชั้น ขนมวุ้น) / ชุมชนบางกุ้ง 3	30,000.00	-	-	1 ม.ค. 69	31 พ.ค. 69			✓	30,000.00	-	
75	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการทำขนมไทย / ชุมชน คลองฉนาก	30,000.00	-	-	1 ม.ค. 69	31 พ.ค. 69			✓	30,000.00	-	
76	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการทำขนมไทย / ชุมชนเสรีไท	30,000.00	-	-	1 ม.ค. 69	31 พ.ค. 69	✓			-	30,000.00	ชุมชนไม่ประสงค์รับเงิน อุดหนุน
77	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการทำขนมไทย / ชุมชนหลังอาชีวะ	30,000.00	-	-	1 ม.ค. 69	31 พ.ค. 69			✓	30,000.00	-	
78	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการทำขนมเบเกอรี่ / ชุมชนหลังคลัง	30,000.00	-	-	1 ม.ค. 69	31 พ.ค. 69			✓	30,000.00	-	
79	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการทำขนมเบเกอรี่ ไล่หมู หยอง ไล่ด้วงดำ ไล่ใบเตย ไล่เผือก ไล่ฝอยทอง ไล่ลูกเกด ไล่มะพร้าวอ่อน / ชุมชนวัดกลางใหม่	30,000.00	-	-	1 ม.ค. 69	31 พ.ค. 69			✓	30,000.00	-	
80	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการทำข้าวเหนียวมูล หน้าต่าง ๆ / ชุมชนหนองบัว	30,000.00	-	-	1 ม.ค. 69	31 พ.ค. 69	✓			-	30,000.00	ชุมชนไม่ประสงค์รับเงิน อุดหนุน
81	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการทำข้าวเหนียวหมูฝอย หมูหวาน หมูทุบ / ชุมชนย่านยาว	30,000.00	-	-	1 ม.ค. 69	31 พ.ค. 69			✓	30,000.00	-	
82	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการทำไข่เค็มแบบแห้ง แบบเปียก และปลาต้ม / ชุมชนลิริตุช	30,000.00	-	-	1 ม.ค. 69	31 พ.ค. 69			✓	30,000.00	-	
83	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการทำเครื่องมือประมง / ชุมชนบ้านบางขลา	30,000.00	-	-	1 ม.ค. 69	31 พ.ค. 69			✓	30,000.00	-	
84	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการทำเคดูพางบนตะกร้า กระจูด / ชุมชนโพหวาย	30,000.00	-	-	1 ม.ค. 69	31 พ.ค. 69			✓	30,000.00	-	
85	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการทำถักรอบแก้วเกลือ หลากหลายชาติ / ชุมชนเสรีพล	30,000.00	-	-	1 ม.ค. 69	31 พ.ค. 69			✓	30,000.00	-	

รายงานผลการดำเนินงานของโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

ณ ไตรมาสที่ 3/2569 (ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2569)

แบบรายงาน 2.1

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	แผนการดำเนินงานที่กำหนดไว้		สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หมายเหตุ (กรณีไม่เป็นไปตาม แผนการดำเนินงาน)
					วันที่เริ่มต้น	วันที่สิ้นสุด	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			
86	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการทำน้ำพริก / ชุมชนวัดไทร	30,000.00	-	-	1 ม.ค. 69	31 พ.ค. 69			✓	30,000.00	-	
87	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการทำน้ำพริกและเครื่องแกง ปักซี่ใต้ / ชุมชนบางกุ้ง 2	30,000.00	-	-	1 ม.ค. 69	31 พ.ค. 69			✓	30,000.00	-	
88	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการทำน้ำยาล้างจานและ น้ำยาซักผ้า / ชุมชนเพชรวิลา	30,000.00	-	-	1 ม.ค. 69	31 พ.ค. 69			✓	30,000.00	-	
89	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการทำผ้าไทยและซอสปรุงรรมัค ไทยสำเร็จรูป / ชุมชนศรีธานี-ยางงาม	30,000.00	-	-	1 ม.ค. 69	31 พ.ค. 69			✓	30,000.00	-	
90	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการทำพืชมัลโม่ Eco Print / ชุมชนรวมเพชรสามัคคี	30,000.00	-	-	1 ม.ค. 69	31 พ.ค. 69			✓	30,000.00	-	
91	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการทำพืชมัลโม่ / ชุมชนบ้านบางใหญ่	30,000.00	-	-	1 ม.ค. 69	31 พ.ค. 69			✓	30,000.00	-	
92	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการทำมัคย้อม / ชุมชนดงตาล	30,000.00	-	-	1 ม.ค. 69	31 พ.ค. 69			✓	30,000.00	-	
93	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการทำมัคย้อม / ชุมชนตาปี	30,000.00	-	-	1 ม.ค. 69	31 พ.ค. 69			✓	30,000.00	-	
94	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการทำมัคย้อม / ชุมชนทุ่งน้อย	30,000.00	-	-	1 ม.ค. 69	31 พ.ค. 69			✓	30,000.00	-	
95	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการทำมัคย้อม / ชุมชนวัดท่าทอง	30,000.00	-	-	1 ม.ค. 69	31 พ.ค. 69			✓	30,000.00	-	
96	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการทำมัคย้อม / ชุมชนวัดหน้าเมือง	30,000.00	-	-	1 ม.ค. 69	31 พ.ค. 69			✓	30,000.00	-	
97	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการทำมัคย้อม / ชุมชนศรีวิชัย	30,000.00	-	-	1 ม.ค. 69	31 พ.ค. 69	✓			-	30,000.00	ชุมชนไม่ประสงค์รับเงิน อุดหนุน
98	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการทำศิลปะบนผืนผ้า Marbling art / ชุมชนวังเพชร	30,000.00	-	-	1 ม.ค. 69	31 พ.ค. 69			✓	30,000.00	-	

รายงานผลการดำเนินงานของโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

ณ ไตรมาสที่ 3/2569 (ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2569)

แบบรายงาน 2.1

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	แผนการดำเนินงานที่กำหนดไว้		สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หมายเหตุ (กรณีไม่เป็นไปตาม แผนการดำเนินงาน)
					วันที่เริ่มต้น	วันที่สิ้นสุด	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			
99	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการทำสร้อยลูกปัดมโนราห์ / ชุมชนพวงเพชรพัฒนา	25,700.00	-	-	1 ม.ค. 69	31 พ.ค. 69	✓			-	25,700.00	ชุมชนไม่ประสงค์รับเงินอุดหนุน
100	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการทำสลัดผักและสลัดผลไม้ / ชุมชนศรีธานี	30,000.00	-	-	1 ม.ค. 69	31 พ.ค. 69			✓	30,000.00	-	
101	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการทำสลัดโรลปูอัดไส้กรอก ทุ่น้ำ น้ำสลัด น้ำสลัดงา ซีซ่า มายองเนส แชนวิสใส่ปูอัด / ชุมชนเคหะชุมชน	30,000.00	-	-	1 ม.ค. 69	31 พ.ค. 69			✓	30,000.00	-	
102	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการทำเสื้ออัตลักษณ์ชุมชน (ต่อเนื่อง 2568) / ชุมชนตลาดเกษตร 2	30,000.00	-	-	1 ม.ค. 69	31 พ.ค. 69			✓	30,000.00	-	
103	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการทำหมวกและกระเป๋าเดคูพาง / ชุมชนลูกเสือ-การ์ณราษฎร์	25,000.00	-	-	1 ม.ค. 69	31 พ.ค. 69			✓	25,000.00	-	
104	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการทำหมุกระจก หมูฟูพ หมูฝอย / ชุมชนบึงขุนทะเล	30,000.00	-	-	1 ม.ค. 69	31 พ.ค. 69			✓	30,000.00	-	
105	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการทำหมุแดดเดียว ปลาตุ๋น / ชุมชนท่าแขก	30,000.00	-	-	1 ม.ค. 69	31 พ.ค. 69			✓	30,000.00	-	
106	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการทำหมุแดดเดียว และการทำไข่เค็ม / ชุมชนท่ากูบ	30,000.00	-	-	1 ม.ค. 69	31 พ.ค. 69			✓	30,000.00	-	
107	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการทำหมูฝอย / ชุมชนกรมทหารราบที่ 25	30,000.00	-	-	1 ม.ค. 69	31 พ.ค. 69			✓	30,000.00	-	
108	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการทำหอยจ๊อ / ชุมชนฝั่งบางใบไม้	30,000.00	-	-	1 ม.ค. 69	31 พ.ค. 69			✓	30,000.00	-	
109	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการทำเหรียญโปรยทาน / ชุมชนกาญจนวิถีส่วมใจ	30,000.00	-	-	1 ม.ค. 69	31 พ.ค. 69			✓	30,000.00	-	
110	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการทำเหรียญโปรยทาน / ชุมชนบางกุ้ง 1	30,000.00	-	-	1 ม.ค. 69	31 พ.ค. 69			✓	30,000.00	-	

รายงานผลการดำเนินงานของโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

ณ ไตรมาสที่ 3/2569 (ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2569)

แบบรายงาน 2.1

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	แผนการดำเนินงานที่กำหนดไว้		สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หมายเหตุ (กรณีไม่เป็นไปตาม แผนการดำเนินงาน)
					วันที่เริ่มต้น	วันที่สิ้นสุด	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			
111	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการทำเหรียญโปรยทาน แฟนซี / ชุมชนตลาดล่าง	30,000.00	-	-	1 ม.ค. 69	31 พ.ค. 69			✓	30,000.00	-	
112	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการทำเหรียญโปรยทาน และดอกไม้จันทน์ / ชุมชนตลาดหน้าศูนย์สร้างทาง	30,000.00	-	-	1 ม.ค. 69	31 พ.ค. 69			✓	30,000.00	-	
113	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการทำอาหารอีสาน ลาบ น้ำตก คอหมูย่าง หมูแดดเดียว / ชุมชนในลีก	30,000.00	-	-	1 ม.ค. 69	31 พ.ค. 69			✓	30,000.00	-	
114	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการนวดแผนไทย (ต่อเนื่องปี 2568) / ชุมชนราษฎร์อุทิศ	30,000.00	-	-	1 ม.ค. 69	31 พ.ค. 69			✓	30,000.00	-	
115	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการนวดแผนโบราณ / ชุมชนเปี่ยมสุข	30,000.00	-	-	1 ม.ค. 69	31 พ.ค. 69			✓	30,000.00	-	
116	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการแปรรูปอาหาร / ชุมชนหัวแหลมพัฒนา	30,000.00	-	-	1 ม.ค. 69	31 พ.ค. 69			✓	30,000.00	-	
117	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการผลิตเครื่องมือประมง (อวนปลา) / ชุมชนบางกุ้ง	30,000.00	-	-	1 ม.ค. 69	31 พ.ค. 69			✓	30,000.00	-	
118	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการผูกผ้าตามงานพิธีต่างๆ / ชุมชนร.25 พัน 3	30,000.00	-	-	1 ม.ค. 69	31 พ.ค. 69			✓	30,000.00	-	
119	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการพิมพ์ผลิตภัณฑ์ ด้วยเทคนิค Marbling Art / ชุมชนหน้าด่าน	30,000.00	-	-	1 ม.ค. 69	31 พ.ค. 69			✓	30,000.00	-	
120	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการพันท์กระเป่า ลายผ้าบาติก / ชุมชนนาเนียน	30,000.00	-	-	1 ม.ค. 69	31 พ.ค. 69	✓			-	30,000.00	ชุมชนไม่ประสงค์รับเงิน อุดหนุน
121	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการพันท์ผ้าปาเต๊ะ / ชุมชนสหกรณ์ครู	30,000.00	-	-	1 ม.ค. 69	31 พ.ค. 69			✓	30,000.00	-	
122	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการเพาะเห็ดฟางข้าว / ชุมชนวัดโพธิ์वास	30,000.00	-	-	1 ม.ค. 69	31 พ.ค. 69			✓	30,000.00	-	
123	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการเพิ่มมูลค่า กระเป่าจักสานเคคูพาง / ชุมชนไทยสมุทร	30,000.00	-	-	1 ม.ค. 69	31 พ.ค. 69			✓	30,000.00	-	

รายงานผลการดำเนินงานของโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

ณ ไตรมาสที่ 3/2569 (ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2569)

แบบรายงาน 2.1

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	แผนการดำเนินงานที่กำหนดไว้		สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หมายเหตุ (กรณีไม่เป็นไปตาม แผนการดำเนินงาน)
					วันที่เริ่มต้น	วันที่สิ้นสุด	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			
124	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการเพิ่มมูลค่า กระเป๋ากันน้ำเดคูพาง / ชุมชนอ้อมค่ายวิภาวดีรังสิต	30,000.00	-	-	1 ม.ค. 69	31 พ.ค. 69			✓	30,000.00	-	
125	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการเพิ่มมูลค่า ข้าวเหนียวหมูปวย / ชุมชนหน้าศาลากลาง	24,600.00	-	-	1 ม.ค. 69	31 พ.ค. 69			✓	24,600.00	-	
126	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการเพิ่มมูลค่า ผลิตภัณฑ์กระจูด / ชุมชนแหลมทราย	30,000.00	-	-	1 ม.ค. 69	31 พ.ค. 69			✓	30,000.00	-	
127	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการเลี้ยงไก่ไข่ / ชุมชนบ้านบางทอง	30,000.00	-	-	1 ม.ค. 69	31 พ.ค. 69			✓	30,000.00	-	
128	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการสานตะกร้า ด้วยเส้นพลาสติก / ชุมชนเสม็ดเรียง	30,000.00	-	-	1 ม.ค. 69	31 พ.ค. 69	✓			-	30,000.00	ชุมชนไม่ประสงค์รับเงิน อุดหนุน
129	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพของอาชีพ / ชุมชนราษฎร์บำรุง-ดอนนก	30,000.00	-	-	1 ม.ค. 69	31 พ.ค. 69			✓	30,000.00	-	
130	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพเรซินในวันว่าง / ชุมชนตลาดท่าเรือ	30,000.00	-	-	1 ม.ค. 69	31 พ.ค. 69			✓	30,000.00	-	
131	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพสะเต๊ะตลาดใหม่ / ชุมชนตลาดใหม่-ดอนนก	30,000.00	-	-	1 ม.ค. 69	31 พ.ค. 69			✓	30,000.00	-	
132	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพสะเต๊ะเทศบาล / ชุมชนเทศบาล	30,000.00	-	-	1 ม.ค. 69	31 พ.ค. 69			✓	30,000.00	-	
133	โครงการขับเคลื่อนกิจกรรมสภาเด็กและเยาวชนเทศบาล นครสุราษฎร์ธานี	20,000.00	-	9,500.00	1 ต.ค. 68	30 ส.ค. 69		จัดประชุมคณะกรรมการ สภาเด็กและเยาวชน เทศบาลฯ ครั้งที่ 1/2569 เมื่อวันที่ 19 มิ.ย. 2569		4,900.00	5,600.00	
134	โครงการฝึกอบรมและศึกษาเรียนรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพ ผู้นำเด็กและเยาวชน	500,000.00	-	83,740.00	1 พ.ย. 68	31 พ.ค. 69			✓	416,260.00	-	

รายงานผลการดำเนินงานของโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

ณ ไตรมาสที่ 3/2569 (ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2569)

แบบรายงาน 2.1

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	แผนการดำเนินงานที่กำหนดไว้		สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หมายเหตุ (กรณีไม่เป็นไปตาม แผนการดำเนินงาน)
					วันที่เริ่มต้น	วันที่สิ้นสุด	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			
135	โครงการส่งเสริมและพัฒนาสวัสดิภาพเด็กและเยาวชน	80,000.00	-	-	1 เม.ย. 69	31 ส.ค. 69		กำหนดฝึกอบรม เชิงปฏิบัติการ หลักสูตร พัฒนาทักษะ เยาวชนยุคใหม่สื่อสาร สร้างสรรค์ ชูอัตลักษณ์ท้องถิ่น วันที่ 27 ก.ค. 2569		-	80,000.00	
136	โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสวัสดิการสังคม	50,000.00	-	-	1 ก.พ. 69	1 เม.ย. 69			✓	50,000.00	-	
137	โครงการเสริมพลัง สร้างภูมิคุ้มกัน ป้องกันยาเสพติด ในชุมชน	80,000.00	-	-	1 พ.ค. 69	31 ก.ค. 69		จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร ชุมชน ปลอดภัย ห่างไกลยาเสพติด เมื่อวันที่ 30 มิ.ย. 2569 ณ โรงแรมวังใต้		79,675.00	325.00	
138	โครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายผู้สูงอายุเทศบาลนคร สุราษฎร์ธานี	844,400.00	-	70,000.00	1 ต.ค. 69	31 มี.ค. 69			✓	758,990.00	15,410.00	
139	โครงการเสริมสร้างศักยภาพคณะกรรมการบริหารชมรม ผู้สูงอายุ	152,000.00	-	-	1 เม.ย. 69	31 ก.ค. 69		กำหนดคุณสมบัติ ผู้มีสิทธิรับเกียรติบัตร ตามโครงการฯ และกำหนดดำเนิน โครงการในเดือน ส.ค. 2569		-	152,000.00	

รายงานผลการดำเนินงานของโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

ณ ไตรมาสที่ 3/2569 (ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2569)

แบบรายงาน 2.1

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	แผนการดำเนินงานที่กำหนดไว้		สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หมายเหตุ (กรณีไม่เป็นไปตาม แผนการดำเนินงาน)
					วันที่เริ่มต้น	วันที่สิ้นสุด	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			
140	โครงการศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ (ศพอส.) เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี	200,000.00	-	18,010.00	1 ต.ค. 68	30 ก.ย. 69		ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร ผู้สูงอายุกับ การมีทัศนคติเชิงบวก วันที่ 22-24 มิ.ย. 2569 ณ ศพอส.		103,985.00	78,005.00	
141	โครงการบริการทำบัตรประจำตัวคนพิการที่บ้านและ ส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (At Home Service: ID Card Registration for Person with Disabilities)	50,000.00	-	-	1 ต.ค. 68	30 ก.ย. 69		กำหนดจัดฝึกอบรม หลักสูตร งานคหกรรมอาหาร และโภชนาการ วันที่ 21 ก.ค. 2569		33,000.00	17,000.00	
142	โครงการบริการรับยื่นสิทธิเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุในชุมชน (Senior Pension Service)	10,000.00	-	-	1 พ.ค. 69	31 ส.ค. 69		กำหนดลงพื้นที่รับ ยื่นสิทธิเบี้ยผู้สูงอายุ เดือน ก.ค. 2569		7,955.00	2,045.00	
143	โครงการเสริมสร้างและพิทักษ์สิทธิสวัสดิการผู้รับเบี้ยยังชีพ	30,000.00	-	2,800.00	1 ต.ค. 68	30 มี.ค. 69			✓	27,200.00	-	
144	โครงการช่วยเหลือประชาชนด้านสาธารณสุข	300,000.00	-	-	1 ต.ค. 68	30 ก.ย. 69		ดำเนินการ เมื่อมีเหตุสาธารณสุข		-	300,000.00	
145	โครงการฝึกอบรมซ่อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย <input type="checkbox"/>	100,000.00	-	-	1 พ.ย. 68	31 พ.ค. 69	✓			-	100,000.00	ล่วงเลยเวลาเริ่มดำเนินการ แต่ยังไม่เริ่มดำเนินการ

รายงานผลการดำเนินงานของโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

ณ ไตรมาสที่ 3/2569 (ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2569)

แบบรายงาน 2.1

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	แผนการดำเนินงานที่กำหนดไว้		สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หมายเหตุ (กรณีไม่เป็นไปตาม แผนการดำเนินงาน)
					วันที่เริ่มต้น	วันที่สิ้นสุด	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			
146	โครงการฝึกอบรมและฝึกทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ประจำปี (หลักสูตรจัดตั้งและหลักสูตรทบทวน)	230,000.00	-	230,000.00	1 พ.ย. 68	31 พ.ค. 69		ยกเลิกโครงการ การรับสมัครบุคคลทั่วไป และ สมาชิก อปพร. เข้าร่วมโครงการ ไม่เป็นไป ตามเป้าหมาย หากจัด โครงการอาจไม่คุ้มค่าใน การใช้จ่ายงบประมาณ		-	-	
147	โครงการอบรมและพัฒนาศักยภาพแกนนำสุขภาพชุมชน	1,374,300.00	-	-	1 พ.ย. 68	31 ม.ค. 69			✓	1,359,000.00	15,300.00	
148	โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมการดำเนินงานของแกนนำสุขภาพชุมชน	93,600.00	-	-	1 ต.ค. 68	30 ก.ย. 69		ดำเนินโครงการ ตลอดทั้งปี ประชุมแกนนำสุขภาพ ชุมชน เดือนละ 1 ครั้ง		62,400.00	31,200.00	
149	โครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยแม่และเด็กของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ เจ้าฟ้ามหาดจรัสสิรินธรา สยามบรมราชกุมารี	200,000.00	-	-	1 เม.ย. 69	31 ก.ค. 69			✓	199,175.00	825.00	
150	โครงการรณรงค์การควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ เจ้าฟ้ามหาดจรัสสิรินธรา สยามบรมราชกุมารี	200,000.00	-	-	1 ธ.ค. 68	30 เม.ย. 69			✓	178,175.00	21,825.00	
151	โครงการปรับปรุงภาวะโภชนาการและสุขภาพเด็กของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ เจ้าฟ้ามหาดจรัสสิรินธรา สยามบรมราชกุมารี	200,000.00	-	-	1 ต.ค. 68	31 ม.ค. 69			✓	198,425.00	1,575.00	

รายงานผลการดำเนินงานของโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

ณ ไตรมาสที่ 3/2569 (ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2569)

แบบรายงาน 2.1

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	แผนการดำเนินงานที่กำหนดไว้		สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หมายเหตุ (กรณีไม่เป็นไปตาม แผนการดำเนินงาน)
					วันที่เริ่มต้น	วันที่สิ้นสุด	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			
152	โครงการแม่ลูกพันดี	57,000.00	-	-	1 ต.ค. 68	30 ก.ย. 69		ดำเนินโครงการ ตลอดทั้งปี		45,500.00	11,500.00	
153	โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการและยกระดับ สถานประกอบการจำหน่ายอาหารในเขตเทศบาลนคร สุราษฎร์ธานี	800,000.00	-	-	1 ธ.ค. 68	31 มี.ค. 69			✓	745,495.00	54,505.00	
154	โครงการตลาดนัด ตลาดน้ำ บ้านดอน	150,000.00	-	-	1 ต.ค. 68	30 ก.ย. 69		ดำเนินโครงการ ตลอดทั้งปี และจำหน่ายสินค้า ทุกวันอาทิตย์		-	150,000.00	
155	โครงการพัฒนาระบบสุขภาพในโรงเรียนและชุมชนของ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระ เทพรัตนราชสุดาฯ เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรฯ สยามบรมราชกุมารี	400,000.00	-	-	1 ต.ค. 68	30 ก.ย. 69		กำหนดตรวจ สุขภาพอาหารใน โรงเรียน เดือนมิถุนายน 2569		87,260.00	312,740.00	
156	โครงการช่วยลดการติดเชื้อจากแม่สู่ลูกสภาชาติไทย พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ	200,000.00	-	-	1 ม.ค. 69	31 มี.ค. 69			✓	199,175.00	825.00	
157	โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหาเสพติด To Be Number One (ศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่นในชุมชน/หมู่บ้าน) ของ ทูลกระหม่อมหญิง อุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี	200,000.00	-	-	1 พ.ค. 69	31 ก.ค. 69		จัดโครงการ เมื่อวันที่ 22 มิ.ย. 2569 ณ โรงแรมโดมอนต์ พลาซ่า		7,500.00	192,500.00	
158	โครงการสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และชิ้นทะเบียนสัตว์ ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระ เจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารี	80,000.00	-	-	1 ต.ค. 68	30 ก.ย. 69		สำรวจจำนวนสุนัขและ แมวในเขตเทศบาล รอบที่ 1		37,200.00	42,800.00	

รายงานผลการดำเนินงานของโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

ณ ไตรมาสที่ 3/2569 (ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2569)

แบบรายงาน 2.1

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	แผนการดำเนินงานที่กำหนดไว้		สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หมายเหตุ (กรณีไม่เป็นไปตาม แผนการดำเนินงาน)
					วันที่เริ่มต้น	วันที่สิ้นสุด	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			
159	โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี	399,800.00	-	-	1 ต.ค. 68	30 ก.ย. 69		จัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ รอบที่ 3		276,500.00	123,300.00	
160	โครงการรณรงค์ ป้องกัน และควบคุมการเพิ่มจำนวนสัตว์จรจัด ในเขตเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี	300,000.00	-	-	1 ต.ค. 68	30 ก.ย. 69		จัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ รอบที่ 3		189,000.00	111,000.00	
161	โครงการก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสียโรงฆ่าสัตว์เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี	5,000,000.00	-	-	1 ต.ค. 68	30 ก.ย. 69		จัดทำรูปแบบรายการ งานก่อสร้างและ กำหนดราคากลาง		-	5,000,000.00	
162	โครงการจ้างออกแบบก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาและฟื้นฟูคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและคนพิการ	6,300,000.00	-	-	1 เม.ย. 69	31 ธ.ค. 69		รายงานผล การพิจารณาคัดเลือก		-	6,300,000.00	
163	โครงการพัฒนากระบวนการเรียนรู้เพื่อสร้างชุมชนเข้มแข็ง (โอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่)	-	130,000.00	8,200.00	1 มี.ค. 69	30 เม.ย. 69			✓	121,800.00	-	
164	โครงการขยายเขตระบบจำหน่ายเพื่อจ่ายกระแสไฟฟ้าพร้อมติดตั้งเครื่องวัดกระแสไฟฟ้า ศูนย์บริการสาธารณสุข ปทุมพร เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี (โอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่)	-	689,000.00	-	1 มิ.ย. 69	30 ก.ย. 69		จัดทำหนังสือ เพื่อขออนุมัติ ต่อผู้ว่าราชการจังหวัด		-	689,000.00	
รวม		24,532,800.00	819,000.00	723,675.00						10,244,351.30	14,383,773.70	
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา การกีฬา ศาสนา ประเพณีและวัฒนธรรม												
165	โครงการจัดงาน/กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ/เทิดพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีและพระบรมวงศานุวงศ์	330,000.00	65,000.00	-	1 ต.ค. 68	30 ก.ย. 69		ดำเนินการจัดกิจกรรม วันสำคัญต่าง ๆ ภายในปีงบประมาณ		273,450.00	121,550.00	
166	โครงการจัดกิจกรรมฉลองวันเด็กแห่งชาติ	380,000.00	-	-	1 ต.ค. 68	28 ก.พ. 69			✓	378,303.00	1,697.00	
167	โครงการจัดอบรมเด็กและเยาวชนภาคฤดูร้อน	550,000.00	30,000.00	101,044.00	1 ม.ค. 69	30 มิ.ย. 69			✓	478,956.00	-	

รายงานผลการดำเนินงานของโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

ณ ไตรมาสที่ 3/2569 (ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2569)

แบบรายงาน 2.1

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	แผนการดำเนินงานที่กำหนดไว้		สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หมายเหตุ (กรณีไม่เป็นไปตาม แผนการดำเนินงาน)
					วันที่เริ่มต้น	วันที่สิ้นสุด	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			
168	โครงการจัดนิทรรศการและเข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาการและวิชาชีพ ระดับเขตพื้นที่ ระดับภาคใต้ และระดับประเทศ	1,350,000.00	-	248,900.00	1 พ.ย. 68	30 ก.ย. 69		จ้างเหมาจัดทำ บูธนิทรรศการและ รถบัสปรับอากาศ		53,011.00	1,048,089.00	
169	โครงการประเมินคุณภาพการจัดการศึกษา	250,000.00	-	-	1 ก.พ. 69	31 ส.ค. 69		อยู่ระหว่างประสาน สถานศึกษา, วิทยากร เพื่อจัดโครงการ		-	250,000.00	
170	โครงการประเมินผลนักเรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน	900,000.00	-	-	1 ธ.ค. 68	30 ก.ย. 69		จัดซื้อวัสดุระหว่างภาค ภาคเรียนที่ 1/2569		459,417.00	440,583.00	
171	โครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพพนักงานครู พนักงานจ้าง และบุคลากรทางการศึกษา	1,000,000.00	-	156,100.00	1 พ.ย. 68	28 ก.พ. 69			✓	843,881.00	19.00	
172	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (งานระดับก่อนวัยเรียน-ประถม)	43,011,200.00	-	758,300.00	1 ต.ค. 68	30 ก.ย. 69		งานนิเทศก์ เบิกหักปลั๊กส่ง ให้สถานศึกษา ไตรมาส 4, งานโรงเรียน ขออนุมัติ เบิกจ่าย, งานนอกระบบฯ ขออนุมัติเบิกจ่าย		21,795,018.00	20,457,882.00	
173	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (งานระดับมัธยม)	52,535,100.00	-	2,128,000.00	1 ต.ค. 68	30 ก.ย. 69		งานนิเทศก์ เบิกหักปลั๊กส่ง ให้สถานศึกษา ไตรมาส 4, งานโรงเรียน ขออนุมัติ เบิกจ่าย, งานกิจการ นักเรียน เบิกจ่ายของ ร.ร. กีฬาเทศบาลฯ		33,765,615.88	16,641,484.12	
174	โครงการอุดหนุนค่าอาหารกลางวันสำหรับโรงเรียนบ้านบางใหญ่	1,333,200.00	4,400.00	-	1 ต.ค. 68	30 ก.ย. 69		ขออนุมัติเบิกจ่าย		1,337,600.00	-	
175	โครงการอุดหนุนค่าอาหารกลางวันสำหรับโรงเรียนบ้านโพหวาย	1,843,600.00	13,200.00	-	1 ต.ค. 68	30 ก.ย. 69		ขออนุมัติเบิกจ่าย		1,777,600.00	79,200.00	
176	โครงการอุดหนุนค่าอาหารกลางวันสำหรับโรงเรียนบ้านสันติสุข	576,000.00	-	-	1 ต.ค. 68	30 ก.ย. 69		ขออนุมัติเบิกจ่าย		537,600.00	38,400.00	

รายงานผลการดำเนินงานของโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

ณ ไตรมาสที่ 3/2569 (ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2569)

แบบรายงาน 2.1

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	แผนการดำเนินงานที่กำหนดไว้		สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หมายเหตุ (กรณีไม่เป็นไปตาม แผนการดำเนินงาน)
					วันที่เริ่มต้น	วันที่สิ้นสุด	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			
177	โครงการอุดหนุนค่าอาหารกลางวันสำหรับโรงเรียนบ้านสุขชน	523,800.00	-	-	1 ต.ค. 68	30 ก.ย. 69		ขออนุมัติเบิกจ่าย		523,800.00	-	
178	โครงการอุดหนุนค่าอาหารกลางวันสำหรับโรงเรียนวัดกลางใหม่	1,117,600.00	8,800.00	-	1 ต.ค. 68	30 ก.ย. 69		ขออนุมัติเบิกจ่าย		1,126,400.00	-	
179	โครงการอุดหนุนค่าอาหารกลางวันสำหรับโรงเรียนวัดท่าทอง	1,364,000.00	-	-	1 ต.ค. 68	30 ก.ย. 69		ขออนุมัติเบิกจ่าย		1,364,000.00	-	
180	โครงการอุดหนุนค่าอาหารกลางวันสำหรับโรงเรียนวัดโพธิ์นimit	1,518,000.00	125,400.00	-	1 ต.ค. 68	30 ก.ย. 69		ขออนุมัติเบิกจ่าย		1,643,400.00	-	
181	โครงการอุดหนุนค่าอาหารกลางวันสำหรับโรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี	8,140,000.00	-	-	1 ต.ค. 68	30 ก.ย. 69		ขออนุมัติเบิกจ่าย		8,140,000.00	-	
182	โครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน	13,737,600.00	-	-	1 ต.ค. 68	30 ก.ย. 69		งานนอกระบบฯ ขออนุมัติเบิกจ่าย, งานโรงเรียน บริหารสัญญา		7,137,624.00	6,599,976.00	
183	โครงการประกวดสื่อนวัตกรรมของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี	150,000.00	-	150,000.00	1 ก.พ. 69	30 เม.ย. 69		ยกเลิกโครงการ จัดทำโครงการอบรมการจัดทำสื่อนวัตกรรมของสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี แทน เพื่อให้การดำเนินโครงการมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพิ่มมากขึ้น		-	-	
184	โครงการอบรมการผลิตและใช้สื่อการเรียนการสอน	110,000.00	-	15,000.00	1 พ.ย. 68	28 ก.พ. 69			✓	89,050.00	5,950.00	
185	โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชน	100,000.00	-	-	1 พ.ค. 69	31 ก.ค. 69			✓	99,685	315.00	
186	โครงการอบรมผู้นำนักเรียน	60,000.00	-	-	1 พ.ย. 68	31 ม.ค. 69			✓	57,310.00	2,690.00	
187	โครงการเข้าร่วมงานชุมนุมของลูกเสือท้องถิ่นไทย	80,000.00	-	-	1 ต.ค. 68	30 ก.ย. 69	✓			-	80,000.00	ล่วงเลยเวลาเริ่มดำเนินการแต่ยังไม่เริ่มดำเนินการ

รายงานผลการดำเนินงานของโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

ณ ไตรมาสที่ 3/2569 (ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2569)

แบบรายงาน 2.1

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	แผนการดำเนินงานที่กำหนดไว้		สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หมายเหตุ (กรณีไม่เป็นไปตาม แผนการดำเนินงาน)
					วันที่เริ่มต้น	วันที่สิ้นสุด	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			
188	โครงการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา	50,000.00	-	-	1 พ.ค. 69	31 ก.ค. 69		จัดโครงการ เมื่อวันที่ 8-10 มิ.ย. 2569 ณ โรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด อยู่ระหว่างจัดทำเอกสารรายงานผลประกันคุณภาพฯ		-	50,000.00	
189	โครงการประชุมคณะกรรมการประสานงานวิชาการ การจัดการศึกษาท้องถิ่นระดับเทศบาล	90,000.00	-	-	1 ม.ค. 69	31 มี.ค. 69			✓	68,230.00	21,770.00	
190	โครงการส่งเสริมและพัฒนาหอสมุดเฉลิมพระเกียรติฯ	200,000.00	-	-	1 ต.ค. 68	28 ก.พ. 69			✓	199,636.00	364.00	
191	โครงการห้องสมุดเคลื่อนที่	80,000.00	-	-	1 ต.ค. 68	30 ก.ย. 69		ออกหน่วยห้องสมุดเคลื่อนที่		79,634.00	366.00	
192	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษา และการให้ความช่วยเหลือนักเรียน	700,000.00	-	-	1 มี.ค. 69	31 ส.ค. 69		อยู่ระหว่าง การประกาศผล		-	700,000.00	
193	โครงการส่งเสริมเข้าร่วมแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย ระดับภาค และระดับประเทศ	5,000,000.00	2,892,279.00	-	1 ต.ค. 68	30 ก.ย. 69		ส่งทีมเข้าร่วมแข่งขัน รอบชิงชนะเลิศ ระดับประเทศ ระหว่างวันที่ 17-31 ม.ค. 2569 ณ จังหวัดศรีสะเกษ		5,912,132.40	1,980,146.60	

รายงานผลการดำเนินงานของโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

ณ ไตรมาสที่ 3/2569 (ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2569)

แบบรายงาน 2.1

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	แผนการดำเนินงานที่กำหนดไว้		สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หมายเหตุ (กรณีไม่เป็นไปตาม แผนการดำเนินงาน)
					วันที่เริ่มต้น	วันที่สิ้นสุด	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			
194	โครงการจัดแข่งขันกีฬานักเรียนอนุบาล	200,000.00	-	200,000.00	1 เม.ย. 69	31 ส.ค. 69		ยกเลิกโครงการ เพื่อนำงบประมาณสำหรับ เป็นค่าใช้จ่ายในการ เตรียมการส่งทีมกีฬา นักเรียนองค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น ระดับภาคใต้		-	-	
195	โครงการจัดการแข่งขันกีฬาเด็ก เยาวชนและประชาชน	800,000.00	-	800,000.00	1 พ.ค. 69	31 ส.ค. 69		ยกเลิกโครงการ เพื่อนำงบประมาณสำหรับ เป็นค่าใช้จ่ายในการ เตรียมการส่งทีมกีฬา นักเรียนองค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น ระดับภาคใต้		-	-	
196	โครงการส่งทีมกีฬา และกิจกรรมนันทนาการ ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีเข้าร่วมแข่งขันกับหน่วยงานอื่นๆ	200,000.00	-	-	1 ต.ค. 68	30 ก.ย. 69		ส่งทีมเข้าร่วมตาม หนังสือเชิญ		25,000.00	175,000.00	
197	โครงการส่งทีมโรงเรียนกีฬาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี เข้าร่วมแข่งขันรายการต่าง ๆ	300,000.00	533,000.00	-	1 ต.ค. 68	30 ก.ย. 69		ส่งทีมเข้าร่วมตาม หนังสือเชิญ		-	833,000.00	
198	โครงการส่งเสริมและส่งเสริมเข้าร่วมการแข่งขันเรือพาย	200,000.00	-	-	1 ต.ค. 68	30 ก.ย. 69	✓			-	200,000.00	ล่วงเลยเวลาเริ่มดำเนินการ แต่ยังไม่เริ่มดำเนินการ
199	โครงการจัดการแข่งขันกรีฑาโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี	300,000.00	-	300,000.00	1 มิ.ย. 69	31 ส.ค. 69		ยกเลิกโครงการ กกท.จังหวัด ใช้สนามกีฬา กลางจังหวัดซึ่งเป็นสนาม ที่จัดโครงการ เป็นสนาม แข่งขันกีฬายาวชน แห่งชาติ ครั้งที่ 41 และ กีฬาอาวุโสแห่งชาติ ครั้งที่ 8		-	-	

รายงานผลการดำเนินงานของโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

ณ ไตรมาสที่ 3/2569 (ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2569)

แบบรายงาน 2.1

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	แผนการดำเนินงานที่กำหนดไว้		สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หมายเหตุ (กรณีไม่เป็นไปตาม แผนการดำเนินงาน)
					วันที่เริ่มต้น	วันที่สิ้นสุด	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			
200	โครงการจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 41 ระดับชาติ พ.ศ. 2569	3,000,000.00	-	1,224,235.00	1 พ.ย. 68	31 ก.ค. 69		จัดการแข่งขัน ระหว่างวันที่ 2-17 พ.ค. 2569 อยู่ระหว่างส่งใช้เงินยืม		1,760,140.00	15,625.00	
201	โครงการจัดการแข่งขันกีฬาอาวุโสแห่งชาติ ครั้งที่ 8 ระดับชาติ พ.ศ. 2569	700,000.00	-	-	1 พ.ย. 68	31 ก.ค. 69		จัดการแข่งขัน ระหว่างวันที่ 5-14 มิ.ย. 2569 อยู่ระหว่างส่งใช้เงินยืม		687,100.00	12,900.00	
202	โครงการจัดงานประเพณีวันขึ้นปีใหม่	250,000.00	-	-	1 พ.ย. 69	31 ม.ค. 69			✓	249,855.00	145.00	
203	โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์	650,000.00	-	-	1 ก.พ. 69	30 เม.ย. 69			✓	649,848.00	152.00	
204	โครงการจัดงานประเพณีชักพระ-ทอดผ้าป่าและแข่งเรือยาว	7,000,000.00	600,000.00	-	1 ต.ค. 68	30 ก.ย. 69		- จัดงานประเพณีชัก พระฯ ประจำปี 2568 ระหว่างวันที่ 4-12 ต.ค. 2568 - เตรียมการจัดงาน ประเพณีชักพระฯ ประจำปี 2569 ระหว่างวันที่ 23-31 ต.ค. 2569		1,209,400.00	6,390,600.00	
205	โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง	1,800,000.00	-	324,400.00	1 ต.ค. 68	30 พ.ย. 68			✓	1,469,501.75	6,098.25	
206	โครงการส่งเสริมกิจกรรมทางศาสนาและภูมิปัญญาท้องถิ่น	5,000.00	-	-	1 ต.ค. 68	30 ก.ย. 69	✓			-	5,000.00	ล่วงเลยเวลาเริ่มดำเนินการ แต่ยังไม่เริ่มดำเนินการ
207	อุดหนุนมีสียืดอีกอมะตูลอิสลาม (บ้านปากน้ำ)	400,000.00	-	-	1 มี.ค. 69	31 พ.ค. 69			✓	400,000.00	-	

รายงานผลการดำเนินงานของโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

ณ ไตรมาสที่ 3/2569 (ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2569)

แบบรายงาน 2.1

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	แผนการดำเนินงานที่กำหนดไว้		สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หมายเหตุ (กรณีไม่เป็นไปตาม แผนการดำเนินงาน)
					วันที่เริ่มต้น	วันที่สิ้นสุด	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			
208	อุดหนุนมูลนิธิกุศลศรัทธา	100,000.00	-	100,000.00	1 ต.ค. 68	31 ต.ค. 68		ยกเลิกโครงการ มูลนิธิกุศลศรัทธา แจ้งยกเลิกเนื่องจาก อยู่ในช่วงการก่อสร้าง อาคารอนุสรณ์สงฆ์ หลังใหม่ ทำให้ไม่สะดวก ในการใช้สถานที่จัดงาน เทศกาลถือศีลกินเจ		-	-	
209	อุดหนุนมูลนิธิมิทิตาจิตรธรรมสถาน	100,000.00	-	-	1 ต.ค. 68	31 ต.ค. 68			✓	100,000.00	-	
210	โครงการก่อสร้างรั้วอิฐบล็อกพร้อมกำแพงกันดิน	3,350,000.00	-	-	1 ม.ค. 69	30 ก.ย. 69		จัดทำแบบรูปรายการ		-	3,350,000.00	
211	โครงการปรับปรุงอาคารศูนย์เยาวชนเทศบาลนคร สุราษฎร์ธานี	4,500,000.00	-	-	1 ม.ค. 69	30 ก.ย. 69	✓			-	4,500,000.00	ล่วงเลยเวลาเริ่มดำเนินการ แต่ยังไม่เริ่มดำเนินการ
212	โครงการศึกษาดูงาน "รวมพลัง แห่งความภักดี" เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง	731,000.00	-	60,000.00	1 พ.ย. 68	31 ธ.ค. 68			✓	667,025.00	3,975.00	
213	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดทำ แผนพัฒนาการศึกษาและงบประมาณทางการศึกษา (โอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่)	-	200,000.00	-	1 พ.ค. 69	31 พ.ค. 69			✓	185,260.00	14,740.00	
214	โครงการอบรมการจัดทำสื่อวัฒนธรรมของสถานศึกษาใน สังกัดเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี (โอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่)	-	150,000.00	-	1 พ.ค. 69	31 ก.ค. 69			✓	134,950.00	15,050.00	
215	โครงการส่งเสริมสิทธิเด็กและเยาวชน (โอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่)	-	100,000.00	-	1 พ.ค. 69	31 ก.ค. 69	✓			-	100,000.00	ล่วงเลยเวลาเริ่มดำเนินการ แต่ยังไม่เริ่มดำเนินการ
216	โครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข (โอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่)	-	48,000.00	-	1 พ.ค. 69	30 ก.ย. 69	✓			-	48,000.00	ล่วงเลยเวลาเริ่มดำเนินการ แต่ยังไม่เริ่มดำเนินการ
รวม		161,666,100.00	4,770,079.00	6,565,979.00						95,679,433.03	64,190,766.97	

รายงานผลการดำเนินงานของโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

ณ ไตรมาสที่ 3/2569 (ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2569)

แบบรายงาน 2.1

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	แผนการดำเนินงานที่กำหนดไว้		สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หมายเหตุ (กรณีไม่เป็นไปตาม แผนการดำเนินงาน)
					วันที่เริ่มต้น	วันที่สิ้นสุด	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี												
217	โครงการจัดกิจกรรมการให้บริการสาธารณะเชิงบูรณาการ เนื่องในวันท้องถิ่นไทย "18 มีนา วันท้องถิ่นไทย	10,000.00	-	-	1 ก.พ. 69	30 เม.ย. 69			✓	10,000.00	-	
218	โครงการจัดกิจกรรมการให้บริการสาธารณะเชิงบูรณาการ เนื่องในวันเทศบาล	50,000.00	-	-	1 มี.ค. 69	31 พ.ค. 69			✓	27,750.00	22,250.00	
219	โครงการจัดทำแผนการดำเนินงานประจำปีและเพิ่มเติม/ เปลี่ยนแปลง/แก้ไข	50,000.00	-	-	1 ต.ค. 68	30 ก.ย. 69		- จัดทำแผนการ ดำเนินงาน ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2569 ประกาศใช้เมื่อวันที่ 21 ต.ค. 2568 - เพิ่มเติม ครั้งที่ 7/2569 ประกาศใช้ เมื่อวันที่ 26 มิ.ย. 2569 - แก้ไข ครั้งที่ 6/2569 ประกาศใช้เมื่อวันที่ 18 มิ.ย. 2569		2,660.00	47,340.00	

รายงานผลการดำเนินงานของโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

ณ ไตรมาสที่ 3/2569 (ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2569)

แบบรายงาน 2.1

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	แผนการดำเนินงานที่กำหนดไว้		สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หมายเหตุ (กรณีไม่เป็นไปตาม แผนการดำเนินงาน)
					วันที่เริ่มต้น	วันที่สิ้นสุด	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			
220	โครงการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น และเพิ่มเติม/ เปลี่ยนแปลง	250,000.00	-	40,000.00	1 ต.ค. 68	30 ก.ย. 69		- จัดทำแผนพัฒนา ท้องถิ่น (พ.ศ.2566- 2570) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2569 ประกาศใช้เมื่อวันที่ 20 มี.ค. 2569 - แก้ไขครั้งที่ 3/2569 ประกาศใช้เมื่อวันที่ 22 พ.ค. 2569 - เพิ่มเติมครั้งที่ 1/2569 ประกาศใช้ เมื่อวันที่ 26 มี.ค. 2569		61,415.00	148,585.00	
221	โครงการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนคร สุราษฎร์ธานี	30,000.00	-	-	1 ต.ค. 68	30 ก.ย. 69		- ติดตามผลการเบิกจ่าย และผลการดำเนิน โครงการ ณ ไตรมาสที่ 3/2569 - จัดประชุม คณะกรรมการติดตาม และประเมินผล แผนพัฒนาเทศบาล ครั้งที่ 1/2569 เมื่อ วันที่ 30 มิ.ย. 2569		1,225.00	28,775.00	

รายงานผลการดำเนินงานของโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

ณ ไตรมาสที่ 3/2569 (ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2569)

แบบรายงาน 2.1

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	แผนการดำเนินงานที่กำหนดไว้		สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หมายเหตุ (กรณีไม่เป็นไปตาม แผนการดำเนินงาน)
					วันที่เริ่มต้น	วันที่สิ้นสุด	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			
222	โครงการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนคร สุราษฎร์ธานี (จ้างที่ปรึกษา)	250,000.00	-	-	1 ต.ค. 68	30 ก.ย. 69		- ผู้รับจ้างส่งมอบงาน งวดที่ 1 เมื่อวันที่ 9 มิ.ย. 2569 - คณะกรรมการตรวจ รับพัสดุฯ มีมติให้แก้ไข ปรับปรุง ทบทวนงาน ที่ส่งมอบ และส่งมอบ งานใหม่อีกครั้ง		-	250,000.00	
223	โครงการประชาสัมพันธ์การชำระภาษีท้องถิ่น	100,000.00	-	-	1 ต.ค. 68	30 ก.ย. 69		จัดทำ ป้ายประชาสัมพันธ์ และสื่อประชาสัมพันธ์ ทุกช่องทาง		13,500.00	86,500.00	
224	โครงการให้ความรู้ด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องในชีวิตประจำวัน	80,000.00	-	-	1 ม.ค. 69	31 มี.ค. 69			✓	63,010.00	16,990.00	
225	โครงการก่อสร้างเสาชิงเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี	490,000.00	-	-	1 มิ.ย. 69	30 ก.ย. 69		คณะกรรมการ พิจารณาผล		-	490,000.00	
226	โครงการสัมมนาให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีที่ดิน และสิ่งปลูกสร้างและภาษีป้ายให้กับผู้มีหน้าที่เสียภาษี ในเขตพื้นที่เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี (โอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่)	-	200,000.00	-	1 พ.ค. 69	30 มิ.ย. 69			✓	149,130.00	50,870.00	
รวม		1,310,000.00	200,000.00	40,000.00						328,690.00	1,141,310.00	
รวมทุกยุทธศาสตร์		292,890,900.00	31,789,079.00	8,579,854.00						123,877,089.83	192,223,035.17	

รายงานผลการดำเนินงานของโครงการที่จ่ายจากเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

ณ ไตรมาสที่ 3/2569 (ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2569)

แบบรายงาน 2.2

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณ (บาท)	แผนการดำเนินงานที่กำหนดไว้		สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หมายเหตุ
			วันที่เริ่มต้น	วันที่สิ้นสุด	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน										
1	โครงการขยายเขตประปา ถนนเลียเมือง ซอยเข้าวัดท่าเพชร	70,000.00	1 มิ.ย. 69	30 ก.ย. 69		การประปาออกแบบ และประมาณราคา		-	70,000.00	
2	โครงการขยายเขตประปา ถนนชนเกษม 39	470,000.00	1 มิ.ย. 69	30 ก.ย. 69		การประปาออกแบบ และประมาณราคา		-	470,000.00	
3	โครงการขยายเขตประปา ถนนดอนนก 21	210,000.00	1 มิ.ย. 69	30 ก.ย. 69		การประปาออกแบบ และประมาณราคา		-	210,000.00	
4	โครงการขยายเขตประปา ซอยสันติสุข 2 (แยกซ้าย 1)	82,000.00	1 มิ.ย. 69	30 ก.ย. 69		การประปาออกแบบ และประมาณราคา		-	82,000.00	
5	โครงการขยายเขตประปา ถนนพ้อขุนทะเล ซอย 10	420,000.00	1 มิ.ย. 69	30 ก.ย. 69		การประปาออกแบบ และประมาณราคา		-	420,000.00	
6	โครงการขยายเขตประปา ถนนกาญจนาวิถี 30	210,000.00	1 มิ.ย. 69	30 ก.ย. 69		การประปาออกแบบ และประมาณราคา		-	210,000.00	

รายงานผลการดำเนินงานของโครงการที่จ่ายจากเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

ณ ไตรมาสที่ 3/2569 (ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2569)

แบบรายงาน 2.2

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณ (บาท)	แผนการดำเนินงานที่กำหนดไว้		สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หมายเหตุ
			วันที่เริ่มต้น	วันที่สิ้นสุด	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			
7	โครงการขยายเขตประปา ถนนซอยบางใหญ่ 3	370,000.00	1 มิ.ย. 69	30 ก.ย. 69		การประปาออกแบบ และประมาณราคา		-	370,000.00	
8	โครงการขยายเขตประปา ถนนบางใหญ่ 13 ตำบลมะขามเตี้ย	180,000.00	1 มิ.ย. 69	30 ก.ย. 69		การประปาออกแบบ และประมาณราคา		-	180,000.00	
9	โครงการขยายเขตประปา ซอยเทคโนโลยีใหม่ ตำบลบางกุ้ง	430,000.00	1 ก.ค. 69	31 ต.ค. 69		การประปาออกแบบ และประมาณราคา		-	430,000.00	
10	โครงการขยายเขตประปา ซอยข้างหมู่บ้านเอกโพธิ์ ตำบล มะขามเตี้ย	160,000.00	1 ก.ค. 69	31 ต.ค. 69		การประปาออกแบบ และประมาณราคา		-	160,000.00	
11	โครงการขยายเขตประปา ถนนชนเกษม 46 แยก ซ้าย 1 ตำบลมะขามเตี้ย	200,000.00	1 ก.ค. 69	31 ต.ค. 69		การประปาออกแบบ และประมาณราคา		-	200,000.00	
12	โครงการขยายเขตประปา ซอยข้างก้วยเดี่ยวเรือ บางใหญ่ ถนนเลี้ยวเมือง ตำบลมะขามเตี้ย	230,000.00	1 ก.ค. 69	31 ต.ค. 69		การประปาออกแบบ และประมาณราคา		-	230,000.00	
13	โครงการขยายเขตประปา ถนนทางหลวงชนบท ซ่างบ้าน ดอนปิยะถึง หัวสะพานเสม็ดเรียง	410,000.00	1 ก.ค. 69	31 ต.ค. 69		การประปาออกแบบ และประมาณราคา		-	410,000.00	

รายงานผลการดำเนินงานของโครงการที่จ่ายจากเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

ณ ไตรมาสที่ 3/2569 (ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2569)

แบบรายงาน 2.2

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณ (บาท)	แผนการดำเนินงานที่กำหนดไว้		สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หมายเหตุ
			วันที่เริ่มต้น	วันที่สิ้นสุด	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			
14	โครงการขยายเขตประปา ถนนพระราชรัฐ 3	130,000.00	1 ก.ค. 69	31 ต.ค. 69		การประปาออกแบบ และประมาณราคา		-	130,000.00	
15	โครงการขยายเขตประปา ถนนพระราชรัฐ 7	220,000.00	1 ก.ค. 69	31 ต.ค. 69		การประปาออกแบบ และประมาณราคา		-	220,000.00	
16	โครงการขยายเขตประปา ถนนพระราชรัฐ 8	140,000.00	1 ก.ค. 69	31 ต.ค. 69		การประปาออกแบบ และประมาณราคา		-	140,000.00	
17	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจร ถนนศรีวิชัย 21/17	1,384,000.00	1 ก.ค. 69	31 ธ.ค. 69	✓			-	1,384,000.00	
18	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจร ถนนศรีวิชัย 21 ซอย 19/1	1,820,000.00	1 ก.ค. 69	31 ธ.ค. 69	✓			-	1,820,000.00	
19	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจร ถนนศรีวิชัย 21 ซอย 19	1,633,000.00	1 ก.ค. 69	31 ธ.ค. 69	✓			-	1,633,000.00	
20	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจร ถนนวิภาวดี 6	2,810,000.00	1 ส.ค. 69	31 ม.ค. 70	✓			-	2,810,000.00	
21	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจร ถนนเลียงเมือง 1 แยก ขวา 1	2,537,000.00	1 ส.ค. 69	31 ม.ค. 70	✓			-	2,537,000.00	
22	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจร ถนนหมู่บ้านสุข สมบูรณ์ ท่ากูบ	1,154,000.00	1 ส.ค. 69	31 ม.ค. 70	✓			-	1,154,000.00	

รายงานผลการดำเนินงานของโครงการที่จ่ายจากเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

ณ ไตรมาสที่ 3/2569 (ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2569)

แบบรายงาน 2.2

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณ (บาท)	แผนการดำเนินงานที่กำหนดไว้		สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมา ดคงเหลือ (บาท)	หมายเหตุ
			วันที่เริ่มต้น	วันที่สิ้นสุด	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			
23	โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนพ้อขุนทะเล ซอย 20/1	1,061,000.00	1 มิ.ย. 69	30 ก.ย. 69		พิจารณาร่าง TOR		-	1,061,000.00	
24	โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนพ้อขุนทะเล ซอย 22	1,331,000.00	1 มิ.ย. 69	30 ก.ย. 69		พิจารณาร่าง TOR		-	1,331,000.00	
25	โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนท่าโรงช้าง STA 1+425 - 2+215	2,565,000.00	1 มิ.ย. 69	30 ก.ย. 69		พิจารณาร่าง TOR		-	2,565,000.00	
26	โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนท่าโรงช้าง ซอย 9	702,000.00	1 มิ.ย. 69	30 ก.ย. 69		พิจารณาร่าง TOR		-	702,000.00	
27	โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนชนเกษม ซอย 43	730,000.00	1 มิ.ย. 69	30 ก.ย. 69		พิจารณาร่าง TOR		-	730,000.00	
28	โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนชนเกษม ซอย 43 แยกซ้าย 1	178,000.00	1 มิ.ย. 69	30 ก.ย. 69		พิจารณาร่าง TOR		-	178,000.00	
29	โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนชนเกษม ซอย 45	966,000.00	1 มิ.ย. 69	30 ก.ย. 69		พิจารณาร่าง TOR		-	966,000.00	
30	โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนชนเกษม ซอย 45 แยกขวา 1	454,000.00	1 มิ.ย. 69	30 ก.ย. 69		พิจารณาร่าง TOR		-	454,000.00	
31	โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนชนเกษม ซอย 45 แยกซ้าย 1,2	245,000.00	1 มิ.ย. 69	30 ก.ย. 69		พิจารณาร่าง TOR		-	245,000.00	
32	โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนชนเกษม ซอย 47	1,961,000.00	1 มิ.ย. 69	30 ก.ย. 69		พิจารณาร่าง TOR		-	1,961,000.00	

รายงานผลการดำเนินงานของโครงการที่จ่ายจากเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

ณ ไตรมาสที่ 3/2569 (ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2569)

แบบรายงาน 2.2

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณ (บาท)	แผนการดำเนินงานที่กำหนดไว้		สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หมายเหตุ
			วันที่เริ่มต้น	วันที่สิ้นสุด	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			
33	โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนชนเกษม ซอย 50/2	773,000.00	1 มิ.ย. 69	30 ก.ย. 69		พิจารณาร่าง TOR		-	773,000.00	
34	โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนวัดโพธิ์ 31 ซอย 6	1,431,000.00	1 ก.ค. 69	30 ก.ย. 69	✓			-	1,431,000.00	
35	โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนวัดโพธิ์ 31 ซอย 6 แยกซ้าย 2	336,000.00	1 ก.ค. 69	30 ก.ย. 69	✓			-	336,000.00	
36	โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนวัดโพธิ์ 31 ซอย 6 แยกซ้าย 3	1,474,000.00	1 ก.ค. 69	30 ก.ย. 69	✓			-	1,474,000.00	
37	โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนวัดโพธิ์ 31 ซอย 6/1	292,000.00	1 ก.ค. 69	30 ก.ย. 69	✓			-	292,000.00	
38	โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนวัดโพธิ์ 31 ซอย 7	890,000.00	1 ก.ค. 69	30 ก.ย. 69	✓			-	890,000.00	
39	โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนวัดโพธิ์ 31 ซอย 9	696,000.00	1 ก.ค. 69	30 ก.ย. 69	✓			-	696,000.00	
40	โครงการปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้าเป็นเคเบิลใต้ดิน บริเวณถนนบ้านดอน	19,800,778.00	1 มิ.ย. 69	30 ก.ย. 70		ระหว่างอนุมัติแบบก่อสร้างและประมาณการค่าใช้จ่าย พร้อมประกวดราคา ทาผู้รับจ้าง ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค		-	19,800,778.00	

รายงานผลการดำเนินงานของโครงการที่จ่ายจากเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

ณ ไตรมาสที่ 3/2569 (ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2569)

แบบรายงาน 2.2

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณ (บาท)	แผนการดำเนินงานที่กำหนดไว้		สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หมายเหตุ
			วันที่เริ่มต้น	วันที่สิ้นสุด	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			
41	โครงการปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้าเป็นเคเบิลใต้ดิน บริเวณถนนการุณราษฎร์	70,998,138.00	1 มิ.ย. 69	30 ก.ย. 70		ระหว่างอนุมัติแบบ ก่อสร้างและ ประมาณการ ค่าใช้จ่าย พร้อม ประกวดราคา หา ผู้รับจ้าง ของการ ไฟฟ้าส่วนภูมิภาค		-	70,998,138.00	
42	โครงการปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้าเป็นเคเบิลใต้ดิน บริเวณถนนศรีวิชัย	184,347,732.00	1 มิ.ย. 69	30 ก.ย. 70		ระหว่างอนุมัติแบบ ก่อสร้างและ ประมาณการ ค่าใช้จ่าย พร้อม ประกวดราคา หา ผู้รับจ้าง ของการ ไฟฟ้าส่วนภูมิภาค		-	184,347,732.00	
รวม		306,501,648.00						-	306,501,648.00	

รายงานผลการดำเนินงานของโครงการที่จ่ายจากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

ณ ไตรมาสที่ 3/2569 (ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2569)

แบบรายงาน 2.3

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	แผนการดำเนินงานที่กำหนด		สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หมายเหตุ (กรณีไม่เป็นไปตาม แผนการดำเนินงาน)
			วันที่เริ่มต้น	วันที่สิ้นสุด	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน										
1	โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลท์คอนกรีต (Over-lay) ถนนชนเกษม ช่วงที่ 1	19,800,000.00	1 ต.ค. 68	31 พ.ค. 69		อยู่ระหว่างก่อสร้าง ผลงาน 0.05%		-	19,800,000.00	ล่วงเลยระยะเวลาสิ้นสุด แต่ยังดำเนินการไม่แล้ว เสร็จ
รวม		19,800,000.00						-	19,800,000.00	
รวมทุกยุทธศาสตร์		19,800,000.00						-	19,800,000.00	



บัญชีรายละเอียด
ผลการดำเนินโครงการที่จ่ายจากเงินสะสม
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567-2568

สรุปผลการดำเนินโครงการที่จ่ายจากเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2568

เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

ณ ไตรมาสที่ 3/2569 (ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2569)

จำนวนโครงการที่จ่ายจากเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567-2568 ที่ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จในปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 มีทั้งหมด 25 โครงการ งบประมาณรวมทั้งสิ้น 205,790,000 บาท (สองร้อยห้าล้านเจ็ดแสนเก้าหมื่นบาทถ้วน) มีรายละเอียดผลการดำเนินงาน ดังนี้

1. โครงการที่จ่ายจากเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 จำนวน 9 โครงการ งบประมาณ 34,768,000 บาท

ยุทธศาสตร์	รวมทั้งสิ้น			ดำเนินการเสร็จสิ้น			ระหว่างดำเนินการ			ยังไม่ดำเนินการ		โครงการที่ยกเลิก	
	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบประมาณที่เบิกจ่าย	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบประมาณที่เบิกจ่าย	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบประมาณที่เบิกจ่าย	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้
1.ด้านโครงสร้างพื้นฐาน	9	34,768,000.00	32,544,589.00	9	34,768,000.00	32,544,589.00	-	-	-	-	-	-	-
รวม	9	34,768,000.00	32,544,589.00	9	34,768,000.00	32,544,589.00	-	-	-	-	-	-	-
คิดเป็นร้อยละ		100.00			100.00			0.00			0.00		0.00

2. โครงการที่จ่ายจากเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 จำนวน 16 โครงการ งบประมาณ 171,022,000 บาท

ยุทธศาสตร์	รวมทั้งสิ้น			ดำเนินการเสร็จสิ้น			ระหว่างดำเนินการ			ยังไม่ดำเนินการ		โครงการที่ยกเลิก	
	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบประมาณที่เบิกจ่าย	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบประมาณที่เบิกจ่าย	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบประมาณที่เบิกจ่าย	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้
1.ด้านโครงสร้างพื้นฐาน	16	171,022,000.00	4,739,005.54	9	5,606,000.00	4,739,004.54	6	100,416,000.00	-	-	-	1	65,000,000.00
รวม	16	171,022,000.00	4,739,005.54	9	5,606,000.00	4,739,004.54	6	100,416,000.00	-	-	-	1	65,000,000.00
คิดเป็นร้อยละ		100.00			56.25			37.50			0.00		6.25

รวม	25	205,790,000.00	37,283,594.54	18	40,374,000.00	37,283,593.54	6	100,416,000.00	-	-	-	1	65,000,000.00
คิดเป็นร้อยละ		100.00			72.00			24.00			0.00		4.00

รายงานผลการดำเนินงานของโครงการที่จ่ายจากเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

ณ ไตรมาสที่ 3/2569 (ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2569)

แบบรายงาน 2.2 สะสม 2567

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณ (บาท)	แผนการดำเนินงานที่กำหนดไว้		สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หมายเหตุ (กรณีไม่เป็นไปตาม แผนการดำเนินงาน)
			วันที่เริ่มต้น	วันที่สิ้นสุด	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน										
1	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจร ถนนสันติสุข	8,905,000.00	1 ก.พ. 67	31 มี.ค. 67			✓	8,885,000	20,000.00	
2	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจร ซอยข้าง หจก. ดีเอิร์ธทรานสปอร์ต	2,000,000.00	1 ก.พ. 67	31 มี.ค. 67			✓	2,000,000.00	-	
3	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจร ถนนเสม็ดเรียง 22	2,328,000.00	1 ก.พ. 67	31 มี.ค. 67			✓	2,023,589.00	304,411.00	
4	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจร ถนนสุขน 1 ซอยสุทธิรักษ์	8,070,000.00	1 ก.พ. 67	31 มี.ค. 67			✓	7,250,000.00	820,000.00	
5	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจร ถนนเสม็ดเรียง 4	3,490,000.00	1 ก.พ. 67	31 มี.ค. 67			✓	3,450,000.00	40,000.00	
6	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจร ถนนลูกเสือ 3	749,000.00	1 ส.ค. 67	31 ธ.ค. 67			✓	602,000.00	147,000.00	
7	โครงการปรับปรุงระบบระบายน้ำและทางเท้า ถนนตลาดล่าง 1,3,5,5/1,7	2,896,000.00	1 มิ.ย. 67	31 ต.ค. 67			✓	2,330,000.00	566,000.00	
8	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจร ถนนศรีสวัสดิ์ 2/1	2,820,000.00	1 มิ.ย. 67	30 พ.ย. 67			✓	2,804,000.00	16,000.00	
9	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจร ถนนพ้อขุนทะเล 13 แยกขวา 1,2,3,4	3,510,000.00	1 ก.ค. 67	30 พ.ย. 67			✓	3,200,000.00	310,000.00	
รวม		34,768,000.00						32,544,589.00	2,223,411.00	
รวมทุกยุทธศาสตร์		34,768,000.00						32,544,589.00	2,223,411.00	

รายงานผลการดำเนินงานของโครงการที่จ่ายจากเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

ณ ไตรมาสที่ 3/2569 (ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2569)

แบบรายงาน 2.2 สะสม 2568

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณ (บาท)	แผนการดำเนินงานที่กำหนดไว้		สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หมายเหตุ (กรณีไม่เป็นไปตาม แผนการดำเนินงาน)
			วันที่เริ่มต้น	วันที่สิ้นสุด	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน										
1	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและฝิวจราจร ถนนเทพธิดา	6,000,000.00	1 มี.ค. 68	31 ต.ค. 68		จัดทำราคากลาง		-	6,000,000.00	ล่วงเลยระยะเวลาสิ้นสุด แต่ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ
2	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำถนนโรงเรียนกีฬา เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี	5,930,000.00	1 ก.พ. 68	30 มิ.ย. 68		บริหารสัญญา เนื้อหา 67%		-	5,930,000.00	ล่วงเลยระยะเวลาสิ้นสุด แต่ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ
3	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและฝิวจราจร ถนนดอนนก 21 แยกขวา 2	426,000.00	1 ม.ค. 68	30 เม.ย. 68			✓	237,000.00	189,000.00	
4	โครงการขยายเขตประปา ถนนศรีเกษม (อำนวยการสุข)	722,000.00	1 ม.ค. 68	30 เม.ย. 68			✓	500,000.00	222,000.00	
5	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและฝิวจราจร ถนนปากน้ำจากสะพานศรีสุราษฎร์ - สุดเขตเทศบาล	47,666,000.00	1 ม.ค. 68	31 ธ.ค. 68		สำรวจโครงการ		-	47,666,000.00	ล่วงเลยระยะเวลาสิ้นสุด แต่ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ
6	โครงการขยายเขตประปา ถนนเลียงเมือง ซอยข้างร้านส้มตำป่าพิณ	203,000.00	1 ม.ค. 68	30 เม.ย. 68			✓	187,262.00	15,738.00	
7	โครงการปรับปรุงฝิวจราจรแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนศรีวิชัยซอยแยกเลียบบคอสะพาน	200,000.00	1 มิ.ย. 68	31 ก.ค. 68			✓	164,000.00	36,000.00	
8	โครงการขยายเขตประปาถนนประชารัฐ 9	166,000.00	1 มิ.ย. 68	30 ก.ย. 68			✓	156,289.00	9,711.00	
9	โครงการขยายเขตประปาถนนประชารัฐ 4	115,000.00	1 พ.ค. 68	31 ส.ค. 68			✓	113,757.54	1,242.46	
10	โครงการขยายเขตประปาซอยปทุมพร 6/1	115,000.00	1 มี.ค. 68	30 มิ.ย. 68			✓	113,287.00	1,713.00	
11	โครงการปรับปรุงถนนฝิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติก คอนกรีต ถนนพ้อขุนทะเลซอย 18	527,000.00	1 ธ.ค. 67	30 เม.ย. 68			✓	470,707.00	56,293.00	

รายงานผลการดำเนินงานของโครงการที่จ่ายจากเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

ณ ไตรมาสที่ 3/2569 (ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2569)

แบบรายงาน 2.2 สะสม 2568

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณ (บาท)	แผนการดำเนินงานที่กำหนดไว้		สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หมายเหตุ (กรณีไม่เป็นไปตาม แผนการดำเนินงาน)
			วันที่เริ่มต้น	วันที่สิ้นสุด	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			
12	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณบึงขุนทะเล (ระยะที่ 1)	65,000,000.00	1 ก.พ. 68	30 ก.ย. 68		ยกเลิกโครงการ เทศบาลฯ ได้ส่งมอบทรัพย์สิน โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์แหล่ง ท่องเที่ยวกลางเมือง (บึงขุนทะเล) จำนวน 4 โครงการ ให้กับ อบจ. สุราษฎร์ธานี ดูแล บำรุงรักษา และบริหารจัดการพื้นที่ จึงยกเลิก โครงการดังกล่าว เพื่อไม่ให้เกิด ความซ้ำซ้อนในการใช้งบประมาณ และการดำเนินการกิจของ หน่วยงานของรัฐ		-	65,000,000.00	
13	โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติก คอนกรีตถนนหน้าเมือง STA 0+000-0+700	3,132,000.00	1 ธ.ค. 67	30 เม.ย. 68			✓	2,796,702.00	335,298.00	
14	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำถนนดงตาลพัฒนา	820,000.00	1 ม.ค. 68	30 เม.ย. 68		บริหารสัญญา เนื้องาน 40%		-	820,000.00	ล่วงเลยระยะเวลาสิ้นสุด แต่ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ
15	โครงการปรับปรุงสะพานลอยหน้าโรงพยาบาล สุราษฎร์ธานี	30,000,000.00	1 ม.ค. 68	30 ก.ย. 68		คณะกรรมการจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจงรายงาน เสนอให้ เนื่องจากราคาเดิม เกิน 30 วันแต่ยังไม่สามารถ หาผู้รับจ้างได้		-	30,000,000.00	ล่วงเลยระยะเวลาสิ้นสุด แต่ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ
16	โครงการก่อสร้างสะพานทำเทียบเรือเทศบาลนคร สุราษฎร์ธานี ถนนบ้านดอน (ช่วงที่ 1)	10,000,000.00	1 ม.ค. 68	30 ก.ย. 68		ขอมุมัติจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง เนื่องจากไม่มีผู้ประกอบการยื่น ข้อเสนอในการจ้างโดยวิธีคัดเลือก		-	10,000,000.00	ล่วงเลยระยะเวลาสิ้นสุด แต่ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ
รวม		171,022,000.00						4,739,004.54	166,282,995.46	
รวมทุกยุทธศาสตร์		171,022,000.00						4,739,004.54	166,282,995.46	

บัญชีรายละเอียด

ผลการดำเนินโครงการที่ขออนุมัติกันเงินไว้ (ที่ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 - 2568



สรุปผลการดำเนินโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

ที่ได้รับอนุมัติกันเงินหรือขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณ

ณ ไตรมาสที่ 3/2569 (ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2569)

จำนวนโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568 ที่ได้รับอนุมัติกันเงินหรือขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณ มีทั้งหมด 41 โครงการ
กันเงินงบประมาณ 151,671,013.94 บาท (หนึ่งร้อยห้าสิบเอ็ดล้านหกแสนเจ็ดหมื่นหนึ่งพันสิบสามบาทเก้าสิบสี่สตางค์) มีรายละเอียดผลการดำเนินงาน ดังนี้

1. โครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 มีโครงการที่ได้รับอนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณ จำนวน 10 โครงการ งบประมาณที่กันเงิน 28,330,000 บาท

ยุทธศาสตร์	รวมทั้งสิ้น			ดำเนินการเสร็จสิ้น			ระหว่างดำเนินการ			ยังไม่ดำเนินการ		โครงการที่ยกเลิก	
	โครงการ	งบประมาณที่กันเงิน	งบประมาณที่เบิกจ่าย	โครงการ	งบประมาณที่กันเงิน	งบประมาณที่เบิกจ่าย	โครงการ	งบประมาณที่กันเงิน	งบประมาณที่เบิกจ่าย	โครงการ	งบประมาณที่กันเงิน	โครงการ	งบประมาณที่กันเงินไว้
1. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน	7	22,842,000.00	17,313,690.54	5	18,624,000.00	17,313,690.54	2	4,218,000.00	-	-	-	-	-
4. ด้านสวัสดิการสังคมและคุณภาพชีวิต	2	4,638,000.00	4,155,000.00	2	4,638,000.00	4,155,000.00	-	-	-	-	-	-	-
6. ด้านการบริหารจัดการที่ดี	1	850,000.00	701,084.00	1	850,000.00	701,084.00	-	-	-	-	-	-	-
รวม	10	28,330,000.00	22,169,774.54	8	24,112,000.00	22,169,774.54	2	4,218,000.00	-	-	-	-	-
คิดเป็นร้อยละ		100.00			80.00			20.00			0.00		0.00

2. โครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 มีโครงการที่ได้รับอนุมัติกันเงินหรือขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณ จำนวน 8 โครงการ กันเงินงบประมาณ 60,699,600 บาท

ยุทธศาสตร์	รวมทั้งสิ้น			ดำเนินการเสร็จสิ้น			ระหว่างดำเนินการ			ยังไม่ดำเนินการ		โครงการที่ยกเลิก	
	โครงการ	งบประมาณที่กันเงิน	งบประมาณที่เบิกจ่าย	โครงการ	งบประมาณที่กันเงิน	งบประมาณที่เบิกจ่าย	โครงการ	งบประมาณที่กันเงิน	งบประมาณที่เบิกจ่าย	โครงการ	งบประมาณที่กันเงิน	โครงการ	งบประมาณที่กันเงินไว้
2. ด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว	3	10,400,000.00	-	-	-	-	3	10,400,000.00	-	-	-	-	-
3. ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	1	5,000,000.00	-	-	-	-	1	5,000,000.00	-	-	-	-	-
4. ด้านสวัสดิการสังคมและคุณภาพชีวิต	2	28,870,000.00	15,838,734.22	1	4,500,000.00	3,995,014.87	1	24,370,000.00	11,843,719.35	-	-	-	-
5. ด้านการศึกษา การกีฬา ศาสนา ประเพณีและวัฒนธรรม	2	16,429,600.00	-	-	-	-	2	16,429,600.00	-	-	-	-	-
รวม	8	60,699,600.00	15,838,734.22	1	4,500,000.00	3,995,014.87	7	56,199,600.00	11,843,719.35	-	-	-	-
คิดเป็นร้อยละ		100.00			12.50			87.50			0.00		0.00

สรุปผลการดำเนินโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

ที่ได้รับอนุมัติกันเงินหรือขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณ

ณ ไตรมาสที่ 3/2569 (ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2569)

3. โครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 มีโครงการที่ได้รับอนุมัติกันเงินงบประมาณ จำนวน 23 โครงการ กันเงินงบประมาณ 62,641,413.94 บาท

ยุทธศาสตร์	รวมทั้งสิ้น			ดำเนินการเสร็จสิ้น			ระหว่างดำเนินการ			ยังไม่ดำเนินการ		โครงการที่ยกเลิก	
	โครงการ	งบประมาณ ที่กันเงิน	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	โครงการ	งบประมาณ ที่กันเงิน	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	โครงการ	งบประมาณ ที่กันเงิน	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	โครงการ	งบประมาณ ที่กันเงิน	โครงการ	งบประมาณ ที่กันเงินไว้
1. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน	15	32,634,860.00	13,488,581.00	12	15,271,860.00	13,488,581.00	3	17,363,000.00	-	-	-	-	-
5. ด้านการศึกษา การกีฬา ศาสนา ประเพณีและวัฒนธรรม	6	8,006,553.94	4,016,553.94	3	4,128,553.94	4,016,553.94	3	3,878,000.00	-	-	-	-	-
6. ด้านการบริหารจัดการที่ดี	2	22,000,000.00	1,715,590.33	1	2,000,000.00	1,715,590.33	1	20,000,000.00	-	-	-	-	-
รวม	23	62,641,413.94	19,220,725.27	16	21,400,413.94	19,220,725.27	7	41,241,000.00	-	-	-	-	-
คิดเป็นร้อยละ		100.00			69.57			30.43		0.00		0.00	
รวม	41	151,671,013.94	57,229,234.03	25	50,012,413.94	45,385,514.68	16	101,658,600.00	11,843,719.35	-	-	-	-
คิดเป็นร้อยละ		100.00			60.98			39.02		0.00		0.00	

รายงานผลการดำเนินงานของโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ที่ได้รับอนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณ

เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

ณ ไตรมาสที่ 3/2569 (ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2569)

แบบรายงาน 2.1 กั้นเงิน 2566

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณตาม เทศบัญญัติ (บาท)	งบประมาณ ที่ได้รับอนุมัติ กั้นเงิน (บาท)	แผนการดำเนินงานที่กำหนดไว้		สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมา ดคงเหลือ (บาท)	หมายเหตุ (กรณีไม่เป็นไปตามแผนการ ดำเนินงาน)
				วันที่เริ่มต้น	วันที่สิ้นสุด	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน											
1	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณถนนคอนนง จากสี่แยกกอนามัย ถึงสี่แยกแสงเพชร	9,100,000.00	9,100,000.00	1 ต.ค. 66	30 ก.ย. 67			✓	8,663,054.54	436,945.46	
2	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำถนนคอนนง 37,39	2,341,000.00	2,341,000.00	1 ต.ค. 68	31 ม.ค. 69		สั่งหยุดงาน แก้ไขแบบแปลน		-	2,341,000.00	ล่วงเลยระยะเวลาสิ้นสุด แต่ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ
3	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและฝิวจากรถนนโกลกรัฐ 1	1,877,000.00	1,877,000.00	1 ต.ค. 68	31 ม.ค. 69		พัสดุเสนอบันทึกค่อท้าย สัญญา		-	1,877,000.00	ล่วงเลยระยะเวลาสิ้นสุด แต่ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ
4	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและฝิวจากรถนนโกลกรัฐ 3	1,978,000.00	1,978,000.00	1 ต.ค. 68	31 ม.ค. 69			✓	1,440,000.00	538,000.00	
5	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำถนนตลาดล่าง 24 (หลังหมู่บ้าน ศุขเจริญ)	4,000,000.00	4,000,000.00	1 ต.ค. 68	31 ธ.ค. 68			✓	3,750,636.00	249,364.00	
6	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและฝิวจากรถนนกาญจนวิถึ 16 แยกขวา 1	619,000.00	619,000.00	1 ต.ค. 68	31 ธ.ค. 68			✓	560,000.00	59,000.00	
7	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและฝิวจากรถนนชนเกษม 26	2,927,000.00	2,927,000.00	1 ต.ค. 67	31 ธ.ค. 67			✓	2,900,000.00	27,000.00	
รวม		22,842,000.00	22,842,000.00						17,313,690.54	5,528,309.46	
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสวัสดิการสังคมและคุณภาพชีวิต											
8	โครงการปรับปรุงและซ่อมแซมโรงฆ่าสัตว์ เทศบาลนคร สุราษฎร์ธานี	1,795,430.00	1,275,000.00	1 ต.ค. 68	31 มี.ค. 69			✓	1,275,000.00	-	
9	โครงการปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริม ผู้สูงอายุเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี (ศพอส.)	3,363,000.00	3,363,000.00	1 ต.ค. 68	31 ธ.ค. 68			✓	2,880,000.00	483,000.00	
รวม		5,158,430.00	4,638,000.00						4,155,000.00	483,000.00	
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี											
10	โครงการก่อสร้างป้ายสำหรับติดตั้งจอ LED บริเวณสี่แยกวัดโพธิ์	850,000.00	850,000.00	1 ต.ค. 68	31 มี.ค. 69			✓	701,084.00	148,916.00	
รวม		850,000.00	850,000.00						701,084	148,916.00	
รวมทุกยุทธศาสตร์		28,850,430.00	28,330,000.00						22,169,774.54	6,160,225.46	

รายงานผลการดำเนินงานของโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ที่ได้รับอนุมัติเงินหรือขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณ

เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
ณ ไตรมาสที่ 3/2569 (ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2569)

แบบรายงาน 2.1 กั้นเงิน 2567

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณตาม เทศบัญญัติ (บาท)	งบประมาณ ที่ได้รับอนุมัติ กั้นเงิน (บาท)	แผนการดำเนินงานที่กำหนดไว้		สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หมายเหตุ
				วันที่เริ่มต้น	วันที่สิ้นสุด	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว											
1	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ริมเขื่อนแม่น้ำตาปีถนนบ้านดอน (ช่วงที่ 3)	5,500,000.00	5,500,000.00	1 ต.ค. 68	30 ก.ย. 69		อยู่ระหว่างก่อสร้าง เนื้องาน 31%		-	5,500,000.00	
2	โครงการก่อสร้างหลังคาคลุมทางเดินตลาดนัดตลาดน้ำบ้านดอน	2,900,000.00	2,900,000.00	1 พ.ย. 68	30 ก.ย. 69		อยู่ระหว่างก่อสร้าง เนื้องาน 37%		-	2,900,000.00	
3	โครงการก่อสร้างสะพานทางเดินชุมชนบางหลา	2,000,000.00	2,000,000.00	1 พ.ย. 68	30 ก.ย. 69		อยู่ระหว่างจัดทำ TOR และ ราคากลาง ครั้งที่ 2		-	2,000,000.00	
รวม		10,400,000.00	10,400,000.00						-	10,400,000.00	
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม											
4	โครงการปรับปรุงสนามเด็กเล่นสวนหลวง ร.9	5,000,000.00	5,000,000.00	1 พ.ย. 68	30 ก.ย. 69		อยู่ระหว่างก่อสร้าง เนื้องาน 0.11%		-	5,000,000.00	
รวม		5,000,000.00	5,000,000.00						-	5,000,000.00	
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสวัสดิการสังคมและคุณภาพชีวิต											
5	โครงการก่อสร้างสถานีดับเพลิงหน่วยย่อย (สวนหลวง ร.9)	4,500,000.00	4,500,000.00	1 ต.ค. 68	28 ก.พ. 69			✓	3,995,014.87	504,985.13	
6	โครงการก่อสร้างศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี (ปทุมพร)	27,500,000.00	24,370,000.00	1 ต.ค. 68	30 ก.ย. 69		ผู้รับจ้างส่งงานงวดที่ 5,6 อยู่ระหว่างเบิกจ่ายเงิน		11,843,719.35	12,526,280.65	
รวม		32,000,000.00	28,870,000.00						15,838,734.22	13,031,265.78	

รายงานผลการดำเนินงานของโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ที่ได้รับอนุมัติเงินหรือขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณ

เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
ณ ไตรมาสที่ 3/2569 (ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2569)

แบบรายงาน 2.1 กันเงิน 2567

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณตาม เทศบัญญัติ (บาท)	งบประมาณ ที่ได้รับอนุมัติ กันเงิน (บาท)	แผนการดำเนินงานที่กำหนดไว้		สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หมายเหตุ
				วันที่เริ่มต้น	วันที่สิ้นสุด	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา การกีฬา ศาสนา ประเพณีและวัฒนธรรม											
7	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารประชาชนถุมิต 2	1,429,600.00	1,429,600.00	1 ต.ค. 68	31 พ.ค. 69		บริหารสัญญา สิ้นสุดสัญญา วันที่ 3 ก.ย. 2569		-	1,429,600.00	
8	โครงการก่อสร้างอาคารเรียน ค.ส.ล. 4 ชั้น 12 ห้อง	15,000,000.00	15,000,000.00	1 ต.ค. 68	30 ก.ย. 69		ยกเลิกประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา		-	15,000,000.00	
รวม		16,429,600.00	16,429,600.00						-	16,429,600.00	
รวมทุกยุทธศาสตร์		63,829,600.00	60,699,600.00						15,838,734.22	44,860,865.78	

รายงานผลการดำเนินงานของโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
ที่ได้รับอนุมัติกันเงินงบประมาณ
ณ ไตรมาสที่ 3/2569 (ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2569)

แบบรายงาน 2.1 กันเงิน 2568

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณตาม เทศบัญญัติ (บาท)	งบประมาณ ที่ได้รับอนุมัติ กันเงิน (บาท)	แผนการดำเนินงานที่กำหนดไว้		สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หมายเหตุ
				วันที่เริ่มต้น	วันที่สิ้นสุด	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน											
1	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ ถนนปากน้ำ จากสามแยกป่า ไม้ - ปากซอยปากน้ำ 3	15,920,000.00	15,920,000.00	1 พ.ย. 68	30 เม.ย. 69		บริหารสัญญา ดำเนินงาน 20%		-	15,920,000.00	ล่วงเลยระยะเวลาสิ้นสุด แต่ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ
2	โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบแอสฟัลท์คอนกรีต (Over-lay) ถนนพอขุนทะเล จากช่วงที่ 3 (Sta 2+350 ถึง Sta 3+500) (ชุมชนบึงขุนทะเล)	6,900,000.00	5,889,860.00	1 ต.ค. 68	30 พ.ย. 68			✓	5,889,860.00	-	
3	โครงการปรับปรุงสายสัญญาณไฟจราจรลงใต้ดินบริเวณ แยกการุณราษฎร์	488,000.00	488,000.00	1 ต.ค. 68	31 ธ.ค. 68			✓	485,800.00	2,200.00	
4	โครงการปรับปรุงสายสัญญาณไฟจราจรลงใต้ดินบริเวณ แยกตลาดเกษตร 1 , 2	432,000.00	432,000.00	1 ต.ค. 68	31 ธ.ค. 68			✓	410,000.00	22,000.00	
5	โครงการปรับปรุงสายสัญญาณไฟจราจรลงใต้ดินบริเวณ แยกเทศบาล	493,000.00	493,000.00	1 ต.ค. 68	31 ธ.ค. 68			✓	491,800.00	1,200.00	
6	โครงการปรับปรุงสายสัญญาณไฟจราจรลงใต้ดินบริเวณ แยกธรรมบูชา	489,000.00	489,000.00	1 ต.ค. 68	31 ธ.ค. 68			✓	460,000.00	29,000.00	
7	โครงการปรับปรุงสายสัญญาณไฟจราจรลงใต้ดินบริเวณแยก ธารา	378,000.00	378,000.00	1 ต.ค. 68	31 ธ.ค. 68			✓	355,200.00	22,800.00	
8	โครงการปรับปรุงสายสัญญาณไฟจราจรลงใต้ดินบริเวณ แยกคัคคี	451,000.00	451,000.00	1 ต.ค. 68	31 ธ.ค. 68			✓	450,000.00	1,000.00	
9	โครงการปรับปรุงสายสัญญาณไฟจราจรลงใต้ดินบริเวณ แยกวัดโพธิ์	473,000.00	473,000.00	1 ต.ค. 68	31 ธ.ค. 68			✓	431,700.00	41,300.00	
10	โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนชนเกษม	4,507,000.00	4,507,000.00	1 ก.ค. 68	30 ก.ย. 68			✓	3,404,228.00	1,102,772.00	
11	โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนตลาดล่าง ซอย 18	355,000.00	355,000.00	1 ต.ค. 68	31 ม.ค. 69			✓	201,295.00	153,705.00	

รายงานผลการดำเนินงานของโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
ที่ได้รับอนุมัติกันเงินงบประมาณ
ณ ไตรมาสที่ 3/2569 (ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2569)

แบบรายงาน 2.1 กันเงิน 2568

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณตาม เทศบัญญัติ (บาท)	งบประมาณ ที่ได้รับอนุมัติ กันเงิน (บาท)	แผนการดำเนินงานที่กำหนดไว้		สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หมายเหตุ
				วันที่เริ่มต้น	วันที่สิ้นสุด	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			
12	โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนกรมหลวงอนุวัติ	490,000.00	490,000.00	1 ต.ค. 68	31 ม.ค. 69			✓	277,947.00	212,053.00	
13	โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนโศภนรัฐ ซอย 5	826,000.00	826,000.00	1 ต.ค. 68	31 ม.ค. 69			✓	630,751.00	195,249.00	
14	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจรถนนบ้านตาเก็บ	806,000.00	806,000.00	1 พ.ย. 68	31 มี.ค. 69		จัดทำราคากลาง		-	806,000.00	ล่วงเลยระยะเวลาสิ้นสุด แต่ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ
15	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจรถนนบ้านตาปก	637,000.00	637,000.00	1 พ.ย. 68	31 มี.ค. 69		จัดทำราคากลาง		-	637,000.00	ล่วงเลยระยะเวลาสิ้นสุด แต่ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ
รวม		33,645,000.00	32,634,860.00						13,488,581.00	19,146,279.00	
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา การกีฬา ศาสนา ประเพณีและวัฒนธรรม											
16	โครงการก่อสร้างห้องน้ำ - ห้องส้วมโรงเรียนกีฬาเทศบาล นครสุราษฎร์ธานี	904,000.00	486,850.00	1 ต.ค. 68	31 ม.ค. 69			✓	486,850.00	-	
17	โครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน	12,451,200.00	2,741,703.94	1 ต.ค. 67	30 ก.ย. 68			✓	2,741,703.94	-	
18	โครงการปรับปรุงหลังคาและฝ้าเพดานอาคารเรียน 1 (เฟดิมเดช)	1,266,000.00	1,266,000.00	1 ต.ค. 68	31 พ.ค. 69		บริหารสัญญา สิ้นสุดสัญญา วันที่ 8 ก.ย. 2569		-	1,266,000.00	
19	โครงการปรับปรุงหลังคาและฝ้าเพดานอาคารเรียน 2 (เวชพิสิฐ)	1,738,000.00	1,738,000.00	1 ต.ค. 68	31 พ.ค. 69		แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำ แบบรูปรายการและกำหนด ราคากลาง		-	1,738,000.00	
20	โครงการปรับปรุงหลังคาและฝ้าเพดานอาคารเรียน 3 (พิชชานันท์)	874,000.00	874,000.00	1 ต.ค. 68	31 พ.ค. 69		บริหารสัญญา สิ้นสุดสัญญา วันที่ 19 ก.ย. 2569		-	874,000.00	
21	โครงการรื้อถอนพร้อมติดตั้งพื้นยางสนามแบดมินตัน	900,000.00	900,000.00	1 ต.ค. 68	30 เม.ย. 69			✓	788,000.00	112,000.00	
รวม		18,133,200.00	8,006,553.94						4,016,553.94	3,990,000.00	

รายงานผลการดำเนินงานของโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
ที่ได้รับอนุมัติกันเงินงบประมาณ
ณ ไตรมาสที่ 3/2569 (ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2569)

แบบรายงาน 2.1 กันเงิน 2568

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณตาม เทศบัญญัติ (บาท)	งบประมาณ ที่ได้รับอนุมัติ กันเงิน (บาท)	แผนการดำเนินงานที่กำหนดไว้		สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หมายเหตุ
				วันที่เริ่มต้น	วันที่สิ้นสุด	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี											
22	โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์เทศบาลนคร สุราษฎร์ธานี	20,000,000.00	20,000,000.00	1 พ.ย. 68	30 เม.ย. 69		จัดทำแบบรูปรายการและ ราคากลาง		-	20,000,000.00	ล่วงเลยระยะเวลาสิ้นสุด แต่ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ
23	โครงการปรับปรุงอาคารสำนักงานเทศบาลนคร สุราษฎร์ธานี (หลังเก่า)	2,000,000.00	2,000,000.00	1 ต.ค. 68	31 ม.ค. 69			✓	1,715,590.33	284,409.67	
รวม		22,000,000.00	22,000,000.00						1,715,590.33	20,284,409.67	
รวมทุกยุทธศาสตร์		73,778,200.00	62,641,413.94						19,220,725.27	43,420,688.67	
